



Fraternité - Travail - Progrès



Agence de Régulation des Marchés Publics  
(ARMP)

## RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'AUDIT PHYSIQUE - VERSION FINALE -

AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES  
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE  
L'ANNEE 2020



JUIN 2021

PRESENTE PAR LE GROUPEMENT DE CABINET :



ET



# SOMMAIRE

ABREVIATIONS ET ACRONYMES	6
RESUME	8
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE	16
1. CONTEXTE DE LA MISSION	16
2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION	17
3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE	17
3.1. DETERMINATION DE L'ECHANTILLON POUR L'AUDIT PHYSIQUE	17
3.1.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE	17
3.1.2. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON	17
3.2. DEROULEMENT DE LA MISSION	18
3.2.1. PRISE DE CONTACT	18
3.2.2. REVUE DOCUMENTAIRE	18
3.2.3. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN	19
3.2.4. REDACTION DU RAPPORT	19
3.3. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION	20
DEUXIEME PARTIE : PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE	21
1. TAUX DE COUVERTURE	21
2. CONSTATS SPECIFIQUES RECURRENTS	24
3. RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE	27
ANNEXES	122
ANNEXE 1 : PLAN D'ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS	122
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES	124

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Echantillon par nature.....	<b>8</b>
Tableau 2 : Echantillon par mode de passation.....	<b>9</b>
Tableau 3 : Liste des marchés dont les documents n'ont pu être mis à disposition.....	<b>11</b>
Tableau 4 : Liste des équipements acquis mais non utilisés et à l'abandon .....	<b>13</b>
Tableau 5 : Marché en cours d'exécution.....	<b>14</b>
Tableau 6 : Echantillon par nature .....	<b>18</b>
Tableau 7 : Echantillon par mode de passation .....	<b>18</b>
Tableau 8 : Statistique du nombre de marchés en carence documentaire .....	<b>24</b>
Tableau 9 : Statistique des équipements acquis mais non utilisés.....	<b>25</b>

## LISTE DES GRAPHIQUES







Graphique 1 : Illustration de l'échantillon par nature .....	<b>9</b>
Graphique 2 : Illustration de l'échantillon en nombre par mode de passation.....	<b>10</b>
Graphique 3 : Illustration de l'échantillon en valeur par mode de passation .....	<b>10</b>
Graphique 4: Illustration du taux de couverture globale.....	<b>23</b>

## PREAMBULE

Le présent document dit « Rapport de synthèse de l'audit physique » a pour objet de présenter le résultat final de l'exécution physique des marchés passés par quarante (40) Autorités Contractantes au titre de l'exercice budgétaire 2020.

Conformément aux termes de référence, un rapport d'audit de conformité et un rapport d'audit physique versions provisoires et versions finales – ont été transmis à chacune des vingt-trois Autorités Contractantes pour commentaires et/ou observations.

Le Rapport de synthèse de l'audit physique s'articule autour des points suivants :

-  Le résumé du rapport ;
-  L'introduction et le contexte de la mission ;
-  Le rappel des objectifs de la mission ;
-  L'approche méthodologique utilisée ;
-  Les résultats de la revue de l'exécution physique des marchés ;
-  Le plan d'actions issues des principaux constats & recommandations.

Ce rapport est complété par deux (02) annexes : le plan d'action de mise en œuvre des recommandations (Annexe 1) et la liste des personnes rencontrées (Annexe 2).

NB : l'audit de conformité des marchés sélectionnés, de la période concernée, a fait l'objet d'un rapport séparé conformément aux termes de référence de la mission.

## ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Abréviations et acronymes	Appellations complètes/Détails
AAO	Avis d'Appel d'Offres
ABK	Agence du Barrage de Kandadji
AC	Autorité Contractante
AMODER	Agence de Maîtrise d'Ouvrage Délégée de l'Entretien Routier
AN	Assemblée Nationale
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ARMP	Agence de Régulation des Marchés Publics
CAB/PRN	Présidence de la République
CCIN	Chambre de commerce et de l'Industrie du Niger
CENI	Commission Electorale Nationale Indépendante
CFS	Cellule Filets Sociaux
CNOU	Centre National des Œuvres Universitaires
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Conseil Régional/AZ	Conseil Régional d'Agadez
Conseil Régional/DA	Conseil Régional de Diffa
Conseil Régional/DO	Conseil Régional de Dosso
Conseil Régional/MI	Conseil Régional de Maradi
Conseil Régional/TA	Conseil Régional de Tahoua
Conseil Régional/TI	Conseil Régional de Tillabéri
Conseil Régional/ZR	Conseil Régional de Zinder
CR/HARKANASSOU	Commune Rurale de Harikanassou
CR/KIOTA	Commune Rurale de Kiota
CR/OLLEWA	Commune Rurale d'Ollewa
CR/TAMASKE	Commune Rurale de Tamaské
CR/WACHA	Commune Rurale de Wacha
CROU/AZ	Centre Régional des Œuvres Universitaires d'Agadez
CROU/TA	Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
CU/DAKORO	Commune Urbaine de Dakoro
CU/Tibiri/MI	Commune Urbaine de Tibiri, Maradi
DP	Demande de Proposition
DFM	Direction des Finances et du Matériel
DGCMP/EF	Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
DGPN	Direction Générale de la Police Nationale
DNPGCA	Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises et Catastrophes Alimentaires
DREP/T /DA	Direction Régionale de l'Enseignement Professionnel et Technique/ Diffa
DREP/T /ZR	Direction Régionale de l'Enseignement Professionnel et Technique/ Zinder
DRES/MI	Direction Régionale des Enseignements Secondaires de Maradi
DRH/A/AZ	Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement /Agadez

Abréviations et acronymes	Appellations complètes/Détails
DRH/A/DA	Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Diffa
DRH/AMI	Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement /Maradi
DRH/ATA	Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement/ Tahoua
DRH/AT I	Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement /Tillabéry
DRH /A/ZR	Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement /Zinder
DRSP/TI	Direction Régionale de la Santé Publique de Tillabéri
ED	Entente Directe
FAFPA	Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à L'Apprentissage
GOUVERNORAT/DA	Gouvernorat de Diffa
GOUVERNORAT/TA	Gouvernorat de Tahoua
GOUVERNORAT/TI	Gouvernorat de Tillabéri
HACP	Haute Autorité à la Consolidation de la Paix
M/Equipement	Ministère de l'Equipement
M/Finances	Ministère des Finances
MAG/EL	Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
MD/Habitat	Ministère des Domaine et de l'Habitat
MDN	Ministère de la Défense Nationale
MEP/A/PLN/EC	Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique
MES	Ministère des Enseignements Secondaires
MISP/D/CR	Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses
MSP	Ministère de la Santé Publique
NIGELEC	Société Nigérienne d'Electricité
NT	Niger Télécoms
OPVN	Office des Produits Vivriers du Niger
PAPDS	Programme d'Appui au Programme de Développement Sanitaire
PASEC	Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux Risques Climatiques
PEAMU	Projet Eau, Assainissement en Milieu Urbain
PGRC-DU	Projet de Gestion des Risques et Catastrophes et de Développement Urbain
PISA/AZ	Petite Irrigation et Sécurité Alimentaire
PMRC	Projet de Mobilité Rurale et de Connectivité
ProDAF/DA	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale - Diffa
ProDAF/MI	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale - Maradi
ProDAF/TA	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale - Tahoua
ProDAF/ZR	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale - Zinder
SE-SDS SAHEL NIGER	Stratégie de Développement et de Sécurité - Sahel-Niger
SO	Sans Objet
UDDM	Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi
TDR	Termes de Référence
TTC	Toutes Taxes Comprises

## RESUME

L'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Niger a commandité un audit des marchés passés par les Autorités Contractantes (AC) au titre de l'exercice budgétaire 2020.

Le Groupement de cabinets International Consultants for Procurement (ICP Sarl) et Management, Audit & Consulting (MAC Consulting), suite à une procédure compétitive, a été retenu pour cette mission (Audit des marchés publics et des Délégations de Service Public de l'année 2020).

### ❖ ECHANTILLON D'ETUDE

Au total ce sont deux mille neuf cent cinquante-neuf (2 959) marchés qui ont été passés durant l'exercice budgétaire 2020, pour un montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze milliards quatre cent cinquante-sept millions huit cent vingt-huit mille neuf cent quatorze (494 457 828 914) FCFA.

L'échantillon des marchés effectivement audités a porté sur trois cent soixante-huit (368) d'un montant cumulé de cent soixante-neuf milliards quatre cent soixante-douze millions quatre cent sept mille dix-neuf (169 472 407 019) francs CFA. Cela représente trente-quatre pourcent (34%) de la valeur totale de l'échantillon des marchés passés en 2020 par Autorités Contractantes concernées.

De cet échantillon soumis à l'audit de conformité, nous avons extrait soixante (60) marchés (16%), d'un montant de soixante-cinq milliards six cent soixante-deux un millions huit cent quatre neuf mille huit cent trente-huit (65 662 889 838) FCFA dont nous avons vérifié l'exécution physique sur le terrain. Ce volume représente 39% de la valeur totale de l'échantillon de l'audit de conformité.

La répartition de cet échantillon par nature des marchés est donnée ci-dessous :

Tableau 1 : Echantillon par nature


NATURE	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Fournitures et Services courants	33	55%	24 537 350 278	37%
Travaux	27	45%	41 125 539 560	63%
Prestations Intellectuelles	0	0%	0	0%
TOTAL	60	100%	65 662 889 838	100%

Commentaires : l'échantillon de l'audit physique est constitué de :

- Ñ Trente-trois (33) dossiers de fournitures (55%) d'une valeur de 24 537 350 278 FCFA soit 37% de l'échantillon.
- Ñ Vingt-sept (27) marchés de travaux (45% de l'effectif de l'échantillon) et qui représentent 63% de la valeur de l'échantillon ;



Graphique 1 : Illustration de l'échantillon par nature

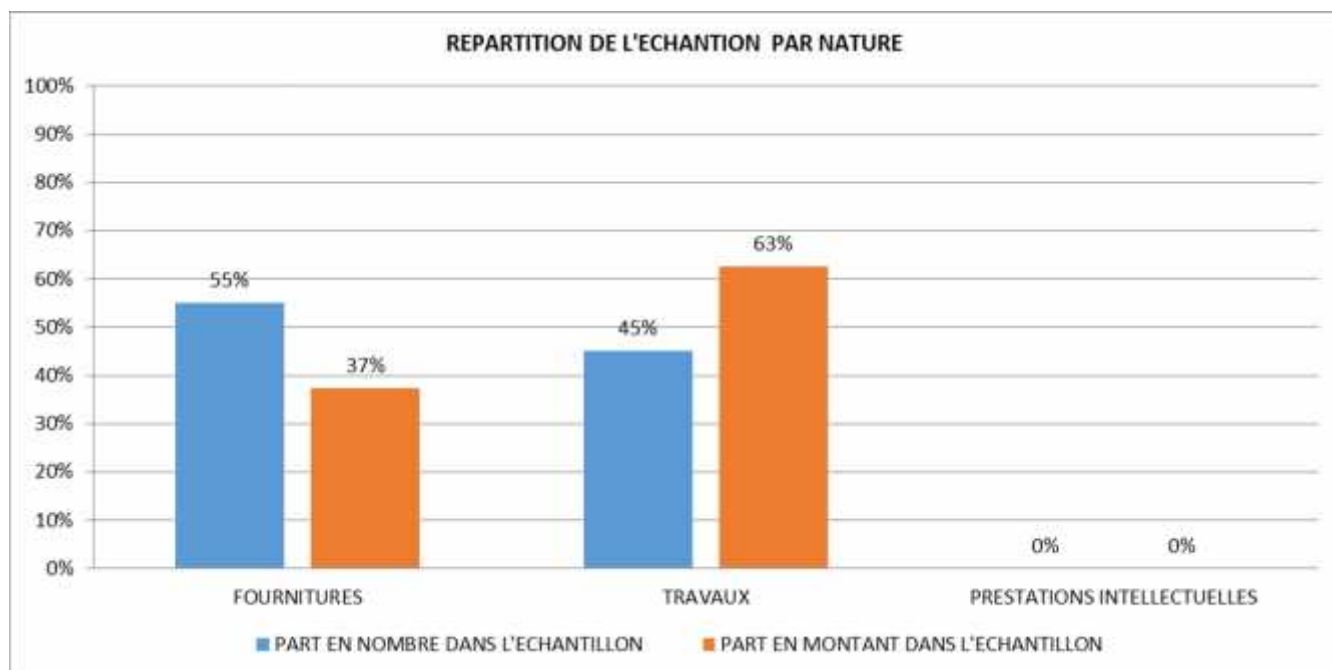

La distribution de cet échantillon par mode de passation de marchés se présente comme suit :


Tableau 2 : Echantillon par mode de passation

MODE DE PASSATION	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Appel d'offres ouvert	25	42%	13 184 183 762	20%
Appel d'offres restreint	1	2%	1 761 200 000	3%
Marchés par Entente Directe	21	35%	47 097 555 244	72%
Avenant	2	3%	3 188 188 128	5%
Solprix - Demande de Cotation	8	13%	319 748 473	0,5%
Solprix - Demande des Renseignements et de Prix	3	5%	112 014 231	0,2%
TOTAL	60	100%	65 662 889 838	100%


Commentaires : de cet échantillon de l'audit physique on retient que :

- Ñ Vingt-cinq (25) marchés sont passés par appel d'offres ouvert (42%) et représentent 20% de la valeur de l'échantillon ;
- Ñ Un (01) marché a été passé par appel d'offres restreint (2%) et représentent 3% de la valeur de l'échantillon ;
- Ñ Vingt un (21) marchés (35%) ont été passés par entente directe pour un montant cumulé de 47 097 555 244 FCFA. Ils représentent 72% de la valeur de l'échantillon total,
- Ñ Deux (02) marchés ont fait l'objet d'avenant et représentent un montant de 3 188 188 128 FCFA (5% de la valeur de l'échantillon total) ;
- Ñ Huit (08) marchés ont été passés par sollicitation de prix - demande de cotation (13%) et représentent un montant de 319 748 473 FCFA (0,5% de la valeur de l'échantillon total) ;
- Ñ Trois (03) marchés ont été passés par sollicitation de prix - demande des Renseignements et de Prix (5%) et représentent un montant de 112 014 231 FCFA (0,2% de la valeur de l'échantillon total).

Graphique 2 : Illustration de l'échantillon en nombre par mode de passation

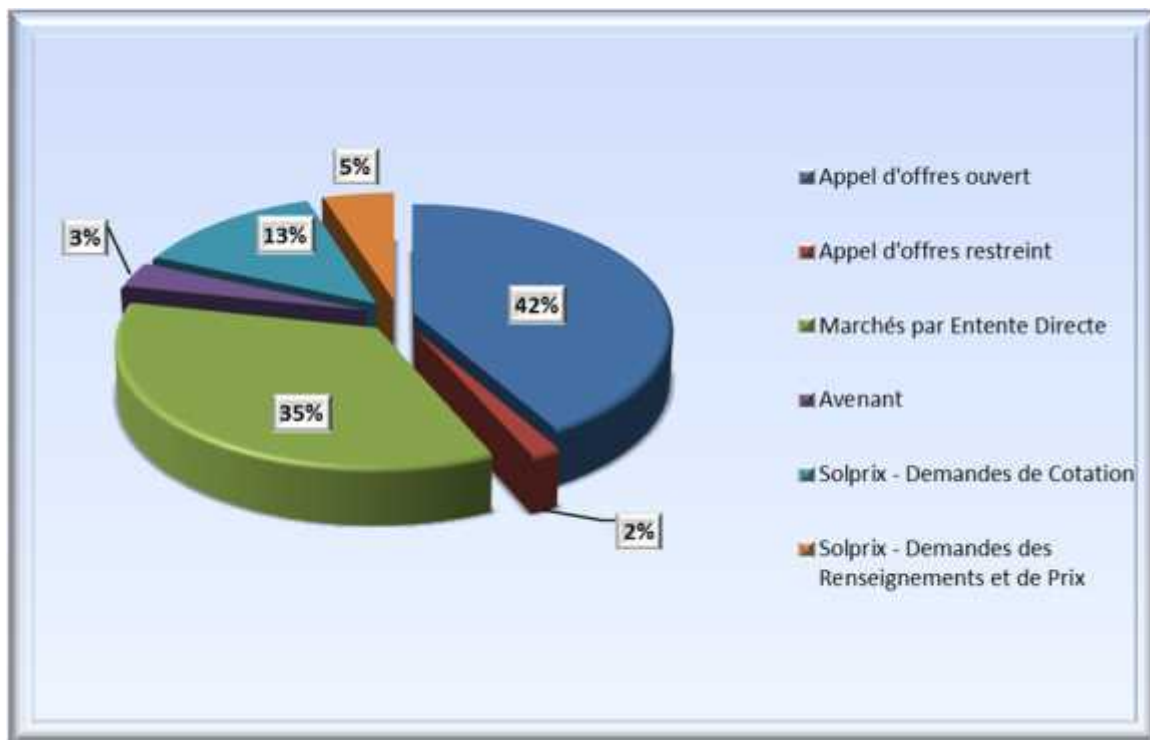

Graphique 3 : Illustration de l'échantillon en valeur par mode de passation

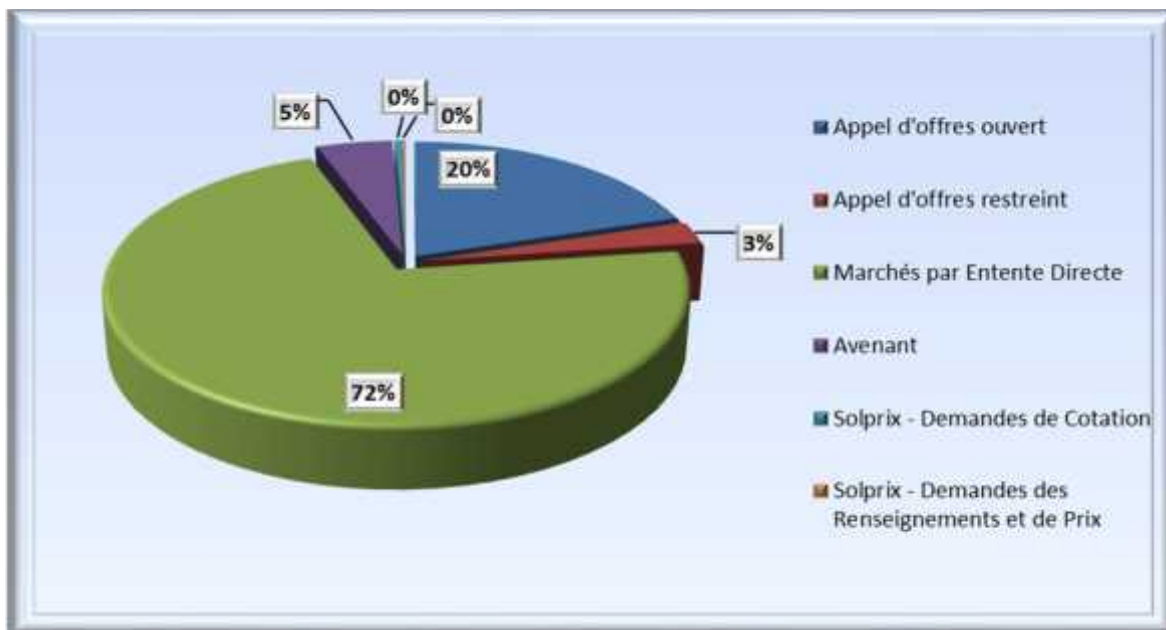

❖ UN CONTEXTE SECURITAIRE PEU FAVORABLE

La mission d'audit physique des marchés passés par les Autorités Contractantes retenues dans l'échantillon mentionné ci-dessus au titre de l'exercice budgétaire 2020 s'est déroulée dans un environnement sécuritaire un peu particulier. Certaines régions en effet, sites de travaux ou bénéficiaires de biens acquis, n'ont pu être visitées (Agadez, Diffa et Tahoua) pour des raisons de sécurité.

❖ LA MISE A DISPOSITION DE L'INFORMATION

L'information fournie est, pour certaines Autorités Contractantes, toujours restée, tant qualitativement que quantitativement, très en deçà du minimum requis pour ce type de mission : inexistence de notification, pas de rapports de suivi de l'exécution ou pas de procès-verbaux de réception des travaux ou de livraison des fournitures, document de paiement. Ainsi, le long délai mis par certaines AC pour la mise à disposition des documents d'exécution, les problèmes d'archivage de dossiers, le niveau de complétude très faible des dossiers de marché ont énormément gêné le déroulement correct de la mission.

❖ PRINCIPAUX CONSTATS

Ñ Carence de l'archivage des documents des marchés et notamment de pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de travaux, fournitures et prestations intellectuelles : pour 10% des marchés ayant fait l'objet de contrôle dans le cadre de nos travaux, de nombreux documents n'ont pu être mis à notre disposition, ce qui a constitué une véritable limite à nos travaux (Lettres de notification, PV de réception, spécifications techniques, rapport d'exécution, preuve de paiement etc.)

Tableau 3 : Liste des marchés dont les documents n'ont pu être mis à disposition

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
N°001/CCIN/DRH/M/2020	Construction d'un bâtiment R+2 à la CCIN	CCIN	Travaux	ENTREPRISE ISSOUFOU GARBA	248 722 415
N° 05/2020/CR/ZR	Construction de sept (7) puits cimentés pastoraux dans les départements de Belbédji et Tanout, région de Zinder-Lot n°2 et Lot N°3	Conseil Régional de Zinder	Travaux	ENTREPRISE ALI KADA	125 491 400
N° 0000034/Niger Telecom/DFC/2020	Construction d'un mur de clôture et d'une case gardien en matériaux définitifs au Centre FH de Tessaoua (Maradi)	NIGERTELECOM	Travaux	ENTREPRISE Hamissou Mahaman Manirou	69 828 473
0094/FCD/2020/SNS	Fourniture de 3 000 tonnes de céréales Mil: 1 500 tonnes à Niamey Mais: 1 500 tonnes à Niamey	DNPGCA	Fournitures	ENTREPRISE ADAMOU OUMAROU	832 500 000
321/20/MF/DGC MP/EF	Acquisition de vingt (20) véhicules Toyota Land Cruiser 4x4 mono cabine au profit de la DGD	MF	Fournitures	CFAO MOTORS Niger	497 500 000
N° 835/20/MF/DGC MP/EF	Travaux de réalisation de trois (3) petits périmètres communautaires dans les communes d'Issawane, Attantane et Gazaoua (Région de Maradi)	ProDAF/MI	Travaux	Frère Oumadah	279 738 233

Ñ Mauvaise qualité de certains travaux exécutés : des ouvrages réceptionnés ou en cours d'exécution, dans certains cas, sont de mauvaise qualité et souvent ne correspondent pas aux spécifications contractuelles.

Tableau : Liste des marchés dont les ouvrages réceptionnés ou en cours d'exécution sont de mauvaise qualité

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
2020/03/AMODER	Route nationale N°1E Section 2 (RN_N0001E02) Dosso-Doutchi PK59+8-PK136	AMODER	Travaux	ENTREPRISE MOREY	1 886 579 471
N°06/2020/CR/MI/PACT	Travaux de construction d'un marché à mixte à Bamo dans la commune rurale de Djirataoua, département de Madarounfa	Conseil Régional/MI	Travaux	ENTREPRISE GIO	288 704 229
N° 002/CRTA/2020	Construction de deux blocs de deux salles de classes au CEG de Tounfafi dans le département de Madaoua	Conseil Régional/TA	Travaux	MAHAMADOU ABDOURAHAMANE	34 665 697
N° 01/CUT/MI/2020	Travaux de construction d'un bloc de trois salles de classes à Garin Majé dans la Commune Urbaine de Tibiri	CU/Tibiri/MI	Travaux	ENTREPRISE Mahaman Sahirou Abadji	27 071 975
N° 80/GTA/CMP/EF	Réhabilitation de la Mini AEP multi villages de Faska, commune de Tajaé, département d'Illela dans la région de Tahoua : Lot N°1	DRH/A/TA	Travaux	ENTREPRISE LAOUALI IDI	178.443.880
016/2020/HACP/DRFM	Construction des infrastructures (Salle de classes) dans la Commune de rurale de Badaguichiri-Lot N°1	HACP	Travaux	DIGI GLOBAL BTP/H	409 333 038
031/2020/HACP/DRFM	Construction des infrastructures hydrauliques dans les Communes de Garhanga et Bouza région de Tahoua-Lot N°1	HACP	Travaux	DIGI GLOBAL BTP/H	371 724 010
N° 0000034/Niger Telecom/DFC/2020	Construction d'un mur de clôture et d'une case gardien en matériaux définitifs au Centre FH de Tessaoua (Maradi)	NIGERTELECOM	Travaux	ENTREPRISE Hamissou Mahaman Manirou	69 828 473
N°59/TRAVAUX/PGRC-DU/6431/IDA	Lot n°1 : Travaux de réalisation de 2745 ml du Collecteur C3S3 Lot n°2 : Travaux de réalisation de 3530 ml des Collecteurs des C4S3, C9S3 et C10S3	PGRC-DU	Travaux	Groupement VALIMO Group SA/ECR	1 455 073 006
N° 012/UDDM/2020	Construction d'une salle FOAD (Salle + Bureaux + Toilettes)	UDDM	Travaux	ENTREPRISE Boulama Moussa	64 618 202

J) Longs délais de réalisation et non application des pénalités de retard dans la majorité des cas : les délais de réalisation ne sont souvent pas respectés sans pour autant que les pénalités prévues au marché soient appliquées.

Tableau : Liste des marchés dont les délais de réalisation ne sont pas respectés

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
016/2020/HACP/DRFM	Construction des infrastructures (Salle de classes) dans la Commune de rurale de Badaguichiri-Lot N°1	HACP	Travaux	DIGI GLOBAL BTP/H	409 333 038
031/2020/HACP/DRFM	Construction des infrastructures hydrauliques dans les Communes de Garhanga et Bouza région de Tahoua-Lot N°1	HACP	Travaux	DIGI GLOBAL BTP/H	371 724 010
N°59/TRAVAU X/PGRC-DU/6431/IDA	Lot n°1 : Travaux de réalisation de 2745 ml du Collecteur C3S3 Lot n°2 : Travaux de réalisation de 3530 ml des Collecteurs des C4S3, C9S3 et C10S3	PGRC-DU	Travaux	Groupement VALIMO Group SA/ECR	1 455 073 006
774/20/MF/DG CMP/EF	Acquisition de soixante-cinq (65) véhicules toyota (58 toyota HZJ 79L, Land cruiser pick up essence, 05 Cruiser 4.2 LMT 2019 Hard top 76 Diesel) au profit des forces armées nigériennes	MDN	Fournitures	Etablissements Elh Rambazo Moussa	1 758 500 000
980/20/MF/DG CMP/EF	Acquisition de vingt-cinq (25) ambulances au profit du ministère de la défense nationale	MDN	Fournitures	E/SE Naila	1 443 000 000

Ñ Manque d'entretien des équipements acquis : certains équipements livrés manquent d'entretien ce qui les expose à une dégradation précoce.

Tableau : Liste des ouvrages qui manque d'entretien

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
N° 01/CUT/MI/2020	Travaux de construction d'un bloc de trois salles de classes à Garin Majé dans la Commune Urbaine de Tibiri	CU/Tibiri/MI	Travaux	ENTREPRISE Mahaman Sahirou Abadji	27 071 975

Ñ Equipements acquis mais non utilisés et à l'abandon : certains équipements acquis ne sont pas utilisés et sont dans un état d'abandon. Le marché ci-après en est un bel exemple :

Tableau 4: Liste des équipements acquis mais non utilisés et à l'abandon

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
016/2020/HACP/DRFM	Construction des infrastructures (Salle de classes) dans la Commune de rurale de Bada Guichiri-Lot N°1	HACP	Travaux	DIGI GLOBAL BTP/H	409 333 038
031/2020/HACP/DRFM	Construction des infrastructures hydrauliques dans les Communes de Garhanga et Bouza région de Tahoua-Lot N°1	HACP	Travaux	DIGI GLOBAL BTP/H	371 724 010

Ñ Marchés en cours d'exécution au moment du passage de la mission d'audit :

Tableau 5: Marché en cours d'exécution

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
2020/03/AMODER	Route nationale N°1E Section 2 (RN_N0001E02) Dosso-Doutchi PK59+8-PK136	AMODER	Travaux	ENTREPRISE MOREY	1 886 579 471
N° 001/CCIN/D RH/M/2020	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+2 A LA CCIN	CCIN	Travaux	ENTREPRISE ISSOUFOU GARBA	248 722 415
N° 05/2020/CR/ZR	Construction de sept (7) puits cimentés pastoraux dans les départements de Belbédji et Tanout, région de Zinder-Lot n°2 et Lot N°3	Conseil Régional/ZR	Travaux	ENTREPRISE ALI KADA	125 491 400
N° 005/FCSE/2020/DREPT/ZR	Travaux de construction d'un Centre de Formation aux Métiers de Zinder	DREPT/ZR	Travaux	ENTREPRISE Mahaman Rabiou Souley Dan Gara	71 433 367
N° 80/GTA/CM P/EF	Réhabilitation de la Mini AEP multi villages de Faska, commune de Tajaé, département d'Illéla dans la région de Tahoua : Lot N°1	DRH/A/TA	Travaux	ENTREPRISE LAOUALI IDI	178.443.880
N° 20/2020/CR/OLL	Travaux de construction et équipement de CSI dans la commune rurale de Ollelewa-Lot N°1	CR/OLLEWA	Travaux	ENTREPRISE ALI HAMA	175 953 460
N° 001/2020/M DUL/SG/DGAC/DGUPL/DMP-DSP	Travaux de construction du marché moderne de Tahoua	MDUL/H	Travaux	SOGEA - SATOM	19 950 734 144
N° 015/2020/D N/MDUL/SG/DGAC/DMP-DSP	Travaux de construction de la nouvelle Case de Passage Présidentielle de Diffa	MDUL/H	Travaux	ENTREPRISE KAKARBA SERVICES	2 328 399 965
N°2020/006/DGGT/DMP-DSP	Travaux de construction du Pont de la Telwa sur la Route Tahaoua-Arlit (Section Agadez-Arlit)	ME	Travaux	CFHEC-LTD	6 015 749 672
2013/022/DGGT/DMP-DSP	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Maradi-Madarounfa-Frontière du Nigéria (106 km)	ME	Travaux	CGC OVERSEAS Construction	2 146 584 382
N°18/SACM/SG/20	Fabrication de poteaux en béton armé à l'usine de Niamey (Goudey)	NIGELEC	Travaux	Entreprise Cherif Moussa	1 093 242 864
N°007/CGP/NELACE P/2016	Réhabilitation des postes sources	NIGELEC	Travaux	PARASIAN HV	1 041 603 746
N°59/TRAV AUX/PGRC-DU/6431/IDA	Lot n°1 : Travaux de réalisation de 2745 ml du Collecteur C3S3 Lot n°2 : Travaux de réalisation de 3530 ml des Collecteurs des C4S3, C9S3 et C10S3	PGRC-DU	Travaux	Groupement VALIMO Group SA/ECR	1 455 073 006
N° 273/2020/M F/L/DGCMP/EF	Travaux de réalisation d'un (1) seuil d'épandage à Alléla (Commune urbaine de Keita), département de Keita-Lot N°1	PRODAFI/TA	Travaux	ENTREPRISE FRERE OUMADAH	266 790 478

## ❖ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

- Ñ Centralisation, gestion et archivage de la documentation : mettre en place un système de classement et d'archivage centralisé pour les documents relatifs aux marchés et contrats. L'ARMP devra éditer dans les plus brefs délais un « manuel de classement et d'archivage des documents » des marchés et contrats à l'intention de toutes les Autorités Contractantes afin de permettre la mise en place d'un système de classement harmonisé et centralisé au niveau des Directions des Finances et du Matériel (DFM) pour les Ministères et les Services Administratifs et/ou Financiers pour les Collectivités Locales, les Projets et les Organismes Personnalisés ;
- Ñ Prévoir une retenue de garantie dans les marchés pour corriger les malfaçons et procéder à la réception définitive des ouvrages une fois le délai de garantie échu ;
- Ñ Faire appliquer les pénalités de retard : un suivi technique plus rigoureux doit être mis en place afin de faire respecter les délais contractuellement prévus. Il est clair que si les conditions ne sont pas respectées par l'Autorité Contractante (retards excessifs de règlement des factures, par exemple), le constat doit en être fait de manière formelle. Par ailleurs, les pénalités de retard contractuelles doivent être appliquées conformément aux marchés si la responsabilité du titulaire est engagée. La non application des pénalités doit être explicitée ;
- Ñ Prévoir dans le budget de fonctionnement des ressources suffisantes pour l'entretien des ouvrages réalisés ou des équipements acquis ;
- Ñ S'assurer de l'utilité des équipements avant d'envisager leur acquisition ;
- Ñ Prendre des dispositions sécuritaires appropriées dans le cas des travaux en zones à risque sinon éviter d'y lancer des travaux ;
- Ñ Associer les services des impôts au démarrage des projets pour anticiper sur les questions d'exonération ;
- Ñ Réaliser une étude d'impact environnemental et social des travaux dans la phase d'avant-projet et mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale correspondant durant leur exécution ;
- Ñ Faire le point de tous les marchés en souffrance (sans mouvement physique ni financier depuis plus d'un an) et résilier ceux dont l'arrêt est de la responsabilité de l'entreprise ;
- Ñ Faire le constat de l'abandon des chantiers, saisir les cautions, résilier le marché et recruter une nouvelle entreprise pour leur achèvement ;
- Ñ Faire le suivi des travaux en cours d'exécution.

## PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

### 1. CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'amélioration de la gestion de ses dépenses publiques, le Gouvernement de la République du Niger a entrepris, entre autres, depuis les années 2011, une réforme en profondeur de son système de passation des marchés publics.

Cette réforme, qui s'aligne sur les meilleurs standards internationaux dans le domaine, a consacré la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adéquat notamment en séparant les fonctions de passation (Autorité Contractantes), de contrôle (Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers) et de régulation (Agence de Régulation des Marchés Publics).

Les changements successifs intervenus, notamment en 2013 et 2016, promeuvent les principes fondamentaux que sont la transparence, l'efficacité et la responsabilisation dans un souci de renforcement du système national de la commande publique et de la gouvernance publique.

Or, l'un des indicateurs importants d'efficacité du système des marchés publics est le taux d'exécution du budget d'investissement à travers les paiements des prestations réalisées. La maîtrise de cet indicateur permet une viabilité du système en procurant les ressources nécessaires aux entreprises pour leur bon fonctionnement et en assainissant les finances publiques par une réduction de la dette intérieure de l'État.

Pour marquer l'amorce de ces changements irréversibles de ce système, et conformément à son mandat, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a sollicité des propositions pour la sélection de consultants dans le cadre de la réalisation de l'audit des marchés publics et des Délégations de Service Public des années 2019, 2020 et 2021.

Cet audit permettra de vérifier la conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés aux dispositions du Code des Marchés Publics et des textes en vigueur.

L'audit des marchés passés au titre de l'exercice budgétaire 2020 sera réalisé conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et concerne quarante (40) Autorités Contractantes.

Pour conduire cet audit, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a recruté le Groupement ICP Sarl et MAC Consulting. Selon les termes de référence, la mission est répartie en trois (3) phases :

- J Phase 1 dite « Audit des marchés publics et des Délégations de Service Public de l'année 2020 » ;
- J Phase 2 dite « Audit de l'exécution physique » pour certifier l'état d'avancement, de réalisation et / ou le niveau de dégradation des biens et services concernés.
- J Phase 3 dite « Renforcement des capacités » de six (6) cadres de l'ARMP ;

Un rapport d'audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le présent document est la version finale du rapport de synthèse de l'audit de l'exécution physique des marchés passés par les quarante (40) Autorités Contractantes.

L'équipe d'experts principaux proposés pour cette mission est composée de :

- Ñ MEGUHE GNOLEBA MATHIEU, Chef de mission, Auditeur, Expert en passation des marchés publics ;
- Ñ GARBA BACHAR, Expert auditeur financier et comptable ;
- Ñ ISSOUFOU MADOUYOU HASSANE, Expert auditeur financier et comptable.



Cette équipe a été appuyée par

- J HERVE ATROKPO, Spécialiste en passation des marchés.
- J MADAME DIALLO FATI ABDOURAHAMAN, Spécialiste en passation des marchés.
- J ABDOU DJAODJE ZAKARI YAOU, Ingénieur de travaux civil et infrastructures.
- J Toute l'équipe locale de MAC Consulting.

Aux termes de la mission, le Groupement ICP Sarl – MAC Consulting exprime ses sincères remerciements à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et aux différentes Autorités Contractantes concernées, pour les facilités et les contributions significatives apportées à la réussite de cette étude à l'issue de laquelle le présent rapport a été rédigé.

## 2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

L'audit de l'exécution physique doit permettre de :

- J certifier l'état d'avancement et / ou le niveau de dégradation des ouvrages concernés ;
- J exprimer son opinion sur la qualité de l'exécution des contrats, cette opinion incluant les aspects techniques, la correspondance entre la réalisation physique et la réalisation financière ;
- J diagnostiquer l'état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports ;
- J formuler des recommandations suite aux constats identifiés à l'issue de la mission.

## 3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE

### 3.1. DETERMINATION DE L'ECHANTILLON POUR L'AUDIT PHYSIQUE

#### 3.1.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE

Les termes de référence indiquent que sur l'échantillon de base (échantillon de l'audit de conformité), le consultant sélectionnera, pour l'audit physique, un lot de marchés représentant 15% en nombre, en excluant les marchés non éligibles à la vérification matérielle auxquels s'ajouteront tous les marchés ayant fait l'objet de recours et ceux passés par entente directe.

#### 3.1.2. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON

L'échantillon obtenu sur la base des hypothèses précédentes, comprend 60 marchés, d'un montant de soixante-cinq milliards six cent soixante-deux un millions huit cent quatre neuf mille huit cent trente-huit (65 662 889 838) FCFA pour lesquels la mission a estimé un certain nombre d'éléments réunis devant lui permettre de donner une opinion.

Il est composé de :

- Ñ vingt-cinq (25) marchés sont passés par appel d'offres ouvert (42%) et représentent 20% de la valeur de l'échantillon ;
- Ñ un (01) marché a été passé par appel d'offres restreint (2%) et représentent 3% de la valeur de l'échantillon ;
- Ñ vingt un(21) marchés (35%) ont été passés par entente directe pour un montant cumulé de 47 097 555 244 fcfa. ils représentent 72% de la valeur de l'échantillon total ;
- Ñ deux (02) marchés ont fait l'objet d'avenant et représentent un montant de 3 188 188 128 fcfa (5% de la valeur de l'échantillon total) ;
- Ñ huit (08) marchés ont été passés par sollicitation de prix - demande de cotation (13%) et représentent un montant de 319 748 473 fcfa (0,5% de la valeur de l'échantillon total) ;
- Ñ trois (03) marchés ont été passés par sollicitation de prix - demande des renseignements et de prix (5%) et représentent un montant de 112 014 231 fcfa (0,2% de la valeur de l'échantillon total).

Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de marchés soumis à l'audit de vérification physique.

Tableau 6: Echantillon par nature

NATURE	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Fournitures et Services courants	33	55%	24 537 350 278	37%
Travaux	27	45%	41 125 539 560	63%
Prestations Intellectuelles	0	0%	0	0%
TOTAL	60	100%	65 662 889 838	100%

La répartition de cet échantillon par mode de passation se présente comme suit :

Tableau 7: Echantillon par mode de passation

MODE DE PASSATION	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Appel d'offres ouvert	25	42%	13 184 183 762	20%
Appel d'offres restreint	1	2%	1 761 200 000	3%
Marchés par Entente Directe	21	35%	47 097 555 244	72%
Avenant	2	3%	3 188 188 128	5%
Solprix - Demande de Cotation	8	13%	319 748 473	0,5%
Solprix - Demande des Renseignements et de Prix	3	5%	112 014 231	0,2%
TOTAL	60	100%	65 662 889 838	100%

### 3.2. DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission d'audit de l'exécution physique s'est déroulée en quatre (4) étapes :

- Ñ les prises de contact ;
- Ñ la revue de la documentation existante ;
- Ñ la collecte des données : visite des sites où les ouvrages / équipements ont été réalisés / livrés ;
- Ñ la rédaction du rapport.

#### 3.2.1. PRISE DE CONTACT

Ce type de mission requiert la pleine collaboration de l'Autorité Contractante. A ce titre il a été planifié une réunion de démarrage de la mission au cours de laquelle, notre équipe :

- Ñ s'est assurée que l'Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de la mission ;
- Ñ a rappelé le périmètre de la mission ;
- Ñ a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport final ;
- Ñ a confirmé avec l'Autorité Contractante le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y afférentes.

#### 3.2.2. REVUE DOCUMENTAIRE

Le consultant a procédé à la collecte et à l'analyse de la documentation existante se rapportant à l'objet de la mission (contrats y compris plans éventuels, devis descriptifs et estimatifs, rapports journaliers de chantiers, procès-verbaux (PV) de visites de chantiers et de réceptions, rapports périodiques d'avancement).

S'agissant des marchés de travaux, la mission a pu se procurer dans certains cas, les contrats de contrôle et les termes de référence assignés aux bureaux de suivi et contrôle des travaux.

### 3.2.3. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN

#### 3.2.3.1. PREPARATION DES TRAVAUX DE TERRAIN

Cette tâche s'est résumée à l'information des services concernés avant le déplacement de l'Expert sur le terrain. Ainsi, à la demande de l'Auditeur, des lettres ont été adressées par l'ARMP (Agence de Régulation des Marchés Publics) aux entités administratives responsables des marchés ciblés.

Après quoi, des points focaux ont été identifiés afin de faciliter l'accès de l'Expert aux ouvrages et aux documents ainsi que les échanges avec les personnes ressources.

#### 3.2.3.2. MISSION DE TERRAIN

Après avoir pris connaissance de la documentation existante se rapportant à la mission, un programme de visites des différents sites a été élaboré en concertation avec l'Autorité Contractante.

Les informations obtenues au cours de cette étape ont été recueillies à partir :

- Ñ des visites des sites où les ouvrages ont été réalisés ;
- Ñ du contrôle physique des biens (fournitures) ;
- Ñ des entretiens avec les services techniques locaux ayant été impliqués dans le processus d'exécution des contrats ;
- Ñ des entretiens avec les représentants des bénéficiaires des opérations.

Le contrôle physique a porté pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants :

- Ñ le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées : contrôle physique des travaux avec les procès-verbaux de réception provisoire ;
- Ñ le diagnostic sur l'état des ouvrages par référence à leur description dans les marchés et leur état actuel compte tenu de leur âge et de leur condition d'utilisation : l'exhaustivité, la qualité des ouvrages au regard des devis quantitatif et estimatif des marchés et spécifications techniques ;
- Ñ la conformité de la réception des ouvrages et des services avec les spécifications techniques ou les termes de référence du marché ;
- Ñ les ordres de services signés.

Plus spécifiquement pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur :

- ) la conformité physique des travaux avec les Procès-verbaux (PV) de réception provisoire et définitive ;
- ) la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site ;
- ) l'état de fonctionnement des ouvrages ;
- ) les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ;
- ) la cohérence des quantités ;
- ) la mise à jour des malfaçons ;
- ) les dangers éventuels pouvant découler de la malfaçon de certains ouvrages.

### 3.2.4. REDACTION DU RAPPORT

Le présent rapport final a pour but de restituer les résultats des investigations effectuées et de formuler les commentaires et les recommandations de l'Auditeur. Il présente :

- ) les constatations générales ;

- ) les conclusions et recommandations ;
- ) les observations pour chaque marché retenu dans l'échantillon ;
- ) les photographies des ouvrages réalisés ou des biens acquis pour chaque marché retenu dans l'échantillon.

### 3.3. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION

En dépit de la bonne collaboration des Autorité Contractantes, nous avons noté quelques difficultés ci-après :

- Ñ une carence documentaire qui ne permettait pas une bonne exploitation des dossiers mis à la disposition de la mission ;
- Ñ Indisponibilité de visiter des travaux à cause des problèmes administratifs ;
- Ñ des zones inaccessibles pour des raisons de sécurité.

## DEUXIEME PARTIE : PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE

### 1. TAUX DE COUVERTURE


Tableau : Taux de couverture globale

AUTORITE	ECHANTILLON A AUDITER	ECHANTILLON AUDITE		SOLDE	OBSERVATIONS
CONTRACTANTE	QTE	QTE	%		
Agence de Modernisation pour l'Entretien Routier	1	1	100%	0	Revue Achevée
Chambre de Commerce d'Industrie du Niger	1	1	100%	0	Revue Achevée
Caisse Nationale de Sécurité Sociale	1	1	100%	0	Revue Achevée
Conseil Régional de Dosso	1	1	100%	0	Revue Achevée
Commune Rurale de Kiota	1	1	100%	0	Revue Achevée
Conseil Régional	1	1	100%	0	Revue Achevée
Conseil Régional de Tahoua	1	1	100%	0	Revue Achevée
Commune Urbaine de Maradi	1	1	100%	0	Revue Achevée
Conseil Régional de Zinder	1	1	100%	0	Revue Achevée
Direction Régional des enseignements professionnels et technique de Zinder	1	1	100%	0	Revue Achevée
Direction Régional des Enseignements Secondaires	2	2	100%	0	Revue Achevée
Direction régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua	1	1	100%	0	Revue Achevée
Formation d'Appui à la Formation Professionnel et l'Apprentissage	2	2	100%	0	Revue Achevée
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix	2	2	100%	0	Revue Achevée
Commune Rurale Ollewa	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'urbanisme de logement et l'Habitat	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'Équipement	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère de la Santé Publique	2	2	100%	0	Revue Achevée
Société Nigérienne de l'Électricité	2	2	100%	0	Revue Achevée
Offices des Produits Vivriers du Niger	2	2	100%	0	Revue Achevée
Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux Risques Climatiques	2	2	100%	0	Revue Achevée
Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain	1	1	100%	0	Revue Achevée
Projet de Gestion de Risque et de Catastrophe pour le Développement Urbain	1	1	100%	0	Revue Achevée
Régional de Gestion du Programme	1	1	100%	0	Revue Achevée

AUTORITE	ECHANTILLON A AUDITER	ECHANTILLON AUDITE		SOLDE	OBSERVATIONS
CONTRACTANTE	QTE	QTE	%		
du Développement de l'Agriculture Familiale					
Université Dan Dicko Dan Koulodo de Maradi	1	1	100%	0	Revue Achevée
Présidence de la République du Niger	2	2	100%	0	Revue Achevée
Cellule Filets Sociaux	2	2	100%	0	Revue Achevée
Centre National des Œuvres Universitaires	1	1	100%	0	Revue Achevée
Direction Générale de la Police Nationale	1	1	100%	0	Revue Achevée
Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires	2	1	50%	1	Marché non mis à disposition
Programme d'Appui au Programme de Développement Sanitaire	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ministère de la Défense Nationale	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère des Enseignements Secondaires	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ministère des Finances	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'intérieur, de la sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Délicieuse	2	2	100%	0	Revue Achevée
Niger Télécoms	2	2	100%	0	Revue Achevée
Unité de gestion Régional de Programme de développement familiale de Maradi	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	3	3	100%	0	Revue Achevée
Assemblée Nationale	2	0	0%	2	L'Autorité a refusé de coopérer
Commission Electorale Nationale Indépendante	2	0	0%	2	L'Autorité a refusé de coopérer
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>92%</b>	<b>5</b>	

Il ressort de ce tableau que 55 marchés (92%) ont été audités physiquement sur les 60 prévus. L'on note aussi que la Préfecture enregistre un faible taux du fait de la non coopération au passage de la mission d'audit.

Graphique 4: Illustration du taux de couverture globale

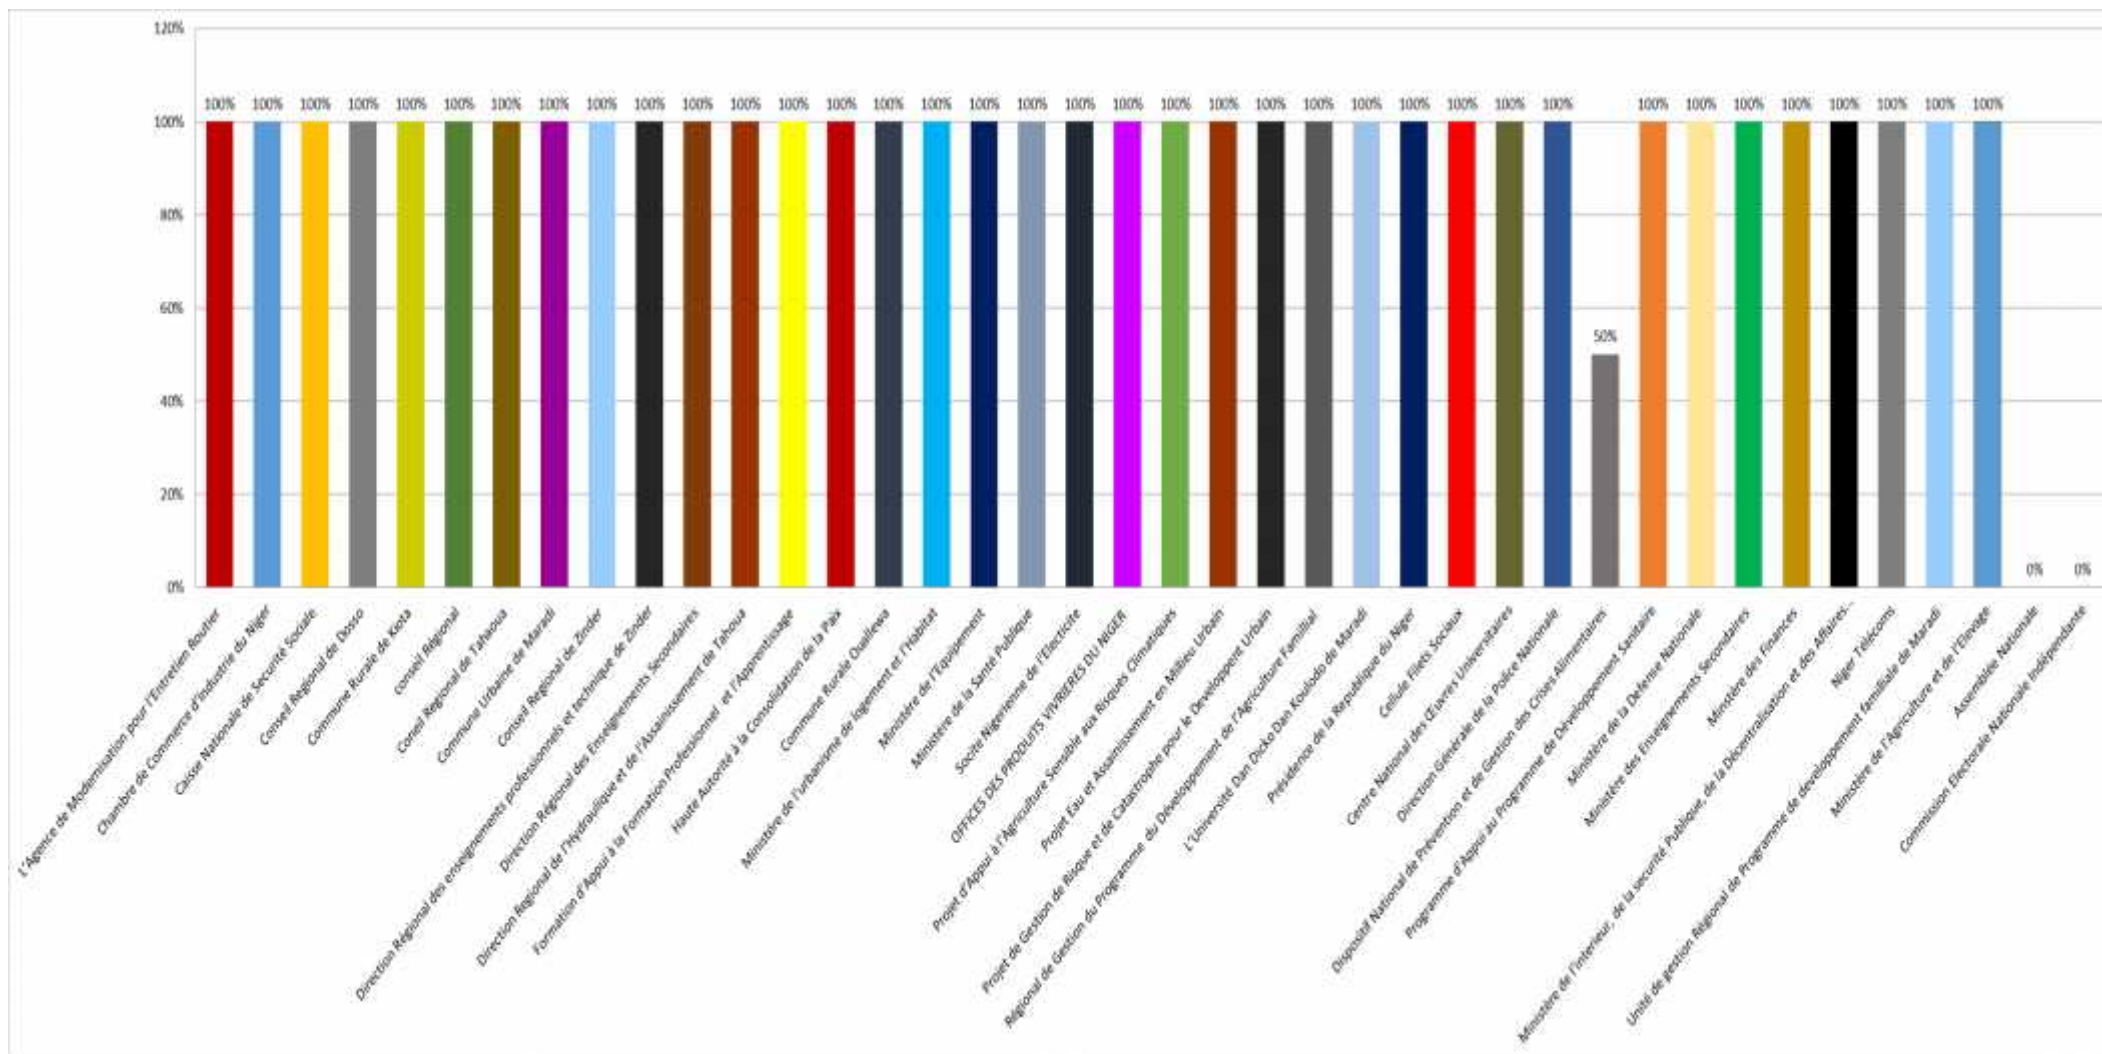

## 2. CONSTATS SPECIFIQUES RECURRENTS

### 2.1. Carence de l'archivage des documents des marchés et notamment de pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de travaux, fournitures et prestations intellectuelles

Tableau 8 : Statistique du nombre de marchés en carence documentaire

AUTORITE CONTRACTANTE	ECHANTILLON AUDITE	NOMBRE DE MARCHES EN CARENCE DOCUMENTAIRE	RATIO
Agence de Modernisation pour l'Entretien Routier	1	1	100%
Chambre de Commerce d'Industrie du Niger	1	1	100%
Caisse Nationale de Sécurité Sociale	1	0	0%
Conseil régionale de Dosso	1	0	0%
Commune Rurale de Kiota	1	1	100%
Conseil Régional de Maradi	1	0	0%
Conseil régionale de Tahoua	1	1	100%
Commune Urbaine de Maradi	1	1	100%
Conseil régionale de Zinder	1	1	100%
Direction Régional des enseignements professionnels et technique de Zinder	1	1	100%
Direction Régional des Enseignements Secondaires	2	0	100%
Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua	1	1	100%
Formation d'Appui à la Formation Professionnel et l'Apprentissage	2	1	50%
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix	2	2	100%
Commune Rurale Ollewa	1	0	0%
Ministère de l'urbanisme de logement et l'Habitat	2	2	100%
Ministère de l'Equipement	2	0	0%
Ministère de la Santé Publique	2	1	50%
Société Nigérienne de l'Electricité	2	0	0%
Offices des Produits Vivriers du Niger	2	0	0%
Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux Risques Climatiques	2	0	0%
Projet Eau et Assainissement en Millieu Urbain	1	1	100%
Projet de Gestion de Risque et de Catastrophe pour le Développement Urbain	1	1	100%
Régional de Gestion du Programme du Développement de l'Agriculture Familiale	1	0	0%
l'Université Dan Dicko Dan Koulodo de Maradi	1	0	0%
Présidence de la République du Niger	2	0	0%
Cellule Filets Sociaux	2	2	100%
Centre National des Œuvres Universitaires	1	1	100%
Direction Générale de la Police Nationale	1	0	0%
Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires	2	1	50%



AUTORITE CONTRACTANTE	ECHANTILLON AUDITE	NOMBRE DE MARCHES EN CARENCE DOCUMENTAIRE	RATIO
Programme d'Appui au Programme de Développement Sanitaire	1	0	0%
Ministère de la Défense Nationale	2	0	0%
Ministère des Enseignements Secondaires	1	0	0%
Ministère des Finances	2	1	50%
Ministère de l'intérieur, de la sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et religieuse	2	2	100%
Niger Télécoms	2	0	0%
Unité de gestion Régional de Programme de développement familiale de Maradi	1	1	100%
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	3	1	33%
Assemblée Nationale	2	2	100%
Commission Electorale Nationale Indépendante	2	2	100%
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>48%</b>

Il ressort de ce tableau que la documentation de 48% des marchés passés par les autorités contractantes est mal archivée ou indisponible.

## 2.2. Equipements acquis mais non utilisés, à l'abandon ou mal entretenus

Tableau 9: Statistique des équipements acquis mais non utilisés

AUTORITE CONTRACTANTE	ECHANTILLON AUDITE	NOMBRE DE MARCHES CONCERNES	POURCENTAGE
Agence de Modernisation pour l'Entretien Routier	1	0	0%
Chambre de Commerce d'Industrie du Niger	1	0	0%
Caisse Nationale de Sécurité Sociale	1	0	0%
Conseil régionale de Dosso	1	0	0%
Commune Rurale de Kiota	1	0	0%
Conseil Régional	1	0	0%
Conseil régionale de Tahoua	1	0	0%
Commune Urbaine de Maradi	1	0	0%
Conseil régionale de Zinder	1	0	0%
Direction Régional des enseignements professionnels et technique de Zinder	1	0	0%
Direction Régional des Enseignements Secondaires	2	0	0%
Direction régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua	1	0	0%
Formation d'Appui à la Formation Professionnel et l'Apprentissage	2	0	0%
Haute Autorité à la Consolidation de la Paix	2	1	50%
Commune Rurale Ollewa	1	0	0%
Ministère de l'urbanisme de logement et l'Habitat	2	0	0%
Ministère de l'Equipement	2	0	0%

AUTORITE CONTRACTANTE	ECHANTILLON AUDITE	NOMBRE DE MARCHES CONCERNES	POURCENTAGE
Ministère de la Santé Publique	2	0	0%
Société Nigérienne de l'Electricité	2	0	0%
Offices des Produits Vivriers du Niger	2	0	0%
Projet d'Appui à l'Agriculture Sensible aux Risques Climatiques	2	0	0%
Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain	1	0	0%
Projet de Gestion de Risque et de Catastrophe pour le Développement Urbain	1	0	0%
Régional de Gestion du Programme du Développement de l'Agriculture Familiale	1	0	0%
Université Dan Dicko Dan Koulodo de Maradi	1	0	0%
Présidence de la République du Niger	2	0	0%
Cellule Filets Sociaux	2	0	0%
Centre National des Œuvres Universitaires	1	0	0%
Direction Générale de la Police Nationale	1	0	0%
Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires	2	0	0%
Programme d'Appui au Programme de Développement Sanitaire	1	0	0%
Ministère de la Défense Nationale	2	0	0%
Ministère des Enseignements Secondaires	1	0	0%
Ministère des Finances	2	0	0%
Ministère de l'intérieur, de la sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et religieuse	2	0	0%
Niger Télécoms	2	0	0%
Unité de gestion Régional de Programme de développement familiale de Maradi	1	0	0%
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage	3	0	0%
Assemblée Nationale	2	0	0%
Commission Electorale Nationale Indépendante	2	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>2%</b>

Un marché (01) marché d'une valeur de six cent trente millions sept cent six mille six cent cinquante-deux (409 333 038) francs CFA.

### 3. RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE

#### 3.1. AMODER

##### 3.1.1. MARCHE DE TRAVAUX : N° 1E SECTION 2 (RN\_N0001E02) DOSSO – DOUTCHI PK 59+8 – PK 136, TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES BITUMÉES ROUTE NATIONALE.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	2020/03/AMODER
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE MOREY
Mission de contrôle :	AMODER
Localisation :	DOSSO-DOUTCHI
Date de visite :	14/04/21
Date d'approbation du contrat	Aucun
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES BITUMÉES ROUTE NATIONALE N° 1E SECTION 2 (RN_N0001E02) DOSSO – DOUTCHI PK 59+8 – PK 136
Montant du marché initial (FCFA)	1 886 579 471 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Aucun
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	98 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui /disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie de chef de division technique de l'AMODER
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
Nous avons constatés :
  - ) les travaux ont été réalisés dans les normes ;
  - ) une partie ou le perré maçonné est couvert des latérites pk65 ;
  - ) fissures au début du tronçon ;
  - ) matériel replié à 80%.
- ❖ Conclusions, recommandations : A la date de la visite nous avons constaté que les travaux sont en cours à taux d'avancement de 98% et aussi les travaux sont en train d'être fait dans les respects des normes en vigueur. Néanmoins nous recommandons à l'autorité contractante d'amener l'entreprise à corriger les travaux.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Apparitions des fissures sur la chaussée



Laterites au niveau des berges de la chaussée



Laterites sur les perrés maçonnés non dégagés

### 3.2. CHAMBRE D'INDUSTRIE ET D'ARTISANAT DU NIGER

MARCHE DE TRAVAUX: N°001/CCIN/DRH/M/2020 Construction d'un bâtiment R+2 à la CCIN.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 001/CCIN/DRH/M/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE ISSOUFOU GARBA
Mission de contrôle :	CARIA
Localisation :	NIAMEY
Date de visite :	23/04/2021
Date d'approbation du contrat	Aucun
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+2 A LA CCIN.
Montant du marché initial (FCFA)	248 722 415 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	12 Mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	96%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Aucun
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui /disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie du représentant de la chambre du commerce et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : A la date de notre visite les travaux sont en cours mais ils sont à un taux de 96 % selon le dernier procès-verbal. Ainsi, les travaux sont
- ❖ Conclusions, recommandations :
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



VUE GENERAL DES TRAVAUX



TRAVAUX EN COURS



PROBLEMES DES MENUISERIES

### 3.3. CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

#### 3.3.1. MARCHE DE TRAVAUX : CONSTRUCTION D'UNE VILLA HAUT STANDING A DIFFA (PROGRAMME DIFFA N'GALA 2020).

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 00 1/2020CNSS
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE TINTOUNA SARLU
Mission de contrôle :	CAUBA
Localisation :	DIFFA
Date de visite :	01 / 04 / 2021
Date d'approbation du contrat	26 / 03 / 2020
Date de notification du contrat	AUCUN
Nature des travaux	Construction d'une Villa haut standing
Montant du marché initial (FCFA)	143.959.558 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	AUCUN
Délai d'exécution contractuel	Six (06) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	OUI, les travaux ont été réceptionnés provisoirement
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paiement, bon d'achat)
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie de responsable technique DIFFA NGALLA et ceux de CNSS et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
A la date de notre visite les travaux sont réceptionnés provisoirement. Ainsi, les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art prescrit dans les cahiers des prescriptions techniques.
- ❖ Conclusions, recommandations :  
Les travaux ont été faits dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'Autorité Contractante de continuer dans le même sens pour les travaux futurs.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue d'ensemble du bâtiment



Vue intérieure du bâtiment



Mur de clôture



### 3.4. CR DOSSO

#### 3.4.1. MARCHE DE TRAVAUX : TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AXE RR3-002/KOUTOUMBOU-GUEZA/EMBRANCHEMENT RR2-LOT N°06

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	MARCHE N°102/MF/DGCMP/EF/CMP/EF/DO/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	GTI SARL
Mission de contrôle :	CI-CHAIBOU MAMAN SNI
Localisation :	DOSSO
Date de visite :	14/04/2020
Date d'approbation du contrat	16/10/2020
Date de notification du contrat	02/10/2020
Nature des travaux	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AXE RR3-002/KOUTOUMBOU-GUEZA/EMBRANCHEMENT RR2-LOT N°06
Montant du marché initial (FCFA)	84 383 651 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	AUCUN
Délai d'exécution contractuel	3 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	NON
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Conforme aux normes
PV de réception (provisoire, finale)	Oui, les travaux ont été réceptionnés provisoirement : le Mardi 08 décembre 2020
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui/disponible/ payer en totalité
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie du responsable assistance ouvrage du conseil Régional de Dosso
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :
  - A la date de notre visite les travaux sont réceptionnés provisoirement ;
    - ] On a constaté un ravinement au niveau des gabions ;
    - ] On a constaté aussi la présence des tôles nodules sur la piste.
- ❖ Conclusions, recommandations :
  - ] Nous avons constaté que les travaux sont faits dans le respect des règles de l'art selon les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins
  - ] Nous recommandons que l'entreprise corrige les imperfections constatées.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



PANNEAU SIGNALISATION



TOLES NODULES PISTE RURALES



RAVINEMENT DES GABION



VUE PISTES

### 3.5. COMMUNE RURALE DE KIOTA

#### 3.5.1. MARCHE DE TRAVAUX : travaux de construction d'une digue de protection en béton cyclopéen y compris déversoir et surcreusement de la mare, les traitements des koris..

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	001/TRAVAUX/PASEC/DO/CR/KIOTA
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE OULD
Mission de contrôle :	CI CHAIBOU MAMAN SANI
Localisation :	KIOTA/DOSSO
Date de visite :	14/04/21
Date d'approbation du contrat	Aucun
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES BITUMÉES ROUTE NATIONALE N° 1E SECTION 2 (RN_N0001E02) DOSSO – DOUTCHI PK 59+8 – PK 136
Montant du marché initial (FCFA)	142 984 688 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Aucun
Délai d'exécution contractuel	6 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Conforme aux normes
PV de réception (provisoire, finale)	Oui les travaux ont été réceptionnés provisoirement en février 2021
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie du représentant de la mairie de kiota et les documents ont été mis à notre disposition pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
A la date de notre visite les travaux sont réceptionnés provisoirement. Ainsi on a constaté que les travaux ont été faits dans les respects des règles de l'art.
- ❖ Conclusions, recommandations : Nous avons constaté que les travaux sont terminés et exécutés dans les normes en vigueur et nous recommandons à l'autorité contractante de continuer dans ce sens pour les travaux futurs.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Béton cyclopéen



Digue de protection



Traitements des koris

### 3.6. Conseil Régional de Maradi

#### 3.6.1. Marché N 06/2020/CR/MI/PACT Travaux de construction d'un marché a mixte à Bamo dans la commune rurale de Djirataoua; département de Madarounfa

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N 06/2020/CR/MI/PACT
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE GIO
Mission de contrôle :	MAC SARL
Localisation :	Bamo commune de Djirataoua
Date de visite :	07/04/2021
Date d'approbation du contrat	21/09/2020
Date de notification du contrat	21/09/2020
Nature des travaux	Travaux de construction d'un marché a mixte a Bamo dans la commune rurale de Djirataoua ; département de Madarounfa
Montant du marché initial (FCFA)	288 704 229 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	Trois (03) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Oui
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Provisoire 08/04/2021
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paiement, bon d'achat)
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée ; en compagnie du conseil régional Maradi et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté :

- ) une légère fissure au niveau du mur du côté ouest et de raccordement ;
- ) une légère fissure du joint d'entrer et du bloc administratif du côté d'en face et du derrière.

- ❖ Conclusions, recommandations :

D'une manière générale les travaux ont été ait dans les règles de respect des cahiers des prescriptions techniques.

- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vu de l'extérieure du marché Bamo



Apparition des fissures

### 3.7. CONSEIL REGIONAL DE TAHAOUA

#### 3.7.1. Marché N°002/CRTA/2020 Construction de deux blocs de deux salles de classes au CEG de Tounfafi dans le département de Madaoua e

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 002/CRTA/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	MAHAMADOU ABDOURAHAMANE
Mission de contrôle :	Génie Rural Madaoua
Localisation :	Tounfafi
Date de visite :	14/04/2021
Date d'approbation du contrat	30/03/20
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	Construction de deux blocs de deux salles de classes au CEG de Tounfafi dans le département de Madaoua
Montant du marché initial (FCFA)	34 665 697 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	24mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Technique 31/07/20, Réceptions Provisoire 08/09/20
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	100%

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : En compagnie d'un représentant de l'urbanisme Tahoua et génie rural Madaoua et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté :

- ) apparition des termites sur les deux blocs (forme d'aire et plafond);
- ) fissures très profond au niveau du terrasse du premier bloc de la classe ;
- ) fissure profonde aussi au niveau de la rampe d'accès et le raccordement est mal fait
- ) problème de pose des serrures au niveau des fenêtres.

❖ Conclusions, recommandations :

- ✓ de corriger les constats cités ci-haut ;
- ✓ accélérer les rythmes des travaux afin de finir dans le délai.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements





VUE DE L'EXTERIEURE



DEGRADATION DE FORME D'AIRE



PROBLEME DES RACCODEMENTS



### 3.8. Commune rurale de Tibiri de Maradi

#### 3.8.1. Marché N 01/CUT/MI/2020 : Travaux de construction d'un bloc de trois salles de classes a garin maje dans la commune urbaine de Tibiri

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 01/CUT/MI/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE Mahaman Sahirou Abadjj
Mission de contrôle :	Génie Rurale
Localisation :	Garin maje (tibiri)
Date de visite :	06/04/2021
Date d'approbation du contrat	Non fourni
Date de notification du contrat	Non fourni
Nature des travaux	Travaux de construction d'un bloc de trois salles de classe a Garin maje dans la commune urbaine de Tibiri
Montant du marché initial (FCFA)	27 07197 500FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	Trois (03) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Provisoire 10/10/ 2020
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paiement, bon d'achat)
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons les constats suivants :

- ) Le mur à une légère fissure ;
- ) La terrasse d'entrer et le dallage intérieur sont en état de dégradation;
- ) Le crépissage dans les classes n'est pas bien fait, les écorces de ciment se détachent;
- ) Le manque de plafond dans les trois blocs de classes.

❖ Conclusions, recommandations :

- ) Mise à part ses observations cite haut ; les travaux sont faits dans les respects des règles de l'art.
- ) Nous recommandons la commune a corrigé les lacunes constatées physiquement.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General des classes



Dégradation du dallage intérieur



Dégradation de la terrasse.

### 3.9. Conseil Régional de Zinder

#### 3.9.1. Marché N°05/2020/CR/ZR Construction de 07 puits cimentés pastoraux dans le département de Belbedji et Tanout Lot n°2 et 3

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 05/2020/CR/ZR
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE ALI KADA
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Kanak Mosquée
Date de visite :	02/04/2021
Date d'approbation du contrat	26/11/2020
Date de notification du contrat	24/11/2020
Nature des travaux	Construction de 07 puits cimentés pastoraux dans le département de Belbedji et Tanout Lot n°2 et 3
Montant du marché initial (FCFA)	125 491 400 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	10 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	27%
Conformité des travaux :	En bonne voie
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	
Indication de fraude ou de corruption possible	Aucun
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée ; en compagnie du directeur départemental et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté :

- ) les travaux sont en cours ;
- ) les manques d'équipements sur le terrain ;
- ) l'insuffisance de la main d'œuvre.

❖ Conclusions, recommandations :

Nous avons constaté que les travaux sont en cours dans les respects des règles de l'art. Ainsi nous recommandons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue des puits en cour d'exécutions

### 3.10. DREPT/ZR

#### 3.10.1. Marché N°005/FCSE/2020/DREPT/ZR Travaux de construction d'un centre de formation aux métiers de Zinder :

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 005/FCSE/2020/DREPT/ZR
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE Mahaman Rabiou Souley Dan Gara
Mission de contrôle :	CEDDU
Localisation :	ZINDER
Date de visite :	002/04/2021
Date d'approbation du contrat	Aucun
Date de notification du contrat	20/09/2020
Nature des travaux	Travaux de construction d'un centre de formation aux métiers de Zinder
Montant du marché initial (FCFA)	71 433 367FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Il y a eu un avenant de prolongation de deux mois
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	85%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Provisoire 29/09/ 2020
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paiement, bon d'achat)
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée : Nous avons effectué la visite du chantier en compagnie du personnel du DREPT/ZR et aussi les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A la date de notre visite nous avons constaté que Les travaux sont en cours et avancent normalement.

❖ Conclusions, recommandations :

Nous recommandons à l'autorité contracte de mettre tout en œuvre pour amener l'entreprise a livré les travaux dans le délai contractuel.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



VUE BLOC ADMINISTRATION

### 3.11. DRES/MI

#### 3.11.1. Marché N 01/DRES/2020/MI Travaux de construction de 08 latrines scolaires a deux compartiments chacun dans la région de Maradi.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 01/DRES/2020/MI
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE EKA
Mission de contrôle :	AUCUN
Localisation :	Maradi (Sarkin haoussa)
Date de visite :	06/04/2021
Date d'approbation du contrat	18/10/ 2020
Date de notification du contrat	06/10/ 2020
Nature des travaux	Travaux de construction de 08latrine scolaire a deux compartiments chacun dans la région de Maradi
Montant du marché initial (FCFA)	17 321 983 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	UN (01) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Aucun
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Aucun
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	
Conformité des travaux :	Non Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Provisoire 08/12/2020
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paieiment effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paieiment, bon d'achat)
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse
  - ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :
    - Nous avons constaté que l'entreprise à réhabilitée les blocs des latrines existants : Ils ont effectué des crépissages et peinture au niveau des anciens trois blocs latrines.
  - ❖ Conclusions, recommandations :
    - )] les travaux ont consisté seulement à réhabilitée les anciennes latrines ;
    - )] ainsi nous recommandons à la direction d'amener à exécuter les travaux.
- L'entreprise EKA n'avais pas fait ces trois blocs de latrine.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue générale des latrines



vue intérieur des latrines



### 3.12. DRHA TA

#### 3.12.1. MARCHE DE TRAVAUX : REHABILITATION DE LA MINI AEP MULTI VILLAGE DE FASKA (COMMUNE DE TAJAE DEPARTEMENT D'ILLELA

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 80/GTA/CMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE LAOUALI IDI
Mission de contrôle :	DRHA/TA
Localisation :	TAHOUA
Date de visite :	12 / 04 / 2021
Date d'approbation du contrat	04/ 06 / 2020
Date de notification du contrat	ND DISPONIBLE
Nature des travaux	Réhabilitation de la mini AEP Multi village de FASKA (commune de Tajaé département d'Illela.
Montant du marché initial (FCFA)	178.443.880 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Oui, 30% du montant de marché
Délai d'exécution contractuel	QUATRE (04) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Pas disponible
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	80 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Oui un retard de deux (02) mois.
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Pas disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie avec le directeur régional de l'hydraulique de Tahoua et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
On a fait les constats ainsi qui suivent :
  - ) les travaux sont en cours et non réceptionné ;
  - ) la poutre sur l'air assainissement n'est pas bien fixé.

Néanmoins, Les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art prescrit dans les cahiers des prescriptions techniques.
- ❖ Conclusions, recommandations :  
Les travaux ont été faits dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'autorité contractante de prendre toutes les dispositions pour terminer les travaux dans le délai.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Forage et abri groupe



Réservoir



Tuyauteries



Borne fontaine



Fissures sur le canal

### 3.13. FAFPA

#### 3.13.1. MARCHE N°011/UCP/PPAO/SP/2019 RELATIF A L'ACQUISITION DE ROULEUR-CALIBREUR TABLES D'EXTRACTION D'HUILE D'ARACHIDE ET BOYEUR.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N°002/FAFA/AON/2020
Entreprise (Titulaire du Marché)	Ets Yacouba Maman
Localisation	Zinder
Date de visite	06/04/2021
Date approbation du contrat	Aucune
Date de notification du contrat	Aucun
Description sommaire des fournitures	Acquisition et installation de 08 groupes électrogènes pour les 08 antennes régionales du FAFA
Montant du marché initial (FCFA)	66 164 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	20 Jours
Date effective de livraison	04/09/2020
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Stratégie et budget d'entretien	
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement. Factures)
Autres commentaires	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observation sur la qualité des travaux ou des équipements : à la date de notre visite la fourniture du groupe électrogène a été faite. Selon les procès de réception provisoire, le groupe répond à spécifications techniques demandées.
- ❖ Quelques images de fourniture :



VUE DU GROUPE ELECTROGENE



IMAGES DU GROUPE ELECTROGENE DE L'ANTENNE DE NIAMEY AU QUARTIER KOIRA KANO

3.13.2. MARCHES DE FOURNITURE : 001/FAFPA/AON/2020 / Acquisition des matériels roulants pour la direction générale du FAFPA.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	001/FAFPA/AON/2020
Entreprise (Titulaire du marché)	Etablissement EBA BP : 1040
Localisation	NIAMEY
Date de visite	14/04/2021
Date d'approbation du contrat	vendredi 12 juin 2020
Date de notification du contrat	Provisoire: 28/05/2020
Description sommaire des fournitures	4 TOYOTA HILUX LAN25-PRMDEN E2 & 1 TOYOTA RAV4
Montant du marché initial (FCFA)	146 608 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA)	Pas d'avenant
(Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	Immédiat, l'OS du 17 Juin
Date effective de livraison	16/07/2020
Procès-verbal de livraison	PV du 16/07/2020, conforme aux quantités contractuelles
Conformité de la quantité livrée	Conforme
(au cas contraire donner les raisons)	
Évaluation du dépassement de délai	Délai de livraison non respecté
(Donner les raisons si dépassement de délai)	
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a été intégralement payé par mandatement
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- ) la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble
- ) Tous les documents sont disponibles et bien classés
- ) Bon archivage

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

- ) Les fournitures sont des véhicules.
- ) On a constaté que les véhicules ont été réceptionnés à 100% à Niamey et sanctionné la livraison par des procès-verbaux.
- ) Nous avons constaté que les deux véhicules ont été transférés à Tahoua et Maradi.
- ) L'un des véhicules de Niamey est en mission.
- ) Nous avons constaté le non-respect du délai contractuel de la livraison des véhicules.

❖ Conclusions, recommandations : Donner un délai contractuel raisonnable.

❖ Quelques images des véhicules :





TOYOTA Rav4 basée au Bureau du FAFPA à Niamey, Quartier Koira Kano



Carte grise de la TOYOTA HILUX basée au Bureau du FAFPA à Niamey, Quartier Koira Kano



Carte grise de la TOYOTA HILUX affectée à Maradi



Carte grise de la TOYOTA HILUX affectée à Tahoua



Carte grise de la TOYOTA HILUX affectée à Diffa

REPUBLIQUE DU NIGER  
Fraternité-Travail-Progress

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS  
PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES



FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET A L'APPRENTISSAGE (FAFPA)  
BP. 12 745 NIAMEY (NIGER)

**TRANSFERT DE VEHICULE**

ANTENNE	NO D'IMMATRICULATION DU VEHICULE	MARQUE ET NO DE CHASSIS	FOURNITURE	ETAT	EMMERGEMENT
MARADI	EP 0378	TOYOTA H LUX 4*4 AHTFZ29GT9390 43536	Manuel de conducteur	NEUF	
			Assurance		
			Radio		
			Pneu secours neuf		
			Cricue		
			Démonte Roue		
			Manivelle		
			Trousse à clé		
			Extincteur		
			Ensemble triangle		
			2 ampoules H4 Secours		
			Plaquettes Fusibles		

Fait à Niamey le 19 Aout 2020


**CHEF DEPARTEMENT RESSOURCES**

M. NASSIROU ALIO



**DIRECTEUR GENERAL**

M. ABDOU DJERMA  
LAWAL





REPUBLIQUE DU NIGER  
Fraternité-Travail-Progress

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  
PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES



FONDS D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET A L'APPRENTISSAGE (FAFPA)  
BP. 12 745 NIAMEY (NIGER)

### TRANSFERT DE VEHICULE

ANTENNE	N° d'IMMATRICULATION DU VEHICULE	MARQUE ET N° DE CHASSIS	FOURNITURE	ETAT	EMMERGEMENT
TAHOUA	EP 0379	TOYOTA HILUX 4*4 MRODBCDXJD17 2953	Manuel de conducteur	NEUF	
			Assurance		
			Radio		
			Pneu secour neuf		
			Crique		
			Demonte Roue		
			Manivelle		
			Trousse a clé		
			Extincteur		
			Ensemble triangle		
			2 ampoules H4 Secours		
Plaquettes Fusibles					

Fait à Niamey le 19 Aout 2020

CHEF DEPARTEMENT RESSOURCES

M. NASSIROU ALIO



DIRECTEUR GENERAL

M. ABDOU DJERMA  
LAWAL



### 3.14. HAUTE AUTORITE A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX

#### 3.14.1. MARCHE : 016/2020/HACP/DRFM Construction d'infrastructure (salle de classe) dans la commune rurale de Badaguichiri.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	016/2020/HACP/DRFM
/Entreprise (Titulaire du marché) :	DIGI GLOBAL BTP/H
Mission de contrôle :	Génie rural Illela
Localisation :	Tahoua
Date de visite :	13/04 /2021
Date d'approbation du contrat	19/ 06/ 2020
Date de notification du contrat	Non disponible
Nature des travaux	Construction d'infrastructure (salle de classe) dans la commune rurale de Badaguichiri
Montant du marché initial (FCFA)	409 333 038 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	4 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	15 %
Conformité des travaux :	Non Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Oui
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont à l'arrêt
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Pas disponible
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A la date de notre visite, les travaux sont en arrêt et abandonnés. Ainsi on a fait les constats suivants :

- ) Des fissures sur les ouvrages ;
- ) Dégradations du dallage de la terrasse d'entrée ;
- ) Mauvais raccordement de l'escalier.

❖ Conclusions, recommandations :

Les travaux n'ont pas été faits dans les respects des règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'autorité contractante de prendre toutes les dispositions pour amener l'entreprise à finir les travaux dans le plus bref délai et aussi de corriger toutes les imperfections constatées.

❖ Quelques images des ouvrages.



Bloc des classes



Blocs des classes terminés



Fissures sur constatés

3.14.2. MARCHÉ : 016/2020/HACP/DRFM Construction d'infrastructure (salle de classe) dans la commune rurale de Badaguichiri.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	031/2020/HACP/DRFM
/Entreprise (Titulaire du marché) :	DIGI GLOBAL BTP/H
Mission de contrôle :	Direction Régional de l'hydraulique
Localisation :	13/04 /2021
Date de visite :	19/ 06/ 2020
Date d'approbation du contrat	Non disponible
Date de notification du contrat	Construction d'infrastructure (salle de classe) dans la commune rurale de Badaguichiri
Nature des travaux	Travaux
Montant du marché initial (FCFA)	409 333 038
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	4 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Non Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Non
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont réceptionnés le 13/04/2021
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Pas disponible
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie de la direction régionale de l'hydraulique de Tahoua et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A la date de notre visite, les travaux sont réceptions provisoirement.

❖ Conclusions, recommandations :

Les travaux ont été faits dans les respects des règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'autorité contractante de continuer dans le même sens.

❖ Quelques images des ouvrages.



Vue du château et clôture



Groupe électrogène



Borne fontaine

### 3.15. Mairie Oullewa

#### 3.15.1. Marché N°26/2020/CR/OLL : Travaux de construction et équipement de CSI dans la commune rural d'Oullewa Lot n°1.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 20/2020/CR/OLL
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE ALI HAMA
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Zarmou
Date de visite :	02/04/2021
Date d'approbation du contrat	18/11/2020
Date de notification du contrat	18/11/2020
Nature des travaux	Travaux de construction et équipement de CSI dans la commune rural d'Oullewa Lot n°1
Montant du marché initial (FCFA)	175 953 460 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	77%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	10 jours dus au manque du personnel
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée ; en compagnie du maire de Oullewa et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté que :

- ) Les travaux sont toujours en cours ;
- ) Les équipements sont en manquant ;
- ) Les personnels étaient insuffisants.

❖ Conclusions, recommandations :

A la date de notre visite, les travaux sont toujours en cours et nous recommandons à l'autorité contractante de prendre toutes les dispositions nécessaires pour amener l'entreprise à terminer les travaux dans le délai contractuel.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



VUE DE BLOC CSI



VUE DU BLOC INFIRMERIE

### 3.16. MD/HABITAT

#### 3.16.1. Marché N°001/2020/MDUL/SG/DGAC/DGUPL/DMP-DSP Travaux de construction du marché moderne de Tahoua

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 001/2020/MDUL/SG/DGAC/DGUPL/DMP-DSP
/Entreprise (Titulaire du marché) :	SOGEA -SATOM
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Tahoua
Date de visite :	13/04/2021
Date d'approbation du contrat	Aucun
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	Travaux de construction du marché moderne de Tahoua
Montant du marché initial (FCFA)	19 950 734 144 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	5 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	90%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Aucun
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : En compagnie du directeur de l'urbanisme

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté qu'à la date de notre visite les travaux sont toujours en cours d'exécution. Ainsi, nous avons énuméré les imperfections sur les blocs suivants :

Administration (RDC et R+1)

- J Raccorder les alentours des interrupteurs dans les salles d'eau
- J Placer le crochet de la porte de l'entrée principale
- J Finaliser les travaux dans les salles d'eaux à l'étage  
Bâtiment G2
- J Uniformiser la peinture extérieure
- J Lavé les carreaux à l'acide
- J Prévoir la rampe d'accès à la toilette  
Bâtiment A6
- J Prévoir des marches d'accès extérieur cote bâtiment G2
- J Placer les couvres joint souples au niveau des joints
- J Poncer la dalle r+1 ainsi que les plancher haut avant l'application de la peinture  
Bâtiment D1 à D7
- J Finaliser la peinture intérieure et faire le raccordement de la peinture sol-mur et sol-poteaux



) Raccorder les nez des marches des escaliers extérieurs et faire la finition des marches présentant un défaut de coffrage (alignement)

❖ Conclusions, recommandations :

Veiller à la réparation des observations citées :

- ✓ De finaliser le point cité ci-haut
- ✓ Prendre toutes les dispositions pour aménager l'aval du canal conformément au projet d'exécution avant la saison de pluies afin de protéger l'habitation qui s'y trouve
- ✓ Finaliser les boutiques se trouvant tout au long du canal
- ✓ Démarrer et finir les travaux de caniveaux parallèles au canal avant la saison des pluies.
- ✓ Il a été retenu de placer les chambres froides sur les plateformes de l'ancien bâtiment D21.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General du marché



Boutique exterieur en cours d'execution



Vue du Degradation du dallage

3.16.2. MARCHE DES TRAVAUX : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASE PRESIDENTIELLE DE DIFFA (PROGRAMME DIFFA N'GALA 2020)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 015/2020/DN/MDUL/SG/DGAC/DMP-DSP TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASE PRESIDENTIELLE
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE KAKARBA SERVICES
Mission de contrôle :	
Localisation :	DIFFA
Date de visite :	01 / 04 / 2021
Date d'approbation du contrat	Non fourni
Date de notification du contrat	Non fourni
Nature des travaux	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASE PRESIDENTIELLE
Montant du marché initial (FCFA)	2.328.399.965 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	AUCUN
Délai d'exécution contractuel	Six (06) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux ont été réceptionnés provisoirement
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Non Fourni
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :
  - ) On a constaté des fissures sur les murs intérieurs.
  - ) Néanmoins, Les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art prescrit dans les cahiers des prescriptions techniques.
- ❖ Conclusions, recommandations :
 

Les travaux ont été faits dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'autorité contractante de continuer dans le même sens sur les travaux à l'avenir.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue d'ensemble du bâtiment



Vue intérieur du bâtiment



Fissures pour mur d'intérieur

### 3.17. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT(ME)

Marché N°2020/006/DGGT/DMP-DSP : Travaux de construction du pont de la Telwa sur la route Tahoua-Arlit (section Agadez-Arlit)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	Marché N°2020/006/DGGT/DMP-DSP
/Entreprise (Titulaire du marché) :	CFHEC-LTD
Mission de contrôle :	GROUPEMENT ART ET GENIE ET BELT
Localisation :	AGADEZ
Date de visite :	16/04/2021
Date d'approbation du contrat	18/03/2020
Date de notification du contrat	18/01/2020
Nature des travaux	Travaux de construction du pont de la Telwa sur la route Tahoua-Arlit (section Agadez-Arlit)
Montant du marché initial (FCFA)	8 162 334 054
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant à la date de la visite, mais il est en préparation de validation
Délai d'exécution contractuel	4 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué/ disponible
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	62.2%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Non
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : En compagnie du directeur adjoint Régional de l'équipement, nous avons visité l'ouvrage.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
Nous avons constaté que :
  - ) A la date de notre visite les travaux sont toujours en cours d'exécution ;
  - ) Le non paiement des décomptes de l'entreprise par l'Etat ce qui rend difficile l'avancement des travaux et les paiements des fournisseurs et les personnels de cette dernière.
- ❖ Conclusions, recommandations :  
Nous avons constaté que les travaux se déroulent dans le respect des règles de l'art et des normes comme prescrit dans les cahiers des prescriptions techniques. Ainsi, nous recommandons à l'Etat de prendre toutes les dispositions pour mettre l'entreprise dans ces droits pour accélérer le rythme des travaux vue que la période des pluies avance très rapidement.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General des travaux



Tabliers préfabriquées

Marché des travaux : travaux d'aménagement et de bitumage de la route Maradi- Madarounfa – Frontière du Nigeria (106 km)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	AV N°2 au 2013/022/DGGT/DMP-DSP Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Maradi-Madarounfa-Frontière du Nigeria (106 km)
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE CGC OVERSEAS Construction
Mission de contrôle :	TECHNI- CONSULT
Localisation :	Maradi
Date de visite :	01 / 04 / 2021
Date d'approbation du contrat	Non fourni
Date de notification du contrat	Non fourni
Nature des travaux	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Maradi-Madarounfa-Frontière du Nigeria (106 km)
Montant du marché initial (FCFA)	2 146 584 382 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	AUCUN
Délai d'exécution contractuel	20 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 23/01/2021
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui disponible
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie du directeur Régional de l'équipement et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
On a constaté les travaux sont terminés et réceptionnés provisoirement.

- ) On a constaté aussi : les fissures mineures à certains endroits ;
- ) Début de dégradations des perrés maçonnées ;
- ) Un début de ravinement des gabions au niveau des dalots.
- ) Manqué des panneaux.

Néanmoins, Les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art prescrit dans les cahiers des prescriptions techniques.

❖ Conclusions, recommandations :

Les travaux ont été faits dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'autorité contractante d'amener l'entreprise à corriger les imperfections constatées en avant la réception définitive.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General de la route



Fissures (nid despoules)



Degardation du perré maonné



Debut de ravinement des gabions par les eaux des pluies

### 3.18. MINISTERE SANTE DE LA SANTE

#### 3.18.1. MARCHES DE FOURNITURE : 003/2020/EQMED/BN/MSP/DGR/DMP/DSP Fourniture et installation des équipements médicaux pour le renforcement de plateaux techniques des formations sanitaires publiques.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	003/2020/EQMED/BN/MSP/DGR/DMP/DSP
Entreprise (Titulaire du marché)	ETS BENCO TRADING
Localisation	TAHOUA
Date de visite	12 /04/2021
Date d'approbation du contrat	AUCUN
Date de notification du contrat	AUCUN
Description sommaire des fournitures	Fourniture et installation des équipements médicaux pour le renforcement de plateaux techniques des formations sanitaires publiques
Montant du marché initial (FCFA)	697 004 744FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	10 jours
Date effective de livraison	On n'a pas visité les fournitures du fait que la Direction Régionale de la Santé de Tahoua nous a dit qu'elle n'a pas connaissance du marché.
Procès-verbal de livraison	Sans objet
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Sans objet
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Sans objet
Imperfections ou défauts constatés	Sans objet
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Sans objet
Autres commentaires	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission :
  - a mission s'est bien déroulée, en compagnie du directeur Régional de la santé de Tahoua.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :
 

A notre arrivée, on s'est entretenue avec le directeur régional de la santé publique de Tahoua, il nous a expliqué qu'il n'a pas connaissance de marché. Par conséquent on a pu visiter les fournitures.
- ❖ Conclusions, recommandations : Améliorer le système d'archivage des documents contractuels.



### 3.19. MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (MSP)

MARCHES DE FOURNITURE : ED/Covid-19 Acquisition de 42 respirateurs pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	ED/Covid-19
Entreprise (Titulaire du marché)	Société Technologique de Distribution (STD)
Localisation	Niamey
Date de visite	Aucune visite
Date d'approbation du contrat	18/09/2020
Date de notification du contrat	08/05/2020
Description sommaire des fournitures	Acquisition de 42 respirateurs pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19
Montant du marché initial (FCFA)	1 092 000 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	10 jours
Date effective de livraison	Non disponible
Procès-verbal de livraison	Non disponible
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Non disponible
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Non disponible
Imperfections ou défauts constatés	Non disponible
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Non disponible
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

Non applicable

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Non applicable

❖ Conclusions, recommandations :

Revoir la disponibilité des responsables de l'Hôpital Général de Référence (HGR) afin de permettre à l'équipe d'audit de procéder à l'audit physique

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :

Non disponible.

### 3.20. NIGELEC

MARCHE DE TRAVAUX : CONTRAT N°18/SACM/SG/20 Fabrication de poteaux en béton armé à l'usine de Niamey (Goudel)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N°18/SACM/SG/20 POUR LES TRAVAUX DE FABRICATION DE POTEAU EN BETON ARME A L'USINE DE NIAMEY GOUDEL
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE Cherif Moussa
Mission de contrôle :	Direction technique NIGELEC
Localisation :	NIAMEY GOUDEL
Date de visite :	VENDREDI 23 AVRIL 2021
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	FABRICATION DE POTEAUX EN BÉTON ARMÉ À L'USINE DE NIAMEY GOUDEL
Montant du marché initial (FCFA)	1 093 242 864 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	NEANT
Délai d'exécution contractuel	12 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	94%
Conformité des travaux :	OUI
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	NON
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	OUI
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	NON
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui/disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : A la date de notre visite les travaux sont en cours à un taux de 94%. Ainsi Les travaux sont en train d'être fait dans les règles de l'art.
- ❖ Conclusions, recommandations : nous avons constaté que les travaux sont en cours, nous recommandons à l'AC de prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans les délais.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vues des poteaux fabriques

MARCHE DE TRAVAUX : Avenant N°02 Au N°007/CGP/NELACEP/2016 Réhabilitation de postes sources

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	Avenant N°02 Au N°007/CGP/NELACEP/2016
/Entreprise (Titulaire du marché) :	PARASIAN HV
Mission de contrôle :	
Localisation :	NIAMEY
Date de visite :	23/04/2021
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Lot 4 Réhabilitation de postes sources.
Montant du marché initial (FCFA)	2 134 846 610 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Aucun
Délai d'exécution contractuel	12 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Non
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	90%
Conformité des travaux :	Conforme/satisfaisant
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Non
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Non
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : A la date de notre visite les travaux sont en cours à un taux de 94%. Ainsi Les travaux sont en train d'être faits dans les règles de l'art.
- ❖ Conclusions, recommandations : nous avons constaté que les travaux sont en cours, nous recommandons à l'AC de prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans les délais.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue générale des postes (usine de fabrication)

### 3.21. NIGER TELECOM

#### 3.21.1. Marché N 0000034/Niger télécom/DFC/2020 Construction d'un Mur de clôture et d'une case de gardien en matériaux définitif au centre FH Tessaoua.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 0000034/Niger Telecom/DFC/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE Hamissou Mahaman Manirou
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Tessaoua
Date de visite :	07/04/2021
Date d'approbation du contrat	16/07/2020
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	Construction d'un mur de clôture et d'une case de gardien en matériaux définitif au centre FH Tessaoua
Montant du marché initial (FCFA)	69 828 473FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	Six (03) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Aucun PV
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Un retard de 25 jours
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Provisoire 05 JUIN 2020
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paiement, bon d'achat)
Autres commentaires :	Pénalités du retard ont été appliqués à l'entreprise.de 1416 984 FCFA

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée ; en compagnie du Directeur Niger Telecom de Maradi et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons faits les constats ainsi qui suivent :

- ) Le non-respect des dispositions constructives au niveau de mur de clôture car à chaque trois (3) m un poteau devrait créer et à quinze (15) m double poteaux, mais ici non ;
- ) Des fissures sur le mur et au niveau des poteaux et sur le couronnement ;
- ) Des problèmes de raccordement.

❖ Conclusions, recommandations :

Au terme de la revue et la mission sur le terrain, nous avons constaté que les travaux sont mal faits du faite de non-respect des normes pour en matière de construction de mur de clôture. Ainsi nous recommandons que des dispositions doivent être prises pour y remédier à ces imperfections constatées.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue Générale de mur de clôture



Apparitions des fissures



Vue Générale Case Gardienne

### 3.22. OFFICE DES PRODUITS VIVRIERES DU NIGER(OPVN)

#### 3.22.1. MARCHES DE FOURNITURE : MARCHE N°009/2020//OPVN.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N 009/2020/OPVN
Enterprise (Titulaire du Marché)	Ets Elhadji Tera Sahirou
Localisation	Maradi
Date de visite	06/04/2021
Date approbation du contrat	13/07/2020
Date de notification du contrat	
Description sommaire des fournitures	Fourniture de 7 000 tonnes de mil a Maradi.
Montant du marché initial (FCFA)	210000000000FCFA FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	20 Jour
Date effective de livraison	Non disponible
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Stratégie et budget d'entretien	
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement. Factures)
Autres commentaires	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observation sur la qualité des travaux ou des Equipment : Bien fourni.

### 3.23. PASEC

#### 3.23.1. MARCHES DE FOURNITURE : 365/20/MF/DGCMP/EF fourniture de 550 tonnes dont 400 T de semences de mil HKP, 115 T de semences de sorgho Mota Maradi, 35 T de semences de niébé IT 90K; pour le département de Guidan Roumdji dans la région de Maradi

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	365/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	ENTREPRISE ISSOUFOU MALAM ADAMOU
Localisation	MARADI
Date de visite	06 /04/2021
Date d'approbation du contrat	07/07/2020
Date de notification du contrat	06/07/2020
Description sommaire des fournitures	Fourniture de 550 tonnes dont 400 T de semences de mil HKP, 115 T de semences de sorgho Mota Maradi, 35 T de semences de niébé IT 90K; pour le département de Guidan Roumdji dans la région de Maradi
Montant du marché initial (FCFA)	538 250 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	10 jours
Date effective de livraison	Oui : le process verbal n'est pas daté
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement. Factures)
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- La mission s'est bien déroulée dans l'ensemble sans difficulté;
- Tous les documents sont disponibles et mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Les fournitures sont des consommés par conséquent ne peuvent pas être vus physiquement.

On a constaté que :

- ) les fournitures ont été réceptionnées à 100% dans les différentes localités du département de GUIDAN ROUMDI et sanctionné la livraison par des procès-verbaux;
- ) le respect du délai contractuel des fournitures et la disponibilité du procès-verbal de réception. Mais les procès-verbaux n'est pas daté, ainsi on a relevé ici une non-conformité.

❖ Conclusions, recommandations : Améliorer le système d'archivage des documents contractuels. Et dater les procès-verbaux des réceptions.



### 3.24. PEAMU

MARCHE DE TRAVAUX : N°222/20/MF/DGCMP/EF Construction d'une deuxième station de traitement des boues de vidange à Niamey

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 222/20/MF/DGCMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ASI BF sa
Mission de contrôle :	
Localisation :	NIAMEY
Date de visite :	Aucun
Date d'approbation du contrat	Aucun
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	. Construction d'une deuxième station de traitement des boues de vidange à Niamey
Montant du marché initial (FCFA)	2 206 403 573 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	AUCUN
Délai d'exécution contractuel	Aucune visite effectuée
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Aucune visite effectuée
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Aucune visite effectuée
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	Aucune visite effectuée
Conformité des travaux :	Aucune visite effectuée
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune visite effectuée
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Aucune visite effectuée
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Aucune visite effectuée
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucune visite effectuée
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission de la visite des travaux n'a pas du fait de la non disponibilité de l'autorité contractante.
- ❖ Conclusions, recommandations :  
Nous recommandons à l'autorité contractante de créer les conditions des visites pour permettre à l'auditeur de constater les travaux pour compléter les travaux.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements : aucunes (non visités)

### 3.25. PGRC-DU

MARCHE DE TRAVAUX : N°59/TRAVAUX/PGRC-DU/6431/IDA, Lot n°1: Travaux de réalisation de 2745 ml du Collecteur C3S3 Lot n°2: Travaux de réalisation de 3530 ml des Collecteurs des C4S3, C9S3 et C10S3

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	MARCHE N°N°59/TRAVAUX/PGRC-DU/6431/IDA
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Groupement VALIMO Group SA/ECR
Mission de contrôle :	Groupement Betas /GRAIC
Localisation :	NIAMEY
Date de visite :	VENDREDI 23 AVRIL 2021
Date d'approbation du contrat	AUCUN
Date de notification du contrat	AUCUN
Nature des travaux	LOT N°1 : TRAVAUX DE RÉALISATION DE 2745 ML DU COLLECTEUR C3S3 LOT N°2 : TRAVAUX DE RÉALISATION DE 3530 ML DES COLLECTEURS DES C4S3, C9S3 ET C10S3
Montant du marché initial (FCFA)	1 455 073 006 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	NEANT
Délai d'exécution contractuel	LOT 1 : 07 MOIS LOT 2 : 06 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	LOT 1 : 30% LOT 2 : 35%
Conformité des travaux :	OUI
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	NON
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	On a constaté des imperfections
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours en
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui /disponible
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie de l'assistante en infrastructure.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : A la date de notre visite les travaux sont en cours; à un taux de 30% et 35%  
Nous avons constaté les imperfections suivantes :
  - )] certains coffrages sont mal faits ;
  - )] la présence des malfaçons sur certains collecteurs ;
  - )] les armatures sont tordues dans une partie des collecteurs ;
  - )] manque des remblais à certains endroits ;
  - )] les travaux sont dans un rythme très lent ;
  - )] un affleurement des nappes no prise en compte pendant les études.
- ❖ Conclusions, recommandations : nous avons constaté que les travaux sont en cours d'exécution avec un léger dépassement du délai, mais vue la quantité des travaux restants l'entreprise va forcément dépasser les délais contractuels. Ainsi nous recommandons à l'autorité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans un bref délai avant l'avènement de la saison pluvieuse dans un avenir proche.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue du collecteur (armatures tordues)



Coffrages mal fait dallâtes du collecteur



Collecteur en fonctionnement

### 3.26. UGRP TAHOUA

MARCHE DE TRAVAUX : TRAVAUX REHALISATION D'UN SEUIL D'EPANDAGE A ALLELA (commune urbaine de Keita) dans le département de Keita.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 273/2020/MF/L/DGCMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE FRERE OUMADAH
Mission de contrôle :	BETIFOR
Localisation :	TAHOUA
Date de visite :	13 / 04 / 2021
Date d'approbation du contrat	04/ 06 / 2020
Date de notification du contrat	ND DISPONIBLE
Nature des travaux	TRAVAUX REHALISATION D'UN SEUIL D'EPANDAGE A ALLELA (commune urbaine de Keita) dans le département de Keita.
Montant du marché initial (FCFA)	266.790.478 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	PAS D'AVENANT
Délai d'exécution contractuel	QUATRE (04) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Insuffisant
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	33 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	LES TRAVAUX SONT EN COURS
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué pour le décompte de 23% des travaux
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est bien déroulée en compagnie des représentants de PRODAF et du Secrétaire Général de la Mairie de Keita et aussi les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :
  - ⌋ à la date de notre visite, les travaux sont en cours d'exécution ;
  - ⌋ on a constaté une insuffisance des matériels et matériaux ainsi que les personnels d'exécution sur le chantier ;
  - ⌋ le rythme des travaux n'est pas satisfaisant vu le délai d'exécution.
  - ⌋ néanmoins, les travaux sont en train d'être faits conformément aux règles de l'art prescrites dans les cahiers des prescriptions techniques.
- ❖ Conclusions, recommandations : les travaux sont en train d'être faits dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. Ainsi, nous recommandons à l'autorité contractante de prendre toutes les dispositions pour terminer les travaux dans le délai.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue d'ensemble du Seuil



Vue intérieure du seuil d'épandage

### 3.27. Pro DAF

Marché N 835/20/MF/DGCMP/EF Travaux de réalisation de trois petits périmètres communautaires dans les communes Issawane; Attantane; et Gazaoua

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 835/20/MF/DGCMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Frère Oumadah
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Issawane ; Attantane ; Gazaoua
Date de visite :	08/04/2021
Date d'approbation du contrat	18/11/2020
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	Travaux de réalisation de trois petits périmètres communautaires dans la commune Issawane : Attantane et Gazaoua
Montant du marché initial (FCFA)	279 738 233FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	05 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	Les travaux n'ont pas démarré / le projet d'exécution est en cours
Conformité des travaux :	
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	L'entreprise est en dépassement du délai.
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux n'ont pas démarré
Indication de fraude ou de corruption possible	
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission : en compagnie du Pro DAF

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A la date de notre visite, les travaux n'ont pas démarré mais ils sont à la phase de validation des dossiers d'exécution du projet.

❖ Conclusions, recommandations :

Nous recommandons que les dossiers soient validés dans le plus bref délai pour permettre à l'entreprise de démarrer les travaux immédiatement car ils sont en retard par rapport au délai contractuel.

### 3.28. UNIVERSITE DAN DICKO DAN KOULODO DE MARADI

Marché N 012/UDDM/2020 Construction d'une salle FOAD (Salle + Bureau + Toilette)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 012/UDDM/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE Boulama Moussa
Mission de contrôle :	Direction Régional de l'urbanisme de Maradi
Localisation :	Maradi
Date de visite :	06/04/2021
Date d'approbation du contrat	28/07/2020
Date de notification du contrat	15/09/2020
Nature des travaux	Construction d'une salle FOAD
Montant du marché initial (FCFA)	64 618 202FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	Trois (03) mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100 %
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Réception Provisoire 29/09/ 2020
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Paiement effectué en totalité (Reçu de cheque, mandat de paiement, bon d'achat)
Autres commentaires :	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission : la mission s'est déroulée en compagnie du Chef Scolaire de l'UDDM et aussi les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
Nous avons constaté une légère fissure au niveau du Mur extérieur et des poteaux.
- ❖ Conclusions, recommandations :  
Nous avons constaté que les travaux ont été faits dans le respect des règles de l'art. Ainsi nous recommandons de corriger les imperfections cites ci-haut.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue de l'extérieur



Vue de l'extérieur toilette



Vue de l'intérieur de la salle FOAD



### 3.29. PRESIDENCE

#### MARCHES DE FOURNITURE : VEHICULES ET MOTOS

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	MARCHE N°797/20/MF/DGCMP/EF	MARCHE 785/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	EKA Automobile	ETS Mamoudou Kassim
Localisation	Niamey	Niamey
Date de visite	15/04/2021	15/04/2021
Date d'approbation du contrat	12/11/2020	05/11/2020
Date de notification du contrat	11 Aout 2020	29/10/2020
Description sommaire des véhicules	7 Véhicule Toyota voir bon de livraison	40 MOTO MARQUE ROYAL 5 MOTO HAOJJUN
Montant du marché initial (FCFA)	510 000 000	38 556 000
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	1 mois	15 jours
Date effective de livraison	19/11/2020	19/11/2020
Procès-verbal de livraison	PV du 19 11 2020	PV du 19/11/2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Conformité des caractéristiques	OUI	OUI
Existence physique	OUI	OUI
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Délai non dépassé	Délai respecté
Imperfections ou défauts constatés		
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a été liquidé le 20/11/2020 pour son montant total. La facture du prestataire n'a pas été communiquée à la mission	Le marché à fait objet de liquidation pour son montant total le 20/11/2020
Autres commentaires		

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- a mission s'est bien déroulée dans l'ensemble;
- tous les documents sont disponibles et bien classés;
- bon archivage.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :


Les fournitures sont des véhicules et motos ;

On a constaté que :

- ) les fournitures ont été réceptionnées à 100% à Niamey et sanctionné la livraison par des procès-verbaux.
- ) le respect du délai contractuel des livraisons et la disponibilité du procès-verbal de réception.

❖ Conclusions, recommandations : de continuer dans ce sens.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :

-  Aucune image disponible. L'ensemble du matériel roulant a été affecté au personnel de la Présidence selon le Directeur des Marchés Publics. Nous n'avons pas disposé des fiches ou bordereaux d'affectation.

### 3.30. CFS

#### MARCHES DE FOURNITURE :

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	Cotation n°21/20/UGT/PES/CAB	Cotation n°07/20/UGT/PES/CAB/PM
Entreprise (Titulaire du marché)	MM Solutions NIF 237/S	L'Africaine de l'Energie au Sahel
Localisation	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	13/04/2021	13/04/2021
Date d'approbation du contrat	08/09/2021	23/03/2020
Date de notification du contrat	Non disponible	Non disponible
Description sommaire des fournitures	200 Tablettes et 12 ordinateurs portables	Matériels informatiques
Montant du marché initial (FCFA)	49 346 265 FCFA	49 515 900
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	45 jours à partir de la notification du marché	45 jours
Date effective de livraison	14/09/2020	04/06/2020
Procès-verbal de livraison	14/09/2020	04/06/2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Nous n'avons pas disposé des pièces de paiements	Chèque n°7184705 d'un montant de 40 619 682 au nom de l'Africaine de l'Energie au Sahel
Autres commentaires		

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission :
  - la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble;
  - bon archivage.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :
  - du respect des délais de livraison ;
  - de la conformité des quantités ;
  - nous n'avons pas pu voir physiquement les matériels pour le marché n°07/20/GT/PFS/CAB/PM.
- ❖ Conclusions, recommandations : permettre à la mission de constater physiquement les matériels non constatés.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



Images du stock de tablettes TECNO DROIPAD 7F



Images du stock d'ordinateurs portables HP Intel Core i5 (4Go de RAM & 1To de mémoire interne)

### 3.31. CNOU

MARCHES DE FOURNITURE : FR-SF-2020-06-124 Fourniture des imprimés-tickets et autres carnets au Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	FR-SF-2020-06-124
Entreprise (Titulaire du marché)	ETS IMPRIMERIE DU DESERT-IDD
Localisation	Niamey
Date de visite	14 /04 /2021
Date d'approbation du contrat	02 / 09/ 2020
Date de notification du contrat	Non disponible
Description sommaire des fournitures	Fourniture des imprimés-tickets et autres carnets au Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU)
Montant du marché initial (FCFA)	17 983 875FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	15 jours
Date effective de livraison	14/09/2020
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve le 21/09/2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement des factures)
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble ;
- tous les documents sont disponibles et bien classés ;
- bon archivage.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Le stock de tickets et carnets a été consommé par conséquent ne peuvent pas être vu physiquement.

On a constaté que :

- ⌋ les fournitures ont été réceptionnées à 100% à Niamey et sanctionné la livraison par des procès-verbaux;
- ⌋ le respect du délai contractuel des travaux et la disponibilité du procès-verbal de réception.

❖ Conclusions, recommandations : aucune.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :

Il n'existe aucune image du stock de tickets et carnets car ce dernier a été consommé avant l'année 2021. Cependant, nous avons pu obtenir les copies des bons de sortie du magasin.



Université Abdou Moumouni  
 Centre National des Œuvres Universitaires  
 BP -Tel, 20 79 35 00  
 NIAMEY - NIGER

*Ticket Restaurant  
 &  
 Transport*

Bon de Sortie  
 Magasin 013

*Fiche d'exposés des biens - Exp. Financière - 17/09/20*

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
1500	Carnets de 50 tickets Petit-déjeuner	Vente
60	Carnets de 50 cartes mensuelles bus (60) soit 120 de 25 cartes	

Nom et Signature  
 Responsable Magasin

Nom et Signature  
 Responsable Service Demander  
 Attacher Ahmet

Date: 17/09/20

Université Abdou Moumouni  
 Centre National des Œuvres Universitaires  
 BP -Tel, 20 79 35 00  
 NIAMEY - NIGER

*Ticket Restaurant*

Bon de Sortie  
 Magasin 014

*Exposés des biens - 22/09/20*

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
Deux mille (2000)	Ticket (Déjeuner - dîner)	Vente

Nom et Signature  
 Responsable Magasin

Nom et Signature  
 Responsable Service Demander  
 Attacher Ahmet

Date: 22-09-20

Université Abdou Moumouni

Centre National des Œuvres Universitaires

BP -Tél, 20 79 35 00  
NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 045

Ticket 100  
Ticket 100

Fiche d'expression de besoin St-Financier 17/10/20

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
2000	carnets Ticket déjeuner-Duor	St-Financier
2000	carnets Ticket petit déjeuner	

Nom et Signature  
Responsable Magasin

Nom et Signature  
Responsable Service Demander

Date: 14/10/20

Université Abdou Moumouni

Centre National des Œuvres Universitaires

BP -Tél, 20 79 35 00  
NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 046

Ticket 100

Fiche d'expression de besoin St-Financier 14/10

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
2000	carnets Tickets bus	

Nom et Signature  
Responsable Magasin

Nom et Signature  
Responsable Service Demander

Date: 23/10/20


Université Abdou Moumouni  
 Centre National des Œuvres Universitaires  
 BP - TEL, 20 79 35 00  
 NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 17

*Ticket bus et carnet Mensuel*  
*Fidèle d'expression de bureau de l'administration 93/12/20*

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
130	Carnets de 25 cartes Mensuelles	Vente
	Bus	
2000	Carnets TDD	

Nom et Signature  
 Responsable Magasin  


Nom et Signature  
 Responsable Service Demander  
 Abdou Ousmane  


Date: 08/11/20


Université Abdou Moumouni  
 Centre National des Œuvres Universitaires  
 BP - TEL, 20 79 35 00  
 NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 18

*Tickets cartes mensuelles bus*  
*Fidèle d'expression de bureau de l'administration 03/12/20*

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
120	Carnets de 25 cartes Mensuelles	800
	bus	Financier

Nom et Signature  
 Responsable Magasin  


Nom et Signature  
 Responsable Service Demander  
 A Hakei Ahmet  


Date: 03/12/20



Université Abdou Moumouni

Centre National des Œuvres Universitaires

BP -Tél, 20 79 35 00  
NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 19

Tickets Dejeuner Diner  
Fiche d'expression de besoin Stc Financier 26/11/20

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
2000	carnets et 50 Tickets Dejeuner Diner	Stc Financier

Nom et Signature  
Responsable Magasin



Nom et Signature  
Responsable Service Demander

Attaher Ahmet  
10/12/20

Date: 03/12/20

Université Abdou Moumouni

Centre National des Œuvres Universitaires

BP -Tél, 20 79 35 00  
NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 21

Tickets petit Dejeuner  
Fiche d'expression de besoin Stc Financier 02/12/20

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
50	carnets Tickets petit + Dejeuner	Stc Financier

Nom et Signature  
Responsable Magasin



Nom et Signature  
Responsable Service Demander

Attaher Ahmet  
10/12/20

Date: 10/12/20

Université Abdou Moumouni

Centre National des Œuvres Universitaires

BP -Tél, 20 79 35 00  
NIAMEY - NIGER

Bon de Sortie

Magasin 23

*Ticket Dejeuner Dma  
et Ticket petit Dejeuner*  
Fiche d'acquisition de matériel CR Financier 08/12/20

QUANTITÉ	DÉSIGNATION MATÉRIEL	DESTINATION
2000	carnets Tickets Dejeuner Dma	80
1500	carnet Tickets petit Dejeuner	Financier

Nom et Signature  
Responsable Magasin

*[Signature]*

Nom et Signature  
Responsable Service Demander

*Attaher Akme*

Date

*10/12/20*

### 3.32. DGPN

#### MARCHES DE FOURNITURE : 0016

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	MARCHE 652/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	ETS CHARFO ABOUBAKAR
Localisation	NIAMEY
Date de visite	16 04 2021
Date d'approbation du contrat	25/09/2020
Date de notification du contrat	11/06/2020
Description sommaire des fournitures	Véhicule de fonction
Montant du marché initial (FCFA)	335 000 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	02/10/2020
Délai d'exécution contractuel	Aucun délai précisé dans l'ordre de service
Date effective de livraison	02/10/2020
Procès-verbal de livraison	02/10/2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Non disponible
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Liquidation de la somme de 250 442 663 F CFA.
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- )] la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble;
- )] tous les documents sont disponibles et bien classés ;
- )] la mission n'a pas pu évaluer le respect du délai de livraison.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

- )] manque de précision du délai dans l'ordre de service ;
- )] conformité de la quantité livrée ;
- )] existence matérielle des véhicules ;
- )] disponibilité de certain document contractuel.

❖ Conclusions, recommandations :

- )] préciser clairement le délai de livraison ;
- )] établir des notes d'affectation pour les Mercedes Benz affectées aux DGPN et DGPN/A.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



Images de la Mercedes Benz affectée au DG de la Police Nationale



Images de la Mercedes Benz affectée au DG/A de la Police Nationale





Images des deux (02) Mercedes Benz affectées à l'escorte présidentielle

### 3.33. DNP GCA

#### MARCHES DE FOURNITURE : CONTRAT 0094/FCD/2020/SNS

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	CONTRAT 0094/FCD/2020/SNS
Entreprise (Titulaire du marché)	ENTREPRISE ADAMOU OUMAROU
Localisation	NIAMEY
Date de visite	16 04 /2021
Date d'approbation du contrat	28 juin 2020
Date de notification du contrat	Non disponible
Description sommaire des fournitures	Fourniture de 3 000 tonnes de céréales Mil : 1 500 tonnes à Niamey Maïs : 1 500 tonnes à Niamey
Montant du marché initial (FCFA)	832 500 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	15 Jours à compter de la signature
Date effective de livraison	08 juillet 2020
Procès-verbal de livraison	PV de réception du 08 juillet 2020 - Certificat de contrôle de conformité du 07 juillet 2020 - Certificat de conformité de qualité de poids N°001/DG/DC/2020 du 10 août 2020 - Certificat de conformité de qualité de poids N°002/DG/DC/2020 du 10 août 2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	- Ordres de virement n°113 et 114/2020 du 17 août 2020 - Décision 0258/DIRCAB/PM/SP/DNP GCA du 17 août 2020 pour l'autorisation de mandatement de la somme de 815 850 000 F CFA au profit de l'Entreprise Adamou Oumarou - Bulletin d'agrèage de paiement du 28/06/2020 pour 367 500 000 F CFA - Bulletin d'agrèage de paiement du 28/06/2020 pour 465 000 000 F CFA - Autorisation 0616/MF/DGCMP/EF/DAD du 28 avril 2020 pour entente directe avec mise en concurrence.
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble;
- tous les documents sont disponibles et bien classés;
- bon archivage.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Les fournitures sont des consommés par conséquent ne peuvent pas être vus physiquement.

On a constaté que les fournitures ont été réceptionnées à 100% et sanctionné la livraison par des procès-verbaux.

❖ Conclusions, recommandations : améliorer le système d'archivage des documents contractuels.

### 3.34. FC-PDS

MARCHES DE FOURNITURE : 287/20/MF/DGCMP/EF acquisition, installation et mise en service de matériel de vision conférence au profit des commissions de gestion de covid-19 du niveau Central et Régional

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	287/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	PSI (Prestation des Services Informatiques)
Localisation	Niamey
Date de visite	14 /04 /2021
Date d'approbation du contrat	11 / 06/ 2020
Date de notification du contrat	17/06/2020
Description sommaire des fournitures	Matériel de vision conférence
Montant du marché initial (FCFA)	141 826 580 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	3 semaines à compter de la date d'enregistrement
Date effective de livraison	10/08/2020
Procès-verbal de livraison	Aucun PV de réception
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Les règlements que nous avons constatés sur ce marché ne couvrent pas l'intégralité du montant de la facture. En effet nous avons vu un ordre de virement de 81 441 828 franc CFA et constaté une facture 35 754 600 en suspens.
Autres commentaires	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble ;
- tous les documents sont disponibles et bien classés ;
- bon archivage physique et électronique.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté l'existence physique ainsi que la qualité du matériel installé au niveau du MSP de Niamey.

❖ Conclusions, recommandations :

Aucune.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



Images du dispositif installé dans une salle de reunion du MSP



### 3.35. MAGEL

#### MARCHES DE FOURNITURE : Avion agricole, Fourniture en se

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	MARCHE 614/20/MF/DGCMP/EF	MARCHE 893/20/MF/DGCMP/EF	MARCHE 834/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	ETABLISSEMENT IBS	ETS EBA	ENTREPRISE ADAMOU OUMAROU
Localisation	NIAMEY	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	16 04 2021	16 04 2021	16 04 2021
Date d'approbation du contrat	20 08 2021	23 11 2020	19 11 2020
Date de notification du contrat	Non disponible	Non disponible	20 11 2020
Description sommaire des fournitures	Fourniture avion agricole	Véhicule Toyota	SORGO ET SEMENCE AGRICOLE
Montant du marché initial (FCFA)	1 761 200 000 FCFA	431 022 714 FCFA	1 436 320 441 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	3 mois	30 JOURS	10 JOURS
Date effective de livraison	Non disponible	30 11 2020	20 11 2020
Procès-verbal de livraison	Non disponible	PV du 30 11 2020	20 11 2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)		Délai respecté	Délai respecté
Imperfections ou défauts constatés	Aucune		
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Aucun paiement	Facture N°019/EBA/2020 du 30/11/2020. Le marché a fait objet de liquidation pour son montant total le 01/12/2020.	Facture N°023/2020/EAO du 25/11/2020. Non communication des pièces de paiement.
Autres commentaires			

#### ❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

▪ Pour le marché 834/20/MF/DGCMP/EF

Le stock de Sorgho ainsi que celui de Niébé de semences paysannes ont été consommés et par conséquent ne peuvent pas être vus physiquement.

▪ Pour le marché 614/20/MF/DGCMP/EF

L'avion agricole a été réceptionné mais sans dédouanement. Il est présentement stationné depuis près de 14 mois au hangar de la Direction Générale de la Protection des Végétaux (DGPV) à l'Aéroport International Diori Hamani de Niamey.

L'avion agricole ne peut être utilisé à cause de l'absence de dédouanement et donc absence d'immatriculation aérienne. Aucun paiement n'a été effectué au titulaire du marché.

▪ Pour le marché 893/20/MF/DGCMP/EF

Les neuf (9) véhicules TOYOTA 4X4 ont été réceptionnés par la DGPV. Le marché a fait objet de liquidation pour son montant total en date du 01/12/2020. Nous n'avons pas pu constater l'existence physique d'un des véhicules TOYOTA 4X4 affecté au Directeur Général. Il n'existe aucune note d'affectation,

❖ Conclusions, recommandations :

▪ Pour le marché 614/20/MF/DGCMP/EF : Procéder au règlement du litige existant entre le titulaire du marché et le MAG/EL en vue de dédouaner et immatriculer l'avion agricole.

▪ Pour le marché 893/20/MF/DGCMP/EF : Établir des fiches ou notes d'affectation pour les véhicules affectés au personnel de la direction.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :

) TOYOTA 4X4 stationnées dans l'enceinte de la DGPV de Niamey, Zone Industrielle :



) Avion agricole stationné dans le hangar de la DGPV à l'aéroport international de Niamey





### 3.36. MDN

MARCHES DE FOURNITURE : 774/20/MF/DGCMP/EF/ Acquisition de soixante-cinq (65) véhicules Toyota (58 Toyota HZJ 79L, Land cruiser Pick up essence, 05 Cruiser 4.2 LMT 2019 Hard top 76 Diesel) au profit des forces armées nigériennes.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	774/20/MF/DGCMP/EF	980/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	Etablissements Elh Rambazo Moussa, BP 31	E/SE Naila, BP 12871
Localisation	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	14/04/2021	14/04/2021
Date d'approbation du contrat	Vendredi 6 novembre 2020	Jeudi 7 janvier 2021
Date de notification du contrat	Provisoire : 28/05/2020	Provisoire : 28/05/2020
Description sommaire des fournitures	58 Toyota HZJ 79L, Land cruiser pick up essence, 05 Cruiser 4.2 LMT 2019 Hard top 76 Diesel	4 Ambulance médicalisées, Toyota land cruiser 78 Hardtop 4X4 4,2L diesel- proj.
Montant du marché initial (FCFA)	1 758 500 000	1 443 000 000
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	30 jours à compter de l'approbation du contrat	Immédiate à compter de l'approbation du contrat
Date effective de livraison	30/11/2020	30/11/2020
Procès-verbal de livraison	PV du 30/11/2020, conforme aux quantités contractuelles	PV du 15/01/2020, conforme aux quantités contractuelles
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Délai de livraison est respecté	Délai de livraison non respecté
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché à fait objet de liquidation pour un montant de 1 758 500 000 FCFA le 30/11/2020	Le marché a fait objet de paiement pour un montant de 432.000.000FCFA le 30/11/2020
Autres commentaires		

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble
- tous les documents sont disponibles et bien classés;
- bon archivage.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

On a constaté que :

- ) les véhicules ont été réceptionnés à 100% à Niamey et sanctionné la livraison par des procès-verbaux.
- ) le non-respect du délai contractuel de la livraison des véhicules.

❖ Conclusions, recommandations : Donner un délai contractuel raisonnable.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :

) Pour le marché 774 relatif à l'acquisition de soixante (65) véhicules Pick up, aucune photo n'est disponible; l'ensemble du matériel roulant a été soit affecté ou déployé à l'intérieur du pays :


- Dix (10) TOYOTA HZL neufs affectées à la Gendarmerie Nationale du Niger ;
- Dix (10) TOYOTA HZL neufs affectées à la Garde Nationale du Niger ;
- Cinq (5) TOYOTA HZL neufs affectées à la Police Nationale du Niger ;
- Le reliquat de quarante (40) TOYOTA a été soit déployé sur le terrain, à l'intérieur du pays.

Voir copies des décharges et bon de livraison.

) Quant au marché 980 relatif à l'acquisition de vingt-cinq (25) ambulances, nous avons constaté :

- l'existence de onze (11) ambulances neuves au garage de la DCMAT ;
- et quatorze (14) ambulances affectées. Nous n'avons pas disposé des fiches d'affectation.

Quelques images des onze (11) ambulances neuves au garage de la DCMAT à Niamey

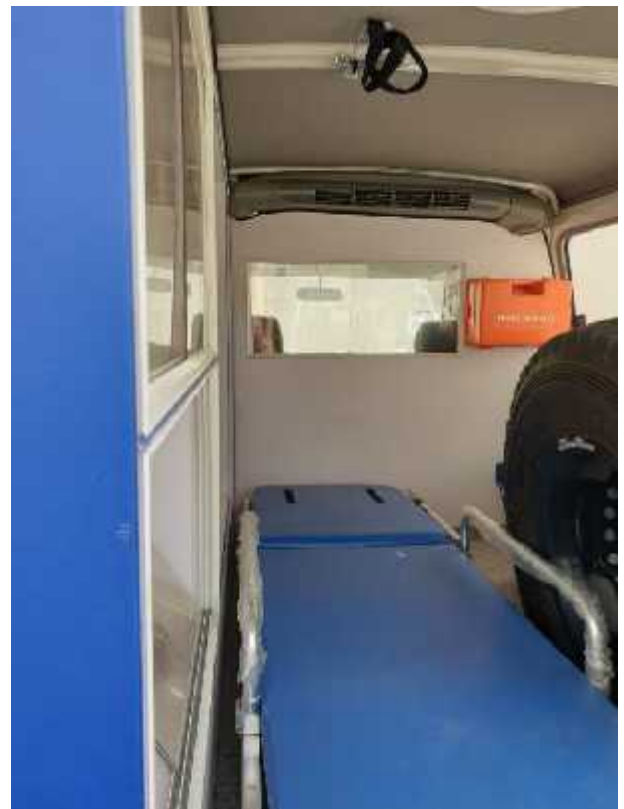

### 3.37. MES

MARCHES DE FOURNITURE : N° 535/20/MF/DGCMP/EF/ Fournitures de 3 000 tonnes de céréales Niamey et Zinder.

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	N° 535/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL, Paris France
Localisation	NIAMEY
Date de visite	13/04/2021
Date d'approbation du contrat	Jeudi 20 août 2020
Date de notification du contrat	20 août 2020
Description sommaire des fournitures	99 000 livres CIAM MATHS 6eme Editions EDICEF, 99 000 livres Français 6eme livre de l'élève, 30 000 livres CIAM MATHS 5eme Editions EDICEF, 30 000 livres Français 5eme livre de l'élève
Montant du marché initial (FCFA)	1 061 192 804 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	5 mois
Date effective de livraison	10 Novembre 2020 livraison
Procès-verbal de livraison	PV du 17 NOV 2020, conforme aux quantités contractuelles
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Oui la quantité livrée est conforme à la quantité contractuelle
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Délai respecté
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a été intégralement payé par mandatement
Autres commentaires	

#### ❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- La mission s'est bien déroulée dans l'ensemble ;
- Tous les documents sont disponibles et bien classés ;
- Bon archivage.

#### ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté que :

- ) les fournitures scolaires ont été réceptionnées dans le délai contractuel;
- ) matérielle des fournitures sanctionnées par un PV de réception daté et signé.

#### ❖ Conclusions, recommandations :

Le Ministère des Enseignements Supérieurs dispose d'une qualité dans l'exécution de ses marchés.

#### ❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



Images de magasins du Lycée KOROMBE de Niamey contenant de stock des livres



### 3.38. Ministère des Finances

#### MARCHES DE FOURNITURE :

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	334/20/MF/DGCMP/EF	321/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	Groupement TCSINCODEV/SODEXCA	CFAO MOTORS Niger
Localisation	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	15/04/2021	15/04/2021
Date d'approbation du contrat	30/06/2020	23/06/2020
Date de notification du contrat	21/04/2020	13/02/2020
Description sommaire des fournitures	Fourniture, installation et mise en place d'un système de gestion des machines à facturation de la TVA	Acquisition de vingt (20) véhicules Toyota Land Cruiser 4x4 mono cabine au profit de la DGD
Montant du marché initial (FCFA)	1 547 000 000 FCFA	497 500 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	12 mois	04 mois
Date effective de livraison	19/08/2020	Non disponible
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve le 19/08/2019	Non disponible
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Non disponible
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun	Non disponible
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Non disponible
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a fait objet de liquidation le 19/10/2020 pour un montant TTC de 773 500 000 FCFA. A la suite de la transmission de la facture en date du 20/08/2020	Non communication des pièces de paiement.
Autres commentaires		

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- La mission s'est bien déroulée dans l'ensemble;
- tous les documents ne sont pas disponibles.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

- Pour le marché 334/20/MF/DGCMP/EF :

Le système de gestion des machines à facturation de la TVA a été entièrement réceptionné. Nous avons constaté un stock de 146 machines TVA. Nous avons constaté que :

- ) le reliquat a été transféré aux différents contribuables.
- ) le respect du délai contractuel ainsi que la disponibilité des PV de réception.

- Pour le marché 321/20/MF/DGCMP/EF :

Tous les Vingt (20) véhicules ont été réceptionnés et repartis de la manière suivante :

- 1 véhicule à la Direction Générale de la Douane ;
- 3 véhicules à la brigade nationale, Bienvenue de Niamey ;
- 2 véhicules à la brigade de Niamey, HaroBanda (Rive Droite) ;
- 2 véhicules à la brigade de l'enquete douaniere de Niamey (lutte contre la fraude) ;
- 2 véhicules à la brigade de Maradi ;
- 2 véhicules à la brigade de Tahoua ;
- 1 véhicule à la brigade fluviale de Gaya ;
- 1 véhicule à la brigade de Diffa ;
- 2 véhicules à la brigade de Dosso ;
- 2 véhicules à la brigade de Zinder ;
- 1 véhicule à la brigade d'Agadez ;
- 1 véhicule à la brigade de Madaoua.

- ❖ Conclusions, recommandations :

Améliorer le système d'archivage des documents contractuels.

- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



TOYOTA 4X4 affectée à la Direction Générale de la Douane, Niamey – Zone Industrielle



TOYOTA 4X4 affectées à la Direction Nationale de la Lutte contre la Fraude – Niamey, Rive-Droite



TOYOTA 4X4 affectée au Bureau des Douanes – Niamey, Rive-Droite



Images du stock de 146 machines à facturation TVA dans le magasin de la DGI, Rue du Copro, Niamey



### 3.39. MISP

#### MARCHES DE MATERIEL ROULANT :

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	MARCHE N°559/20/MF/DGCNP/EF	MARCHE N°962/20/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	AGACHA TECHNOLOGIE	ETS SAFA SA
Localisation	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	15 09 /2020	15 09 /2020
Date d'approbation du contrat	12/08/2020	30/11/2020
Date de notification du contrat	Non disponible	Non disponible
Description sommaire des véhicules	50 véhicules Toyota Pick up	30 véhicules Toyota Pick up
Montant du marché initial (FCFA)	1 350 000 000 FCFA	810 000 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	45 jours à compter de l'approbation	60 jours à compter de l'approbation
Date effective de livraison	31 Aout 2020	29/12/2020
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve le 31 Aout 2020	Rédigé et prononcé sans réserve le 29/12/2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a fait objet de liquidation pour son montant total 1 350 000 000 FCFA TTC le 02/09/2020. A la suite de la présentation de la facture le 01/09/2020	Le marché a fait objet de liquidation pour son montant total 810 000 000 FCFA TTC le 31/12/2020. A la suite de la présentation de la facture le 29/12/2020.
Autres commentaires		

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble;
- tous les documents sont disponibles et bien classés.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Les fournitures sont des véhicules (voir photo).

On a constaté que :

- )] les fournitures ont été réceptionnées à 100% à Niamey et sanctionné la livraison par des procès-verbaux.
- )] le respect du délai contractuel des livraisons et la disponibilité du procès-verbal de réception.

❖ Conclusions, recommandations : Continuer à faire respecter le délai de livraison.

- ❖ Quelques images des véhicules : Aucune. Tous les véhicules ont été déployés à l'intérieur du pays et aux postes frontalières.

50

**TOYOTA PICK DIESEL**

N°	N° CHASSIS	N° MOTEUR	OBSERVATIONS
1.	JTELB71J50B013446	0948872	
2.	JTELB71J40B013180	0948126	
3.	JTELB71J00B012768	0946975	
4.	JTELB71J90B012767	0946972	
5.	JTELB71J70B013450	0948873	
6.	JTELB71J70B013447	0948861	
7.	JTELB71J20B012769	0946973	
8.	JTELB71J90B013093	0947855	
9.	JTELB71J70B013049	0948596	
10.	JTELB71J40B013017	0947616	
11.	JTELB71J60B013391	0948730	
12.	JTELB71J90B013188	0948132	
13.	JTELB71J60B013312	0948486	
14.	JTELB71J50B013253	0948309	
15.	JTELB71J80B012761	0946967	
16.	JTELB71J50B013026	0947659	
17.	JTELB71J40B013177	0948104	
18.	JTELB71J90B012963	0947477	
19.	JTELB71J50B012765	0946970	
20.	JTELB71J60B013438	0948822	
21.	JTELB71J00B013080	0947822	
22.	JTELB71J30B012764	0946968	
23.	JTELB71J30B013039	0947696	
24.	JTELB71J10B013251	0948319	
25.	JTELB71JX0B001616	0917194	
26.	JTELB71JX0B001695	0917379	
27.	JTELB71J80B001744	0917497	
28.	JTELB71J60B001595	0917157	
29.	JTELB71J90B001638	0917254	
30.	JTELB71J80B001680	0917337	

**Le Chef Division Auto**



Pour la Fourniture de cinquante (50) véhicules Toyota Pick Up au profit des FDS nationales : trente (30) véhicules déployés à l'intérieur du pays et vingt (20) affectés à la police nationale sans fiche d'affectation.

## 20 TOYOTA PICK DIESEL

N°	N° CHASSIS	N° MOTEUR	OBSERVATIONS
1.	JTELB71J70B015652	1HZ 0954846	
2.	JTELB71J80B015207	1HZ 0953810	
3.	JTELB71J80B015370	1HZ 0954191	
4.	JTELB71J80B015529	1HZ 0954577	
5.	JTELB71J80B015594	1HZ 0954731	
6.	JTELB71J80B016325	1HZ 0956377	
7.	JTELB71J80B016597	1HZ 0956874	
8.	JTELB71J90B015538	1HZ 0954603	
9.	JTELB71J90B015779	1HZ 0955146	
10.	JTELB71J90B016527	1HZ 0956741	
11.	JTELB71JX0B015256	1HZ 0953915	
12.	JTELB71J00B013192	1HZ 0948166	
13.	JTELB71J00B015878	1HZ 0943765	
14.	JTELB71J50B015374	1HZ 0954192	
15.	JTELB71J50B015481	1HZ 0954472	
16.	JTELB71J60B016999	1HZ 0957564	
17.	JTELB71J60B016825	1HZ 0957266	
18.	JTELB71J60B016887	1HZ 0957380	
19.	JTELB71J60B017229	1HZ 0957947	
20.	JTELB71J70B015425	1HZ 0954341	

Le Chef Division Auto



Pour la Fourniture de trente (30) véhicules Toyota Pick up au profit des Forces de Défense et de Sécurité Nationale : Vingt (20) TOYOTA PICK UP Diesel et dix (10) TOYOTA PICK UP V6 tous déployés à l'intérieur du pays et aux postes frontalières.

## TOYOTA PICK UP V6

N°	N° CHASSIS	OBSERVATIONS
1.	JTELU71JX0B027417	
2.	JTELU71JX0B027434	
3.	JTELU71J10B027421	
4.	JTELU71J20B027461	
5.	JTELU71J30B027534	
6.	JTELU71J60B027415	
7.	JTELU71J80B027464	
8.	JTELU71J90B027411	
9.	JTELU71J90B027439	
10.	JTELU71J90B027473	

Le Chef Division Auto



Pour la Fourniture de trente (30) véhicules Toyota Pick up au profit des Forces de Défense et de Sécurité Nationale : Vingt (20) TOYOTA PICK UP Diesel et dix (10) TOYOTA PICK UP V6 tous déployés à l'intérieur du pays et aux postes frontalières.



### 3.40. NIGER TELECOMS

MARCHES DE FOURNITURE : N°0000095/NIGER TELECOMS/DFC/2020 Fourniture de 50 SRAN 2G/3G/4G (équipements BTS)

ASPECTS	OBSERVATIONS ET CONSTATS
Contrat	0000095/NIGER TELECOMS/DFC/2020
Entreprise (Titulaire du marché)	SIGNATEL
Localisation	NIAMEY
Date de visite	19/04/2021
Date d'approbation du contrat	15 DECEMBRE 2020
Date de notification du contrat	16/12/2020
Description sommaire des fournitures	50 SRAN 2G/3G/4G (équipements BTS)
Montant du marché initial (FCFA)	1 908 014 924 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	30jours
Date effective de livraison	Livraison n'a pas encore été effectuée
Procès-verbal de livraison	Livraison n'a pas encore été effectuée
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Imperfections ou défauts constatés	Non applicable
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Aucun paiement / livraison n'a pas encore été effectuée
Autres commentaires	

- ❖ Généralités sur le déroulement de la mission :  
La mission s'est bien déroulée dans l'ensemble.
- ❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :  
Aucune livraison n'est encore constatée.  
Nous n'avons pas disposé de l'ordre de service pour juger le respect du délai contractuel.
- ❖ Conclusions, recommandations :  
Améliorer le système d'archivage des documents contractuels.
- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements :  
Non applicable

## ANNEXES

### ANNEXE 1 : PLAN D'ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Non-respect du délai des travaux dus à laxisme de l'administration	Donner des délais raisonnables au prestataire au-delà desquels la pénalité de retard pourra être appliquée	Autorités Contractantes	Dès 2021	
Non-respect des qualités des travaux	Faire un suivi de qualités des travaux en amenant les entreprises à respecter les normes de construction en vigueur	Autorités Contractantes	Dès 2021	
Carence de l'archivage des documents des marchés et notamment de pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de travaux, fournitures et prestations intellectuelles.	Centralisation, gestion et archivage de la documentation : mettre en place un système de classement et d'archivage centralisé pour les documents relatifs aux marchés et contrats.	ARMP Autorités Contractantes	2 <sup>ème</sup> trimestre exercice budgétaire 2021	Non budgétisation de l'activité et disponibilité du manuel de classement à élaborer par l'ARMP.
Mauvaise qualité de certains travaux exécutés.	Veiller à la qualité des travaux exécutés en mettant en place un système de contrôle et de suivi rigoureux.	Autorités Contractantes	Immédiat	Aucun
Longs délais de réalisation et non application des pénalités de retard dans la majorité des cas.	Faire appliquer les pénalités de retard conformément aux marchés si la responsabilité du titulaire est engagée.	Autorités Contractantes	Immédiat	Aucun
Absence de bureau d'études pour le suivi et le contrôle des marchés de travaux.	Faire superviser et contrôler l'exécution des travaux par un consultant ou un bureau de contrôle  Exiger la production des rapports de suivi	Autorités Contractantes	Immédiat	Aucun
Manque d'entretien des ouvrages réalisés ou des équipements acquis.	Assurer l'entretien des équipements Prévoir dans le budget de fonctionnement des ressources suffisantes pour l'entretien des ouvrages réalisés ou des équipements acquis.	Autorités Contractantes	Exercice budgétaire 2021	Non budgétisation de l'activité

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Travaux situés dans les zones d'insécurité	Prendre des dispositions sécuritaires appropriées dans le cas des travaux en zones à risque sinon éviter d'y lancer des travaux	Autorités Contractantes	Immédiat	Aucun
Equipements acquis mais non utilisés et à l'abandon	S'assurer de l'utilité des équipements avant d'envisager leur acquisition	Autorités Contractantes	Immédiat	Aucun
Retard d'exécution dû aux difficultés d'obtention de l'arrêté d'exonération	Associer les services des impôts au démarrage des projets pour anticiper sur les questions d'exonération.	Autorités Contractantes	Immédiat	Aucun
Suspension de travaux due à la non prise en compte en amont des questions d'impact environnemental et social	Réaliser une étude d'impact environnemental et social des travaux dans la phase d'avant-projet et mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale correspondant durant leur exécution ;	Autorités Contractantes	Exercices 2021 2022	Aucun

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
M. ELH ABOUBACAR Laouli	CDRFM/H	Chef Division	
M. ALI MAMAN SANI	DHU/SU	Agent	
Monsieur Djibo Zaneidou	PRODAF/MI	Responsable Composante A	
Madame Bachar Fatima	PRODAF/MI	Responsable Passation de Marché	
Monsieur Abdoul-Nasser	AMODER	Chef de Division	
Monsieur Dabal	ARMP/DOSSO	Secrétaire Régional	
Monsieur Galio Goumou	CAB/PRN	Directeur Des Marchés Publics	94 85 24 15 96 98 46 49 ggoumour@gmail.com
MONSIEUR YAYA FOUDOUGOU	CCIN	Agent	+227 92 32 35 55 y.backine@yahoo.fr
Monsieur OUMAROU Amadou	CFS	RPM	+227 96 49 43 71
Monsieur SAIDOU Abdoulaye	CNOU	Secrétaire Administratif	+227 96 59 68 55
Monsieur ATTAHER Ahmet	CNOU	Chef Service Financier	+227 89 44 45 28
SOUMANA BOUKARI	DIRECTION REGIONAL DE L'URBANISME DE DIFFA	Directeur Régional	-
BOUBACAR HASSAN	ARMP/DIFFA	Secrétaire Régional	-
BOUKAR DAOUDA	DIRECTION REGIONAL DE CAISSE DE DIFFA	Directeur Régional	-
MONSIEUR SOULEYMANE	CONSEIL REGIONAL DE DOSSO	Assistance Maitre D'ouvrage	
MONSIEUR DABAL	ARMP/DOSSO	Secrétaire Régional	
Madame JEAN Rakiatou	DNPGCA	Assistante En Finance	+227 90 63 32 38
Monsieur ANZA	OPVN	Gestionnaire de Stock	+227 88 65 11 11
Monsieur Dabal	ARMP/DOSSO	Secrétaire Régional	
Boubacar Marc	CR/MI	Assistant Technique En Maitre D'ouvrage	+227 91 22 66 87
Monsieur Issoufou	ARMP/Maradi	Secrétaire Régional	+227 96 88 06 65
MONSIEUR MAMAN MANOU	MAIRIE OUALLEWA	Maire Ollewa	
MONSIEUR AGI	ARMP/ZINDER	Secrétaire Régional	
	CONSEIL REGIONAL	Secrétaire Général	+227 96 59 93 74
	ARMP/TAHOUA	Secrétaire Régional	+227 80 08 53 56
MONSIEUR MALIKI ALIO	CONSEIL REGIONAL	Directeur Départemental	
MONSIEUR AGI	ARMP/ZINDER	Secrétaire Régional	
Mme BOUBEY OUMAROU Ramatou	DGPN	DRFM	+227 98 68 66 67 +227 91 10 66 67
Monsieur YAHOUZA	DREPT/ZR	Directeur Régional	+227 96 55 88 72

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
Monsieur AGI	ARMP/ZINDER	Secrétaire Régional	+227 89 01 43 89
MONSIEUR SALÉ AGADA	DRESS/MI	SAF/DRES	-
MONSIEUR ISSOUFOU	ARMP/MARADI	Secrétaire Régional	-
Monsieur SAMNA	FAFPA	SPM	+227 96 09 57 06 +227 92 75 12 71 msamna86@yahoo.fr
Monsieur LAMINOUE	FAFPA	Chef d'antenne	-
Monsieur AGI	ARMP/ZINDER	Secrétaire Régional	-
Monsieur DANKARAMI Ali	FC-PDS	Responsable Service Informatique	zaro4@yahoo.fr
MR ILLIASOU GADO	MAIRIE	SG	-
ELH BOUBACAR	DRHA/TA	DIRECTEUR REGIONAL	-
ALI MAMAN SANI	ARMP/TAHOUA	SECRETAIRE REGIONAL	-
Monsieur OUMARIA Nassirou	MAG/EL	DMP	+227 94 85 24 15 +227 96 98 46 49
Monsieur DJIBO Halidou	DGPV	Auditeur Interne	+227 96 50 50 08 +227 93 81 00 18
Monsieur LAWALI Idi	DGPV	-	+227 96 97 10 14
Monsieur LAWALI Ousmane	DGPV	Responsable Du Hangar De La DGPV	+227 97 30 79 29
Monsieur MODIBO	MDN	-	+227 98 10 91 20
Colonel MAI DAJI	DCMAT, FAN	-	+227 96 80 50 90 +227 90 64 28 59
	DIRECTION REGIONAL DE L'URBANISME DE TAHOUA	Directeur Régional	-
SOUMANA BOUKARI	DIRECTION REGIONAL DE L'URBANISME DE DIFFA	DIRECTEUR REGIONAL	-
ALI MAMAN SANI	ARMP/TAHOUA	Secrétaire Régional	-
BOUBACAR HASSAN	ARMP/DIFFA	Secrétaire Régional	-
	DIRECTION REGIONAL DE L'EQUIPEMENT D'AGADEZ	Directeur Régional Adjoint	-
	DIRECTION REGIONAL DE L'EQUIPEMENT DE MARADI	Directeur Régional	-
MONSIEUR ISSOUFOU	ARMP/MARADI	Secrétaire Régional	-
DAN DANO	ARMP/AGADEZ	Secrétaire Régional	-
Monsieur ELH. YACOUBA	MES	Chef De Division Suivi De l'Exécution Des Marchés Publics	+227 96 07 85 07
Monsieur AYA Hamza	Ministère des Finances	Directeur des Marchés Publics	+227 90 41 40 48

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
Monsieur ABDOURAHMANE CHAIBOU Batouré	Ministère des Finances	Inspecteur Central du Trésor	+227 98 12 20 20 +227 92 58 58 00
Monsieur SALEY Adamou	DGI	Chef Division Matériel	+227 96 87 29 29
Monsieur ZAKARI Ali	SYGMEF	Coordonnateur	+227 90 19 18 42
Colonel BOHARI Abdoulaye	DGD	Chef Divisionnaire	+227 98 53 66 66
Commandant Hamidou	DGD	Chef Division Service Matériel	+227 90 78 58 63
M. OUMAROU BOUBACAR	MISP	DMP	+227 96 58 88 98 +227 90 73 21 25
M. TANKARI ISSOUFOU	GARDE NATIONALE DU NIGER	-	+227 97 43 44 94
Monsieur Mamoudou Halido	MSP	DMP	+227 90 23 84 44
	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE DE TAHOUA	Directeur Régional	-
Monsieur Issoufou	ARMP/MARADI	Secrétaire Régional	-
Monsieur ELH. ABBA KIARI Laminou	NIGER TELECOMS	Manager des Achats	+227 93 68 35 35 +227 20 73 66 32
Monsieur Chaibou	DR/NIGER TELECOM	DR/MI	-
Monsieur Issoufou	ARMP/MI	Secrétaire Régionale	-
Madame ADAMOU Rabi	OPVN	DMP	+227 94 85 24 15 +227 96 98 46 49
Monsieur Issoufou	ARMP/MI	Secrétaire Régionale	-
Monsieur Dela Abdou Boubacar	PASEC	SPM	+227 96 47 01 08 +227 90 50 26 56
	PASEC ANTENNE MARADI	Coordinateur	-
Monsieur Issoufou	ARMP/MARADI	Secrétaire Régional	-
Monsieur ALI MAMAN SANI	ARMP/NIAMEY	Secrétaire Régional	-
Madame RAMATOU	PGRC-DU	Assistante Infrastructure	-
Monsieur Djibo Zaneidou	PRODAF/MI	Responsable Composante A	-
Madame Bachar Fatima	PRODAF/MI	Responsable Passation de Marché	-
MONSIEUR ABDOULAYE	DRULA	Divisionnaire	-
MONSIEUR SOULEY DJIBO	UDDM	Directeur CROU	-
