



Fraternité - Travail - Progrès



Agence de Régulation des Marchés Publics
(ARMP)

RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'AUDIT PHYSIQUE - VERSION FINALE -

**AUDIT DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DE
L'ANNEE 2021**



JUILLET 2022

PRESENTE PAR LE GROUPEMENT DE CABINET :



ET



SOMMAIRE

ABREVIATIONS ET ACRONYMES	6
RESUME	7
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE	13
1. CONTEXTE DE LA MISSION	13
2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION	14
3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE	14
3.1. DETERMINATION DE L'ECHANTILLON POUR L'AUDIT PHYSIQUE	14
3.1.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE	14
3.1.2. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON	14
3.2. DEROULEMENT DE LA MISSION	15
3.2.1. PRISE DE CONTACT	15
3.2.2. REVUE DOCUMENTAIRE	15
3.2.3. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN	16
3.2.4. REDACTION DU RAPPORT	16
3.3. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION	17
DEUXIEME PARTIE : PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE	18
1. TAUX DE COUVERTURE	18
2. CONSTATS SPECIFIQUES RECURRENTS	21
3. RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE	24
1.1	62
ANNEXES	133
ANNEXE 1 : PLAN D'ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS	133
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES	136

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Echantillon par nature.....	7
Tableau 2 : Echantillon par mode de passation	8
Tableau 5: Marché en cours d'exécution.....	11
Tableau 6: Echantillon par nature.....	15
Tableau 7: Echantillon par mode de passation	15
Tableau 8 : Statistique du nombre de marchés en carence documentaire	21
Tableau 9: Statistique des équipements acquis mais non utilisés	22

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Illustration de l'échantillon par nature	8
Graphique 2 : Illustration de l'échantillon en nombre par mode de passation	9
Graphique 3 : Illustration de l'échantillon en valeur par mode de passation	9
Graphique 4: Illustration du taux de couverture globale	20

PREAMBULE

Le présent document dit « **Rapport de synthèse de l'audit physique** » a pour objet de présenter le résultat final de l'exécution physique des marchés passés par trente (30) Autorités Contractantes au titre de l'exercice budgétaire 2021.

Conformément aux termes de référence, un rapport d'audit de conformité et un rapport d'audit physique versions provisoires et versions finales – ont été transmis à chacune des trente Autorités Contractantes.

Le **Rapport de synthèse de l'audit physique** s'articule autour des points suivants :

- ✚ Le résumé du rapport ;
- ✚ L'introduction et le contexte de la mission ;
- ✚ Le rappel des objectifs de la mission ;
- ✚ L'approche méthodologique utilisée ;
- ✚ Les résultats de la revue de l'exécution physique des marchés ;
- ✚ Le plan d'actions issues des principaux constats & recommandations.

Ce rapport est complété par deux (02) annexes : le plan d'action de mise en œuvre des recommandations (Annexe 1) et la liste des personnes rencontrées (Annexe 2).

NB : l'audit de conformité des marchés sélectionnés, de la période concernée, a fait l'objet d'un rapport séparé conformément aux termes de référence de la mission.

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Abréviations et acronymes	Appellations complètes/Détails
AAO	Avis d'Appel d'Offres
AC	Autorité Contractante
ANSI	Agence Nationale pour la Société de l'Information
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
CENI	Commission Electorale Nationale Indépendante
CFS	Cellule Filets Sociaux
CR Harikanassou /DO	Commune Rurale de Harikanassou /DO
CRDG/MI	Commune Rurale de Dan Goulbi /MI
CU Magaria /ZR	Commune Urbaine de Magaria /ZR
DFM	Direction des Finances et du Matériel
DIRCAB/PRN	Présidence de la République du Niger
DNPGCA	Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires
DP	Demande de Proposition
DRH/A /TI	Direction Régional de l'Hydraulique et de l'Assainissement
DRH/A /ZR	Direction Régional de l'Hydraulique et de l'Assainissement
DRSP /TI	Direction Régional de la Santé Publique
ED	Entente Directe
ENA	Ecole Nationale d'Administration
FAFPA	Fond d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage
HRM /MI	Hôpital de Référence (HRM) /MI
M/ULA	Ministère de l'Urbanisme et de Logement
MDN	Ministère de la Défense Nationale
MEN	Ministère de l'Education Nationale
MES	Ministère de l'Enseignement Supérieur
MF	Ministère des Finances
MHA	Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
MID	Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
MSPPAS	Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales
NIGELEC	Société Nigérienne d'Electricité
NT	Niger Telecoms
ONPPC	Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques du Niger
OPVN	Office des Produits Vivriers du Niger
PAPDS	Projet d'Appui pour la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire
PARCA	Projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil
PGRC-DU	Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et Développement Urbain
ProDAF /DA	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale dans la Région de Diffa
ProDAF /ZR	Programme de Développement de l'Agriculture Familiale
SO	Sans Objet
TDR	Termes de Référence
TTC	Toutes Taxes Comprises

RESUME

L'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Niger a commandité un audit des marchés passés par les Autorités Contractantes (AC) au titre de l'exercice budgétaire 2021.

Le Groupement de cabinets International Consultants for Procurement (ICP Sarl) et Management, Audit & Consulting (MAC Consulting), suite à une procédure compétitive, a été retenu pour cette mission (Audit des marchés publics et des Délégations de Service Public de l'année 2020).

❖ ECHANTILLON D'ETUDE

Au total ce sont deux mille quatre cent quatre-vingt-trois (2 483) marchés qui ont été passés durant l'exercice budgétaire 2021, pour un montant de trois cent cinquante-cinq milliards sept cent soixante-trois millions neuf cent trente-trois mille six cent trente-deux (355 763 933 632) FCFA.

L'échantillon des marchés effectivement audités a porté sur **trois cent dix (310)** d'un montant cumulé de **cent vingt milliards sept cent onze millions deux cent trente-deux mille huit cent cinquante-neuf (120 711 232 859) francs CFA**. Cela représente **trente-quatre pourcent (34%)** de la valeur totale de l'échantillon des marchés passés en 2021 par Autorités Contractantes concernées.

De cet échantillon soumis à l'audit de conformité, nous avons extrait **quarante-six (46) marchés (15%)**, d'un montant de **trente-sept milliards huit cent quarante-trois millions neuf cent quarante un mille deux cent cinquante-sept (37 843 941 257) FCFA** dont nous avons vérifié l'exécution physique sur le terrain. Ce volume représente **31%** de la valeur totale de l'échantillon de l'audit de conformité.

La répartition de cet échantillon par nature des marchés est donnée ci-dessous :


Tableau 1 : Echantillon par nature

NATURE	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Fournitures et Services courants	22	48%	24 532 922 798	65%
Travaux	23	50%	13 301 534 509	35%
Prestations Intellectuelles	1	2%	9 483 950	0,03%
TOTAL	46	100%	37 843 941 257	100%

Commentaires : l'échantillon de l'audit physique est constitué de :

- **Vingt-deux (22) dossiers de fournitures (48%)** d'une valeur de 24 532 922 798 FCFA **soit 65% de l'échantillon.**
- **Vingt-trois (23) marchés de travaux (50% de l'effectif de l'échantillon)** et qui représentent **35% de la valeur de l'échantillon.**
- **Un (01) marché de prestations intellectuelles (2% de l'effectif de l'échantillon)** et qui représentent **0,03% de la valeur de l'échantillon.**

Graphique 1 : Illustration de l'échantillon par nature

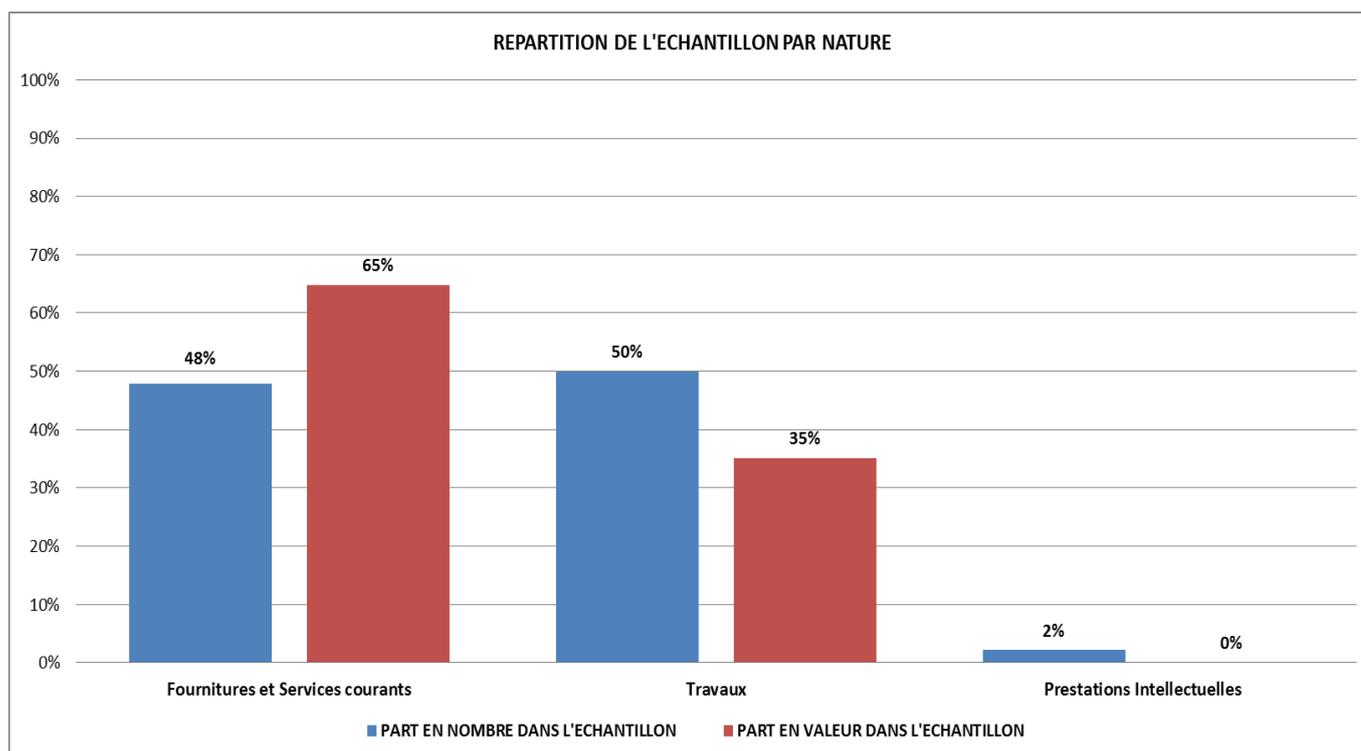

La distribution de cet échantillon par mode de passation de marchés se présente comme suit :


Tableau 2 : Echantillon par mode de passation

MODE DE PASSATION	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Appel d'Offres International	2	4%	3767310672	10%
Appel d'Offres National	12	26%	3562952174	9%
Demandes des Renseignements et de Prix (DRP)	1	2%	49023000	0%
Marché négocié par Entente Directe	31	67%	30464655411	81%
TOTAL	46	100%	37 843 941 257	100%


Commentaires : de cet échantillon de l'audit physique on retient que :

- **Deux (02) marchés sont passés par appel d'offres international (4%) et représentent 10% de la valeur de l'échantillon ;**
- **Douze (12) marchés sont passés par appel d'offres national (26%) et représentent 9% de la valeur de l'échantillon ;**
- **Un (01) marché (2%) ont été passés par demandes des renseignements et de prix (DRP) pour un montant de 49 023 000 FCFA.**
- **Trente un (31) marchés ont été négociés par Entente Directe et représentent un montant cumulé de 30 464 655 411 FCFA (81% de la valeur de l'échantillon total) ;**

Graphique 2 : Illustration de l'échantillon en nombre par mode de passation

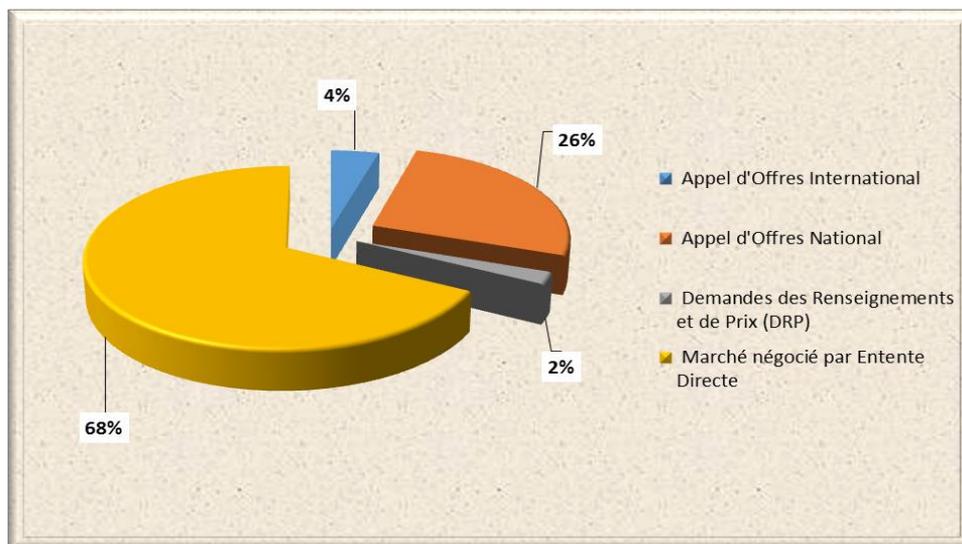

Graphique 3 : Illustration de l'échantillon en valeur par mode de passation

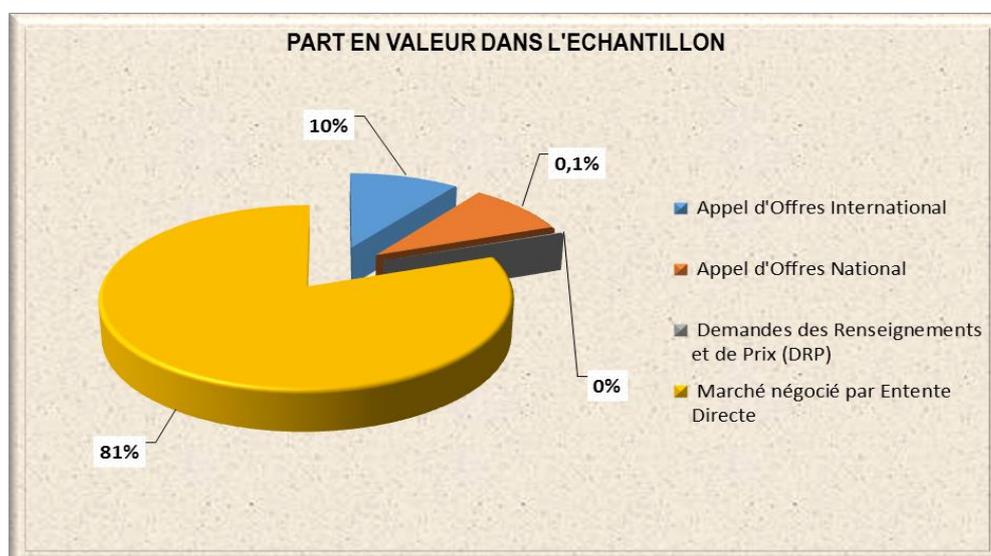

❖ UN CONTEXTE SECURITAIR PEU FAVORABLE

La mission d'audit physique des marchés passés par les Autorités Contractantes retenues dans l'échantillon mentionné ci-dessus au titre de l'exercice budgétaire 2021 s'est déroulée dans un environnement sécuritaire un peu particulier. Certaines régions en effet, sites de travaux ou bénéficiaires de biens acquis, n'ont pu être visitées (Agadez, Diffa et Tahoua) pour des raisons de sécurité.

❖ LA MISE A DISPOSITION DE L'INFORMATION

L'information fournie est, pour certaines Autorités Contractantes, toujours restée, tant qualitativement que quantitativement, très en deçà du minimum requis pour ce type de mission : inexistence de notification, pas de rapports de suivi de l'exécution ou pas de procès-verbaux de réception des travaux ou de livraison des fournitures, document de paiement. Ainsi, le long délai mis par certaines AC pour la mise à disposition des documents d'exécution, les problèmes d'archivage de dossiers, le niveau de complétude très faible des dossiers de marché ont énormément gêné le déroulement correct de la mission.

❖ PRINCIPAUX CONSTATS

- **Mauvaise qualité de certains travaux exécutés** : des ouvrages réceptionnés ou en cours d'exécution, dans certains cas, sont de mauvaise qualité et souvent ne correspondent pas aux spécifications contractuelles.

Tableau : Liste des marchés dont les ouvrages réceptionnés ou en cours d'exécution sont de mauvaise qualité

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
N° 01/2020/CU Magaria	Aménagement des Sites maraichers de Hayin Kori, Goumza et Gouzgourou	Commune Urbaine de Magaria (CU/Magaria)	Travaux	Entreprise Gangara et Frères	37 219 207
N° 003/CR/DG/2021	Réalisation D'une Muni AEP Multi-Villages a Dan Gao dans la commune Rurale de Birnin Lallé, Département de Dakoro, Région de Maradi	Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)	Travaux	BATHYR SARL	183 869 750
Marché N°295/21/MF/D GCMP/EF	Travaux de confortation de la piste rurale Almari-Kirchia-Ganisco, dans le Pôle de Développement Economique de Mirriah, région de Zinder.	Programme De Développement Agricole Et Familial (PRODAF)	Travaux	ENTREPRISE OULD	248 722 415 FCFA

- **Longs délais de réalisation et non application des pénalités de retard dans la majorité des cas** : les délais de réalisation ne sont souvent pas respectés sans pour autant que les pénalités prévues au marché soient appliquées.

Tableau : Liste des marchés dont les délais de réalisation ne sont pas respectés

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
N° 003/CR/DG/2021	Réalisation D'une Muni AEP Multi-Villages a Dan Gao dans la commune Rurale de Birnin Lallé, Département de Dakoro, Région de Maradi	Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)	Travaux	BATHYR SARL	183 869 750 FCFA

- **Manque d'entretien des équipements acquis** : certains équipements livrés manquent d'entretien ce qui les expose à une dégradation précoce.

Tableau : Liste des ouvrages qui manque d'entretien

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
N° 01/2020/CU Magaria	Aménagement des Sites maraichers de Hayin Kori, Goumza et Gouzgourou	Commune Urbaine de Magaria (CU/Magaria)	Travaux	Entreprise Gangara et Frères	37 219 207

- **Marchés en cours d'exécution au moment du passage de la mission d'audit :**

Tableau 3: Marché en cours d'exécution

Numéro	Objet	Autorité Contractante	Nature du Marché	Titulaire du Marché	Montant
N° 003/CR/DG/2021	Réalisation D'une Muni AEP Multi-Villages a Dan Gao dans la commune Rurale de Birnin Lallé, Département de Dakoro, Région de Maradi	Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)	Travaux	BATHYR SARL	183 869 750
AON N°001/2020	Réhabilitation et construction d'infrastructures sanitaires pour la transformation du CSI type 1 en CSI type 2 de Koné Béri, District de Kollo, région de Tillabéri	Direction Régionale de la Santé Publique de la Région de Tillabéri (DRSP/TI)	Travaux	EMSA	269 196 491 FCFA
N°001/ENA/DG	Construction d'un ensemble de bâtiments aux profits de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA)	École Nationale d'Administration (ENA)	Travaux	ENTREPRISE SADDI IBRAHIMA	1 097 135 199 FCFA
N°079/2020/DN/MULDL/SG/DGAC/DMP-DSP	Travaux Complémentaires de construction d'un aérogares et salon d'honneur à Diffa (Construction de la tour de Contrôle)	Ministère de l'Urbanisme et de Logement (M/ULA)	Travaux	Entreprise Kakarba Service	871 477 343 FCFA
663/21/MF/DGCMP/OB	Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les régions d'Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder (lot 5 : région de Niamey)	Ministère de l'Education Nationale (MEN)	Travaux	ENTREPRISE ECOMEF	169 356 182 FCFA
010/2021/MESR/SG/DM P/DSP	Travaux de construction d'un amphithéâtre 1000 places à la faculté des lettres et sciences	Ministère des Enseignements Supérieurs de La Recherche et de l'Innovation (MES/RI)	Travaux	ENTREPRISE ALPHA OUMAROU ET FILS	1 059 127 226 FCFA
N° 338/21/MF/DGIMP/EF ET N°340/21/MF/DGIMP/EF	Travaux de réalisation d'une adduction d'eau potable multi-villages dans le village centre de kossa dans la commune rurale de badaguichiri, region de tahaoua	Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement	Travaux	Entreprise DIDI GLOBAL/BTP/H	1 124 691 015 F CFA
N° 002/Travaux /MRI/2020	50 classes régions d'Agadez 70 classes régions de Maradi	Projet des Gestions des Risques de Catastrophes et de Developpement Urbain (PGRC-DU)	Travaux	Entreprise Mahamadou Maikano AAMM	193 352 628 FCFA
Marché N°206/21/MF/DGCMP/EF	Travaux de de la piste rurale Almari-Kirchia-Ganisco, dans le Pôle de Développement Economique de Mirriah, région de Zinder.	Programme De Développement Agricole Et Familial (PRODAF)	Travaux	ENTREPRISE TCHILOUTA BACHAR	163 596 496 FCFA

❖ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

- **Centralisation, gestion et archivage de la documentation : mettre en place un système de classement et d'archivage centralisé pour les documents relatifs aux marchés et contrats.** L'ARMP devra éditer dans les plus brefs délais un « **manuel de classement et d'archivage des documents** » des marchés et contrats à l'intention de toutes les Autorités Contractantes afin de permettre la mise en place d'un système de classement harmonisé et centralisé au niveau des Directions des Finances et du Matériel (DFM) pour les Ministères et les Services Administratifs et/ou Financiers pour les Collectivités Locales, les Projets et les Organismes Personnalisés ;
- **Prévoir une retenue de garantie** dans les marchés pour corriger les malfaçons et procéder à la réception définitive des ouvrages une fois le délai de garantie échu ;
- **Faire appliquer les pénalités de retard** : un suivi technique plus rigoureux doit être mis en place afin de faire respecter les délais contractuellement prévus. Il est clair que si les conditions ne sont pas respectées par l'Autorité Contractante (retards excessifs de règlement des factures, par exemple), le constat doit en être fait de manière formelle. Par ailleurs, les pénalités de retard contractuelles doivent être appliquées conformément aux marchés si la responsabilité du titulaire est engagée. La non application des pénalités doit être explicitée ;
- **S'assurer de l'utilité des équipements** avant d'envisager leur acquisition ;
- **Prendre des dispositions sécuritaires** appropriées dans le cas des travaux en zones à risque sinon éviter d'y lancer des travaux ;
- **Associer les services des impôts au démarrage des projets** pour anticiper sur les questions d'exonération ;
- **Réaliser une étude d'impact environnemental et social** des travaux dans la phase d'avant-projet et mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale correspondant durant leur exécution ;
- **Faire le point de tous les marchés en souffrance** (sans mouvement physique ni financier depuis plus d'un an) et résilier ceux dont l'arrêt est de la responsabilité de l'entreprise ;
- **Faire le constat de l'abandon des chantiers**, saisir les cautions, résilier le marché et recruter une nouvelle entreprise pour leur achèvement ;
- **Faire le suivi des travaux en cours d'exécution.**

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

1. CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'amélioration de la gestion de ses dépenses publiques, le Gouvernement de la République du Niger a entrepris, entre autres, depuis les années 2011, une réforme en profondeur de son système de passation des marchés publics.

Cette réforme, qui s'aligne sur les meilleurs standards internationaux dans le domaine, a consacré la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adéquat notamment en séparant les fonctions de **passation** (Autorité Contractantes), de **contrôle** (Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers) et de **régulation** (Agence de Régulation des Marchés Publics).

Les changements successifs intervenus, notamment en 2013 et 2016, promeuvent les principes fondamentaux que sont la transparence, l'efficacité et la responsabilisation dans un souci de renforcement du système national de la commande publique et de la gouvernance publique.

Or, l'un des indicateurs importants d'efficacité du système des marchés publics est le taux d'exécution du budget d'investissement à travers les paiements des prestations réalisées. La maîtrise de cet indicateur permet une viabilité du système en procurant les ressources nécessaires aux entreprises pour leur bon fonctionnement et en assainissant les finances publiques par une réduction de la dette intérieure de l'État.

Pour marquer l'amorce de ces changements irréversibles de ce système, et conformément à son mandat, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a sollicité des propositions pour la sélection de consultants dans le cadre de la réalisation de l'audit des marchés publics et des Délégations de Service Public des années 2019, 2020 et 2021.

Cet audit permettra de vérifier la conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés aux dispositions du Code des Marchés Publics et des textes en vigueur.

L'audit des marchés passés au titre de l'exercice budgétaire 2021 sera réalisé conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et concerne **trente (30) Autorités Contractantes**.

Pour conduire cet audit, l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a recruté le **Groupe ICP Sarl et MAC Consulting**. Selon les termes de référence, la mission est répartie en **trois (3) phases** :

- **Phase 1 dite « Audit des marchés publics et des Délégations de Service Public de l'année 2021 »** ;
- **Phase 2 dite « Audit de l'exécution physique »** pour certifier l'état d'avancement, de réalisation et / ou le niveau de dégradation des biens et services concernés.
- **Phase 3 dite « Renforcement des capacités »** de six (6) cadres de l'ARMP ;

Un rapport d'audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le présent document est la version finale du rapport de synthèse de l'audit de l'exécution physique des marchés passés par les **trente (30) Autorités Contractantes**.

L'équipe d'experts principaux proposés pour cette mission est composée de :

- **MEGUHE GNOLEBA MATHIEU**, Chef de mission, Auditeur, Expert en passation des marchés publics.
- **GARBA BACHAR**, Expert auditeur financier et comptable.
- **ISSOUFOU MADOUGOU HASSANE**, Expert auditeur financier et comptable.

Cette équipe a été appuyée par :

- **HERVE ATROKPO**, Spécialiste en passation des marchés.
- **ABDOU DJAODJE ZAKARI YAOU**, Ingénieur de travaux civil et infrastructures.
- **SANI CHAIBOU**, Ingénieur de travaux civil et infrastructures.
- **Toute l'équipe locale de MAC Consulting.**

Aux termes de la mission, le Groupement ICP Sarl – MAC Consulting exprime ses sincères remerciements à l'**Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)** et aux différentes Autorités Contractantes concernées, pour les facilités et les contributions significatives apportées à la réussite de cette étude à l'issue de laquelle le présent rapport a été rédigé.

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

L'audit de l'exécution physique doit permettre de :

- certifier l'état d'avancement et / ou le niveau de dégradation des ouvrages concernés ;
- exprimer son opinion sur la qualité de l'exécution des contrats, cette opinion incluant les aspects techniques, la correspondance entre la réalisation physique et la réalisation financière ;
- diagnostiquer l'état des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports ;
- formuler des recommandations suite aux constats identifiés à l'issue de la mission.

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE

3.1. DETERMINATION DE L'ECHANTILLON POUR L'AUDIT PHYSIQUE

3.1.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE

Les termes de référence indiquent que sur l'échantillon de base (échantillon de l'audit de conformité), le consultant sélectionnera, pour l'audit physique, un lot de marchés représentant 15% en nombre, en excluant les marchés non éligibles à la vérification matérielle auxquels s'ajouteront tous les marchés ayant fait l'objet de recours et ceux passés par entente directe.

3.1.2. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON

L'échantillon obtenu sur la base des hypothèses précédentes, comprend **quarante-six (46)** marchés, d'un montant de **trente-sept milliards huit cent quarante-trois millions neuf cent quarante un mille deux cent cinquante-sept (37 843 941 257) FCFA** pour lesquels la mission a estimé un certain nombre d'éléments réunis devant lui permettre de donner une opinion.

Il est composé de :

- **Vingt-deux (22) dossiers de fournitures (48%) d'une valeur de 24 532 922 798 FCFA soit 65% de l'échantillon.**
- **Vingt-trois (23) marchés de travaux (50% de l'effectif de l'échantillon) et qui représentent 35% de la valeur de l'échantillon.**
- **Un (01) marché de prestations intellectuelles (2% de l'effectif de l'échantillon) et qui représentent 0,03% de la valeur de l'échantillon.**

Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de marchés soumis à l'audit de vérification physique.

Tableau 4: Echantillon par nature

NATURE	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Fournitures et Services courants	22	48%	24 532 922 798	65%
Travaux	23	50%	13 301 534 509	35%
Prestations Intellectuelles	1	2%	9 483 950	0,03%
TOTAL	46	100%	37 843 941 257	100%

La répartition de cet échantillon par mode de passation se présente comme suit :

Tableau 5: Echantillon par mode de passation

MODE DE PASSATION	ECHANTILLON DES MARCHES AUDITES			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Appel d'Offres International	2	4%	3767310672	10%
Appel d'Offres National	12	26%	3562952174	9%
Demandes des Renseignements et de Prix (DRP)	1	2%	49023000	0%
Marché négocié par Entente Directe	31	67%	30464655411	81%
TOTAL	46	100%	37 843 941 257	100%

3.2. DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission d'audit de l'exécution physique s'est déroulée en quatre (4) étapes :

- les prises de contact ;
- la revue de la documentation existante ;
- la collecte des données : visite des sites où les ouvrages / équipements ont été réalisés / livrés ;
- la rédaction du rapport.

3.2.1. PRISE DE CONTACT

Ce type de mission requiert la pleine collaboration de l'Autorité Contractante. A ce titre il a été planifié une réunion de démarrage de la mission au cours de laquelle, notre équipe :

- s'est assurée que l'Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de la mission ;
- a rappelé le périmètre de la mission ;
- a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport final ;
- a confirmé avec l'Autorité Contractante le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y afférentes.

3.2.2. REVUE DOCUMENTAIRE

Le consultant a procédé à la collecte et à l'analyse de la documentation existante se rapportant à l'objet de la mission (contrats y compris plans éventuels, devis descriptifs et estimatifs, rapports journaliers de chantiers, procès-verbaux (PV) de visites de chantiers et de réceptions, rapports périodiques d'avancement).

S'agissant des marchés de travaux, la mission a pu se procurer dans certains cas, les contrats de contrôle et les termes de référence assignés aux bureaux de suivi et contrôle des travaux.

3.2.3. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN

3.2.3.1. PREPARATION DES TRAVAUX DE TERRAIN

Cette tâche s'est résumée à l'information des services concernés avant le déplacement de l'Expert sur le terrain. Ainsi, à la demande de l'Auditeur, des lettres ont été adressées par l'ARMP (**Agence de Régulation des Marchés Publics**) aux entités administratives responsables des marchés ciblés.

Après quoi, des points focaux ont été identifiés afin de faciliter l'accès de l'Expert aux ouvrages et aux documents ainsi que les échanges avec les personnes ressources.

3.2.3.2. MISSION DE TERRAIN

Après avoir pris connaissance de la documentation existante se rapportant à la mission, un programme de visites des différents sites a été élaboré en concertation avec l'Autorité Contractante.

Les informations obtenues au cours de cette étape ont été recueillies à partir :

- des visites des sites où les ouvrages ont été réalisés ;
- du contrôle physique des biens (fournitures) ;
- des entretiens avec les services techniques locaux ayant été impliqués dans le processus d'exécution des contrats ;
- des entretiens avec les représentants des bénéficiaires des opérations.

Le contrôle physique a porté pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants :

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées : contrôle physique des travaux avec les procès-verbaux de réception provisoire ;
- le diagnostic sur l'état des ouvrages par référence à leur description dans les marchés et leur état actuel compte tenu de leur âge et de leur condition d'utilisation : l'exhaustivité, la qualité des ouvrages au regard des devis quantitatif et estimatif des marchés et spécifications techniques ;
- la conformité de la réception des ouvrages et des services avec les spécifications techniques ou les termes de référence du marché ;
- les ordres de services signés.

Plus spécifiquement pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur :

- la conformité physique des travaux avec les Procès-verbaux (PV) de réception provisoire et définitive ;
- la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site ;
- l'état de fonctionnement des ouvrages ;
- les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ;
- la cohérence des quantités ;
- la mise à jour des malfaçons ;
- les dangers éventuels pouvant découler de la malfaçon de certains ouvrages.

3.2.4. REDACTION DU RAPPORT

Le présent rapport final a pour but de restituer les résultats des investigations effectuées et de formuler les commentaires et les recommandations de l'Auditeur. Il présente :

- les constatations générales ;
- les conclusions et recommandations ;
- les observations pour chaque marché retenu dans l'échantillon ;
- les photographies des ouvrages réalisés ou des biens acquis pour chaque marché retenu dans l'échantillon.

3.3. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION

En dépit de la bonne collaboration des Autorité Contractantes, nous avons noté quelques difficultés ci-après :

- une carence documentaire qui ne permettait pas une bonne exploitation des dossiers mis à la disposition de la mission ;
- Indisponibilité de visiter des travaux à cause des problèmes administratifs ;
- des zones inaccessibles pour des raisons de sécurité.

DEUXIEME PARTIE : PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT DE L'EXECUTION PHYSIQUE

1. TAUX DE COUVERTURE


Tableau : Taux de couverture globale

AUTORITE	ECHANTILLON A AUDITER	ECHANTILLON AUDITE		SOLDE	OBSERVATIONS
CONTRACTANTE	QTE	QTE	%		
Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Agence Nationale pour la Société de l'Information (ANSI)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Cabinet de la Présidence de la République du Niger (CAB/PRN)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Cellule Filets Sociaux (CFS)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Commune Rurale de Harikanassou (CR/HARIKANASSOU)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Commune Urbaine de Magaria (CU/Magaria)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Dispositif National de Préventions et de Gestion des Crises Alimentaires (DNP/GCA)	1	1	100%	0	Revue Achevée
DIRECTION REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (DRHA/TI)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Zinder (DRHA/ZR)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Direction Régionale de la Santé Publique de la Région de Tillabéri (DRSP/TI)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ecole Nationale d'Administration (ENA)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Fonds Commun d'Appui à la Mise en Œuvre du Plan de Développement Sanitaire (FC-PDS)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Hopital de Reference de Maradi (HRM)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ministère de la Défense Nationale (MDN)	3	3	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'Urbanisme et de Logement (M/ULA)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'Education Nationale (MEN)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère des Enseignements Supérieurs de La Recherche et de l'Innovation (MES/RI)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Ministère des Finances (MF)	2	2	100%	0	Revue Achevée

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses (MI/SP/D/ACR)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Ministère de la Santé Publique (MSP)	1	1	100%	0	Revue Achevée
Société Nigérienne de l'Electricité (NIGELEC)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Niger Télécoms (NT)	2	2	100%	0	Revue Achevée
OFFICE NATIONAL DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES DU NIGER (ONPPC)	3	3	100%	0	Revue Achevée
Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN)	2	2	100%	0	Revue Achevée
PROJET D'APPUI AUX REFUGIES ET AUX COMMUNAUTES D'ACCUEIL « PARCA »	1	1	100%	0	Revue Achevée
Projet des Gestions des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Programme De Développement Agricole Et Familial (PRODAF)	2	2	100%	0	Revue Achevée
Total	46	46	100%	0	

Il ressort de ce tableau que cent pour cent (100%) des marchés ont été audités physiquement.

Graphique 4: Illustration du taux de couverture globale

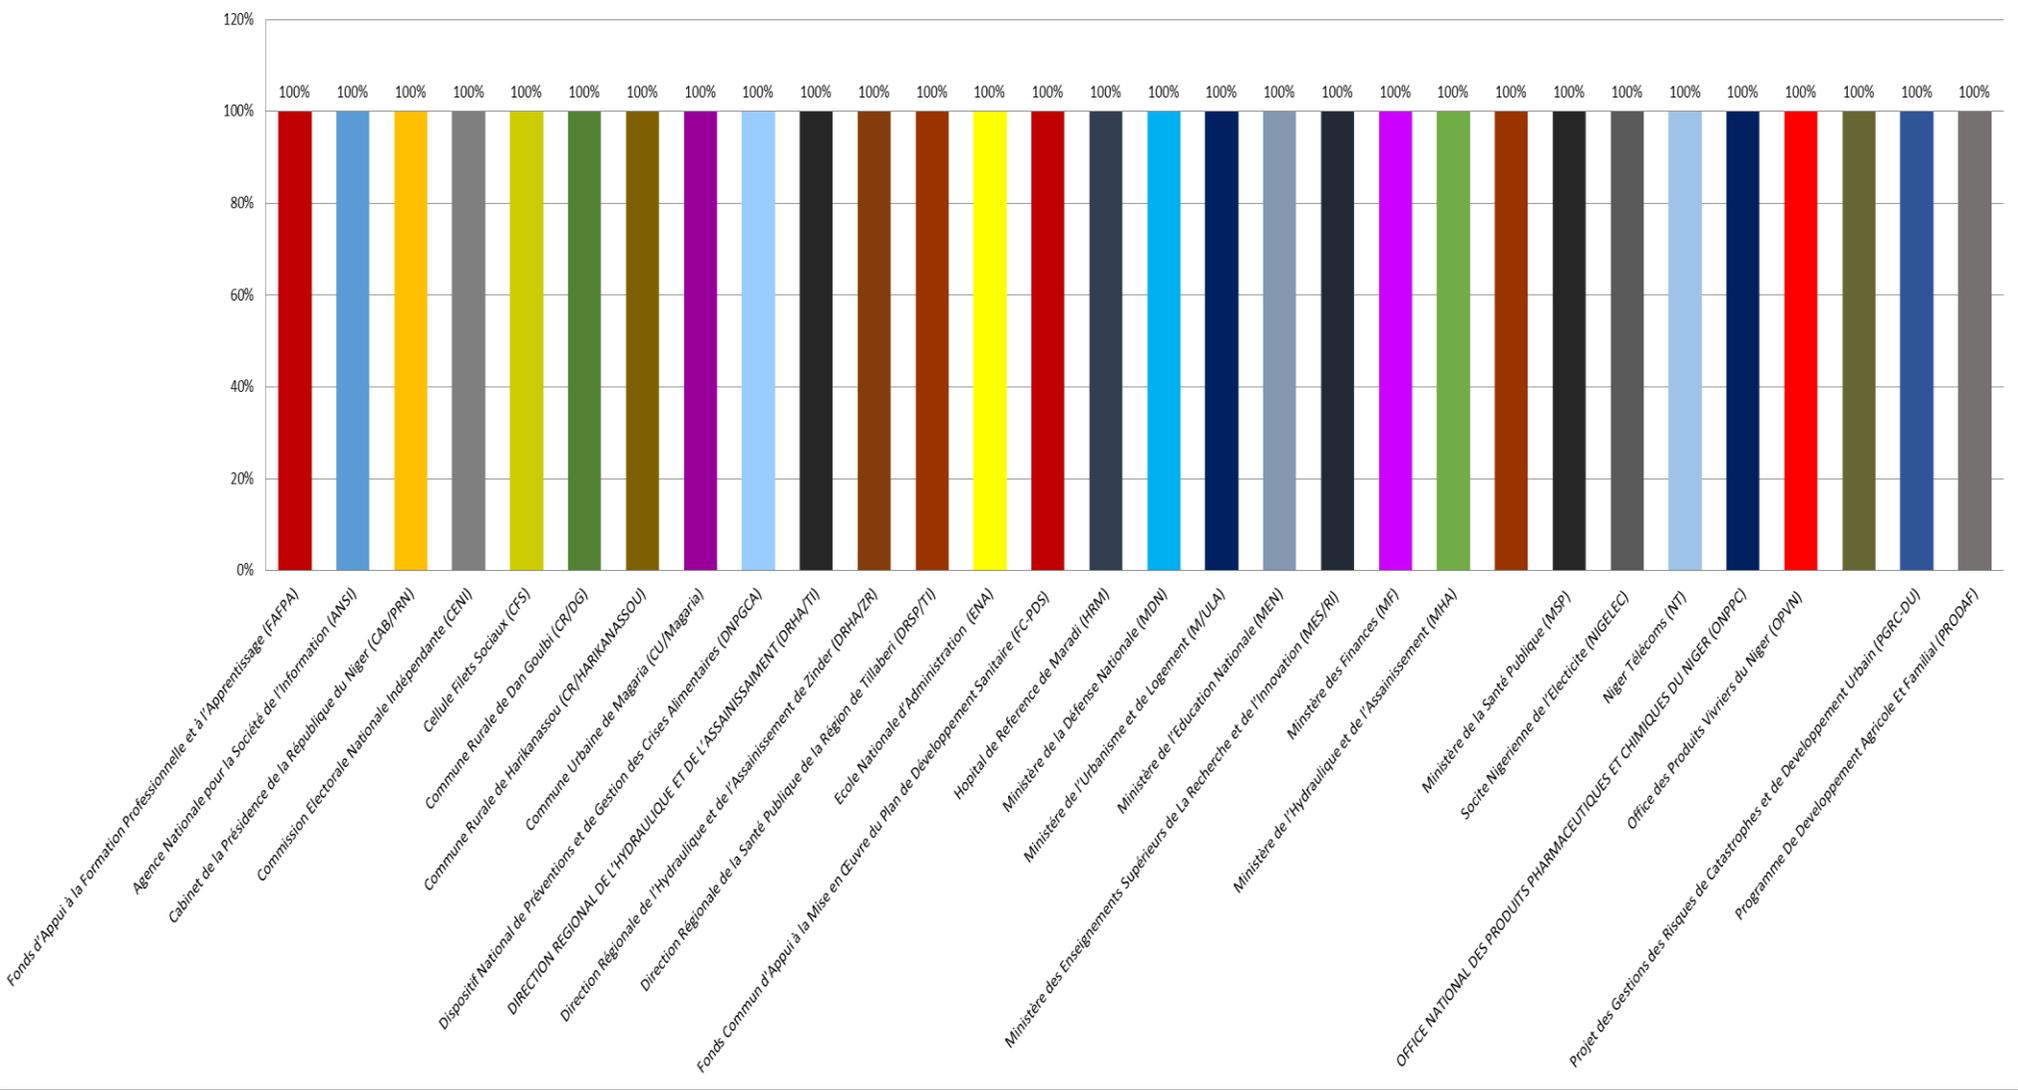

2. CONSTATS SPECIFIQUES RECURRENTS

2.1. Carence de l'archivage des documents des marchés et notamment de pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de travaux, fournitures et prestations intellectuelles

Tableau 6 : Statistique du nombre de marchés en carence documentaire

AUTORITE CONTRACTANTE	ECHANTILLON AUDITE	NOMBRE DE MARCHES EN CARENCE DOCUMENTAIRE	RATIO
Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA)	1	0	0%
Agence Nationale pour la Société de l'Information (ANSI)	1	0	0%
Cabinet de la Présidence de la République du Niger (CAB/PRN)	2	0	0%
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)	1	0	0%
Cellule Filets Sociaux (CFS)	1	0	0%
Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)	1	0	0%
Commune Rurale de Harikanassou (CR/HARIKANASSOU)	2	0	0%
Commune Urbaine de Magaria (CU/Magaria)	1	0	0%
Dispositif National de Préventions et de Gestion des Crises Alimentaires (DNP/GCA)	1	0	0%
DIRECTION REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (DRHA/TI)	1	0	0%
Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Zinder (DRHA/ZR)	1	0	0%
Direction Régionale de la Santé Publique de la Région de Tillabéri (DRSP/TI)	1	0	0%
Ecole Nationale d'Administration (ENA)	1	0	0%
Fonds Commun d'Appui à la Mise en Œuvre du Plan de Développement Sanitaire (FC-PDS)	1	0	0%
Hopital de Reference de Maradi (HRM)	1	0	0%
Ministère de la Défense Nationale (MDN)	3	0	0%
Ministère de l'Urbanisme et de Logement (M/ULA)	2	0	0%
Ministère de l'Education Nationale (MEN)	2	0	0%
Ministère des Enseignements Supérieurs de La Recherche et de l'Innovation (MES/RI)	1	0	0%
Ministère des Finances (MF)	2	0	0%
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)	2	0	0%
Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses (MI/SP/D/ACR)	2	0	0%
Ministère de la Santé Publique (MSP)	1	0	0%

Société Nigérienne de l'Electricité (NIGELEC)	2	0	0%
Niger Télécoms (NT)	2	0	0%
OFFICE NATIONAL DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES DU NIGER (ONPPC)	3	0	0%
Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN)	2	0	0%
PROJET D'APPUI AUX REFUGIES ET AUX COMMUNAUTES D'ACCUEIL (PARCA)	1	0	0%
Projet des Gestions des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU)	2	0	0%
Programme de Développement Agricole Et Familial (PRODAF)	2	0	0%
TOTAL	46	0	0%

Il ressort de ce tableau que la documentation des marchés passés par les autorités contractantes était disponible.

2.2. Equipements acquis mais non utilisés, à l'abandon ou mal entretenus

Tableau 7: Statistique des équipements acquis mais non utilisés

AUTORITE CONTRACTANTE	ECHANTILLON AUDITE	NOMBRE DE MARCHES CONCERNES	POURCENTAGE
Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA)	1	0	0%
Agence Nationale pour la Société de l'Information (ANSI)	1	0	0%
Cabinet de la Présidence de la République du Niger (CAB/PRN)	2	0	0%
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)	1	0	0%
Cellule Filets Sociaux (CFS)	1	0	0%
Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)	1	0	0%
Commune Rurale de Harikanassou (CR/HARIKANASSOU)	2	0	0%
Commune Urbaine de Magaria (CU/Magaria)	1	1	100%
Dispositif National de Préventions et de Gestion des Crises Alimentaires (DNP/GCA)	1	0	0%
DIRECTION REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (DRHA/TI)	1	0	0%
Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Zinder (DRHA/ZR)	1	0	0%
Direction Régionale de la Santé Publique de la Région de Tillabéri (DRSP/TI)	1	0	0%

Ecole Nationale d'Administration (ENA)	1	0	0%
Fonds Commun d'Appui à la Mise en Œuvre du Plan de Développement Sanitaire (FC-PDS)	1	0	0%
Hôpital de Référence de Maradi (HRM)	1	0	0%
Ministère de la Défense Nationale (MDN)	3	0	0%
Ministère de l'Urbanisme et de Logement (M/ULA)	2	0	0%
Ministère de l'Éducation Nationale (MEN)	2	0	0%
Ministère des Enseignements Supérieurs de La Recherche et de l'Innovation (MES/RI)	1	0	0%
Ministère des Finances (MF)	2	0	0%
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)	2	0	0%
Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses (MI/SP/D/ACR)	2	0	0%
Ministère de la Santé Publique (MSP)	1	0	0%
Société Nigérienne de l'Électricité (NIGELEC)	2	0	0%
Niger Télécoms (NT)	2	0	0%
OFFICE NATIONAL DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES DU NIGER (ONPPC)	3	0	0%
Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN)	2	0	0%
PROJET D'APPUI AUX REFUGIES ET AUX COMMUNAUTES D'ACCUEIL « PARCA »	1	0	0%
Projet des Gestions des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU)	2	0	0%
Programme de Développement Agricole Et Familial (PRODAF)	2	0	0%
TOTAL	46	1	2%

Un marché (01) marché d'une valeur de trente-sept millions deux dix-neuf mille deux cent sept (37 219 207) francs CFA.

3. RESULTATS DU CONTROLE PHYSIQUE

3.1. Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA)

3.1.1. Acquisition des matériels roulants pour la Direction Générale du FAFPA Lot 2: 2 véhicules 4x4 station wagon tout terrain et 1 véhicule 4x4 station wagon tout terrain V8

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°002/-1/FAFPA/AON/2021
Entreprise (Titulaire du marché)	CFAO MOTORS NIGER S.A. BP: 204 Niamey, Niger
Localisation	NIAMEY
Date de visite	01/04/2022
Date d'approbation du contrat	Le 15 avril 2021
Date de notification du contrat	Provisoire: 25/03/2021
Description sommaire des fournitures	2 VEHICULES 4X4 STATION WAGON TOUT TERRAIN ET 1 VEHICULE 4X4 STATION WAGON TOUT TERRAIN V8
Montant du marché initial (FCFA)	199 920 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA)	Pas d'avenant
(Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	45 jours
Date effective de livraison	22/04/2020
Procès-verbal de livraison	PV du 16/08/2021, conforme aux quantités contractuelles
Conformité de la quantité livrée	Conforme
(au cas contraire donner les raisons)	
Evaluation du dépassement de délai	Délai de livraison respecté
(Donner les raisons si dépassement de délai)	
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a été intégralement payé par mandatement
Autres commentaires	Néant.

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Les fournitures sont des véhicules qui ont été réceptionnés à 100% à Niamey et dont la livraison est sanctionnée par un procès-verbal. Par ailleurs, nous avons constaté le respect du délai contractuel dans la livraison des véhicules.


- ❖ Conclusions, recommandations : Néant.
- ❖ Quelques images des véhicules :



TOYOTA LANDCRUISER PRADO stationnée au Bureau du FAFPA à Niamey, Quartier Koira Kano



TOYOTA LANDCRUISER V8 au Bureau du FAFPA à Niamey, Quartier Koira Kano



Copies de la carte grise et police d'assurance de la TOYOTA LANDCRUISER PRADO en mission à l'intérieur du Pays

3.2. AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

3.2.1 Fourniture, installation et mise en service du logiciel de Gestion Comptable et Financière intégré "Tom2Pro" au profit PVI.

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	002/COT/PVI/UCP/2021
Entreprise (Titulaire du marché)	CES Informatiques BP : 11 706 - Niamey, Niger
Localisation	Niamey
Date de visite	05/04/2022
Date d'approbation du contrat	17/03/2021
Date de notification du contrat	Non disponible
Description sommaire des fournitures	Fourniture, installation et mise en service du logiciel de Gestion Comptable et Financière intégré "Tom2Pro" au profit PVI
Montant du marché initial (FCFA)	18 152 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	1 mois
Date effective de livraison	13/04/2021 sur le bon de livraison
Procès-verbal de livraison	Non disponible
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement effectué (existence de la facture définitive et de la copie chèque de paiement en date du 05/05/2021)
Autres commentaires	Aucun

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents contractuels.





❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté que le logiciel a été réceptionné dans le délai contractuel.
Nous avons également constaté l'existence physique des kits ainsi que l'installation du logiciel sur un poste de travail. Nous avons disposé de l'ensemble des documents contractuels y compris le bon de livraison daté et signé.

❖ Conclusions, recommandations :

Aucune recommandation particulière ; il faut continuer dans ce sens.

❖ Quelques images prises lors de la visite dans les locaux du PVI :



Images des kits et logiciel installé sur le poste de travail du Comptable Principal

3.3. Cabinet de la Présidence de la République du Niger (CAB/PRN)

3.3.1 Acquisition de matériels informatiques au profit du cabinet de la Présidence de la République

3.3.2 Acquisition de matériels roulants sécurisés au profit du cabinet de la Présidence de la République

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°746/21/MF/DGCMP/OB	N°652/21/MF/DGCMP/OB
Entreprise (Titulaire du marché)	Groupe KANF-Electronics	Ets AGIMEXCO
Localisation	Niamey	Niamey
Date de visite	05/04/2022	05/04/2022
Date d'approbation du contrat	25/11/2021	08/11/ 2021
Date de notification du contrat	25/10/2021	13/10/2021
Description sommaire des fournitures	Matériels informatiques composés d'ordinateurs, d'onduleurs et d'imprimantes	Acquisition de quatorze (14) véhicules sécurisés pour la Présidence et la sécurité présidentielle
Montant du marché initial (FCFA)	82 967 400 FCFA	1 369 000 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	1 mois	1 mois
Date effective de livraison	18/11/2021	08/11/2021
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve le 18/11/2021	Rédigé et prononcé sans réserve le 08/11/2021
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme	Conforme
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Non disponible	Non disponible
Autres commentaires	Aucun	Aucun

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

- Bon déroulement de la mission ;
- Disponibilité des documents contractuels ;
- Bon archivage de la documentation.

❖ **Observations sur la qualité des équipements :**

Pour les 02 marchés (746/21/MF/DGCMP/OB et N°652/21/MF/DGCMP/OB), nous avons constaté l'existence physique ainsi que la conformité des matériels (matériels informatiques et matériels roulants). Par ailleurs, tous les matériels ont été réceptionnés à 100% à Niamey et sanctionnés par des PV de réception datés et signés.

❖ **Conclusions, recommandations :**

Pour les matériels informatiques, il faudrait mettre en place un fichier de suivi global faisant ressortir les éléments tels que le type de matériel, la date d'acquisition, le numéro de série, l'emplacement ou service d'affectation ainsi que le nom complet de l'utilisateur.

❖ Quelques images des équipements / matériels acquis :



Images du reliquat du stock de matériels informatiques acquis

République du Niger Présidence de la République Secrétariat Général Direction des Ressources Financières et du matériel		Formulaire	Date: <u>27</u> <u>12</u> 021
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT			
MATÉRIEL			
1: Ordinateur ✓ 2: Imprimante ✓ 3: Onduleur ✓			
Marque: 1: HP All in One Desktop - 00TQTH4 2: Laserjet couleur HP Pro 479fdw 3: Eaton 1500V			
RESPONSABLE			
Nom: <u>Consulter Diakana</u>		Service: <u>Cellule Nino/Energie</u>	
OBSERVATIONS			
/			

Signature du responsable



République du Niger Présidence de la République Secrétariat Général Direction des Ressources Financières et du matériel		Formulaire	Date: <u>27</u> <u>12</u> 021
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT			
MATÉRIEL			
1: Ordinateur ✓ 2: Imprimante ✓ 3: Onduleur ✓			
Marque: 1: Desktop + GIGALOC HP 2: 3: Eaton 1500V			
RESPONSABLE			
Nom: <u>Consulter Diakana</u>		Service: <u>Cellule Environnement</u>	
OBSERVATIONS			
/			

Signature du responsable



République du Niger Présidence de la République Secrétariat Général Direction des Ressources Financières et du matériel		Formulaire	Date: <u>22</u> <u>12</u> 021
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT			
MATÉRIEL			
1: Ordinateur ✓ 2: Imprimante ✓ 3: Onduleur ✓			
Marque: 1: Desktop - GIGALOC 2: 3: Eaton 1500V			
RESPONSABLE			
Nom: <u>Abdoul Nourou</u>		Service: <u>Cellule Environnement</u>	
OBSERVATIONS			
/			

Signature du responsable




République du Niger Présidence de la République Secrétariat Général Direction des Ressources Financières et du matériel		Formulaire	Date: <u>23</u> <u>12</u> 021
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT			
MATÉRIEL			
1: Ordinateur ✓ 2: Imprimante ✓ 3: Onduleur ✓			
Marque: Desktop 1: Desktop 2: 3: Eaton 1500V			
RESPONSABLE			
Nom: <u>Souleymane Omar Souda</u>		Service: <u>Cellule SIE/COM</u>	
OBSERVATIONS			
/			

Signature du responsable



République du Niger Présidence de la République Secrétariat Général Direction des Ressources Financières et du matériel		Formulaire	Date: <u>30</u> <u>11</u> 021
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT			
MATÉRIEL			
1: Ordinateur ✓ 2: Imprimante ✓ 3: Onduleur ✓			
Marque: HP All in one desktop 1: HP All in one Core i5 2: Imprimante HP Laserjet Pro L4250e 3: Onduleur Eaton 1500V			
RESPONSABLE			
Nom: <u>Consulter Spirit</u>		Service: <u>Cellule pour Gouvernance Agricole</u>	
OBSERVATIONS			
/			

Signature du responsable



République du Niger Présidence de la République Secrétariat Général Direction des Ressources Financières et du matériel		Formulaire	Date: <u>30</u> <u>12</u> 021
FICHE DE VIE ÉQUIPEMENT			
MATÉRIEL			
1: Ordinateur ✓ 2: Imprimante ✓ 3: Onduleur ✓			
Marque: 1: Desktop 00TQTH4 2: HP Laserjet L4250e 3: Eaton 1500V			
RESPONSABLE			
Nom: <u>Baron Chekaroum</u>		Service: <u>et Education</u>	
OBSERVATIONS			
/			

Signature du responsable



**Images de quelques fiches d'affectation renseignées et signées
Répartition des véhicules acquis via le Marché N°652/21/MF/DGCM/0B**



Fraternité-Travail-Progrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DU GARAGE AUTOMOBILE

REPARTITION VEHICULES

NO	MARQUE	TYPE	IMMATRICULATION
1	MERCEDES	S600	PR
2	TOYOTA	VDJ	PR
3	MERCEDES	S350	PRN 007
4	MERCEDES	S350	PRN 008
5	TOYOTA	VDJ	AX 6452
6	TOYOTA	VDJ	AX 6447
7	TOYOTA	VDJ	AX 6463
8	TOYOTA	CAMRY	AX 6473
9	TOYOTA	CAMRY	PRN 036
10	TOYOTA	CAMRY	PRN 026
11	TOYOTA	CAMRY	PRN 042
12	TOYOTA	PICK UP	SR
13	TOYOTA	PICK UP	SR
14	TOYOTA	VDJ	PRN



Observations : Les quatorze (14) véhicules sécurisés ont été mis à la disposition de la présidence, la famille présidentielle, la sécurité rapprochée ainsi que le cabinet de la présidence.

3.4. Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

3.4.1 Fourniture de 32 350 kits des Membres des bureaux de vote + trousse (Elections législative et Présidentielle 1er tour)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 116/CENI/2020
Entreprise (Titulaire du marché)	La Citadelle du Sahel
Localisation	Niamey
Date de visite	15/04/2022
Date d'approbation du contrat	19/02/2021
Date de notification du contrat	16/12/2020
Description sommaire des fournitures	Fourniture de 32 350 kits et trousse pour les membres des bureaux de vote dans le cadre des élections législatives et présidentielle (1er tour)
Montant du marché initial (FCFA)	275 057 492 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	7 jours
Date effective de livraison	23/12/2020 (Bon de Livraison)
Procès-verbal de livraison	23/12/2020
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement effectué (existence de la facture définitive et des ordres de virement datant du 22/02/2021)
Autres commentaires	Aucun

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents contractuels ;
- Existence et conformité de la quantité livrée.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté que les kits et trousse ont réceptionnés dans le délai contractuel.

Nous avons disposé de l'ensemble des documents contractuels y compris les PV de réception et bon de livraison datés et signés.

Les quantités suivantes ont été constatées dans les magasins situés dans l'enceinte de l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) :

Emplacements	Magasin 13	Magasin Pyramide	Total
Kits & Trousse	6 600	2 500	9 100

Un total de 9 100 kits et trousse restant dans les magasins à Niamey sur les 32 350 commandés. Les autres ont été acheminés dans les différents bureaux de vote à l'intérieur du pays.

❖ **Conclusions, recommandations :**

Aucune recommandation particulière ; il faut continuer dans ce sens.

❖ **Quelques images prises lors de la visite terrain :**



Images d'un reliquat du stock et échantillon d'un kit et trousse



*Images des magasins 13 et Pyramide à l'OPVN dans lesquels sont stockés le reliquat les kits et trousse
OPVN, Quartier Lazaret, Niamey*

3.5. Cellule Filets Sociaux (CFS)

3.5.1 Recrutement d'un consultant international pour réviser le questionnaire PMT dans le cadre de la réponse à la COVID-19.

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 141/21/MF/DGCMP/EF/CAB
Entreprise (Titulaire du marché)	Jean-François SMITZ
Localisation	NIAMEY
Date de visite	11/04/2022
Date d'approbation du contrat	08/04/2021
Date de notification du contrat	08/04/2021
Description sommaire de la prestation	Recrutement d'un consultant international pour réviser le questionnaire PMT dans le cadre de la réponse à la COVID-19.
Montant du marché initial (FCFA)	9 483 950 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA)	Pas d'avenant
(Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	Non disponible
Date effective de livraison	Non applicable
Procès-verbal de livraison	Non applicable
Conformité de la quantité livrée	Non applicable
(au cas contraire donner les raisons)	
Evaluation du dépassement de délai	Non applicable
(Donner les raisons si dépassement de délai)	
Imperfections ou défauts constatés	Non applicable
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Aucun paiement n'a été effectué sur la prestation.
Autres commentaires	Le contrat a été résilié à la demande du titulaire du marché afin d'éviter des conflits d'intérêts avec une autre prestation en cours avec la Banque Mondiale.

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

- Néant.

❖ **Conclusions, recommandations :**

- Aucune.

- ❖ Quelques images des travaux ou des équipements : Il s'agit de la preuve de la résiliation du contrat à la demande du titulaire du marché :

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE
CELLULE FILETS SOCIAUX
UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS SOCIAUX
FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS « WADATA TALAKA »

Niamey, le 29 OCT. 2021



B.P: 893- TEL: 20.72.68.31/ 20.35.19.34
E-mail: pfiletsociaux@gmail.com

Le Coordonnateur National Pi

A
Monsieur Marc-François Smitz
Consultant in Development Economics
and Health Economics
Tel : 001 202 640 3798
Email : marcsmitz@yahoo.fr
Washington DC-USA

0 0 0 4 2 7
N° _____ UGT/PFSA/CAB/PM

Objet : Résiliation du contrat N°141/21/MF/DGCMP/EF relatif au recrutement d'un consultant international pour réviser le questionnaire PMT dans le cadre de la réponse à la COVID-19

Ref : V/Courriel du 19/10/2021.

Monsieur le Consultant,

En référence à votre courriel dont copie jointe annonçant la fin du contrat cité en objet pour les raisons que vous avez invoquées dans ledit mail, je vous notifie par la présente que je donne suite à votre requête.

Mes services de passation de marchés, administratifs et financiers restent à votre disposition pour les formalités de cette résiliation.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

PJ :

Mail du 19/10/2021





Laouali Dan Charande Abderhamane <abderhamane1985@gmail.com>

Re: Fin du contrat

4 messages

oumarou amadou <omaramadou2003@yahoo.fr> 29 octobre 2021 à 13:11
 Répondre à : oumarou amadou <omaramadou2003@yahoo.fr>
 À : Moussa Bouda <bmoussa_c@yahoo.fr>, marc smitz <marcsmitz@yahoo.fr>, Laouali Dan Charande Abderhamane <abderhamane1985@gmail.com>
 Cc : Mallam GRAH <malamgrah@yahoo.fr>, Kader Guissa <kaderguissa@yahoo.fr>, Bassirou Karimou <bkarimou2007@yahoo.fr>, HAROUNA MOUMOUNI MOUSSA INFORMATICIEN FILLETS SOCIAUX MOUMOUNI <h.moumouni@gmail.com>

Bonjour Monsieur Marc
 Recevez la lettre de résiliation du contrat
 Sinceres Salutations

M. OUMAROU AMADOU
 GESTIONNAIRE DES SERVICES DE SANTÉ
 MANAGER SPÉCIALISTE EN PASSATION DES MARCHES (Setym International et l'Université du Québec à Montréal)
 Responsable Passation des Marchés
 Projet Filets Sociaux Adaptatifs , Cabinet du Premier Ministre, BP: 893 Niamey Niger
 Tél: Bur: 20 72 68 31/20351934
 Mòb: 96 49 43 71 /90 22 16 30/93 49 43 71/95211426
 Email: omaramadou2003@gmail.com

Le mercredi 27 octobre 2021, 19:48:30 UTC+1, marc smitz <marcsmitz@yahoo.fr> a écrit :

Cher Coordonnateur,

Petit email pour savoir de quoi il en retourne. Je vais commencer mon contrat a la BM tres prochainement. Pourriez vous s'il vous plait terminer mon contrat rapidement?
 Par ailleurs, je comprends le disagreement et je peux aider a la recherche d'un rempalcant, et également superviser le travail pour etre sur que celui ci est fait correctement. Mais de maniere pro-bono ou dans mes nouvelles fonctions depuis la BM.
 Merci d'avance et excellente soiree a toute l'equipe a Niamey,
 Bien a vous,
 Marc

Le mardi 19 octobre 2021, 10:08:59 UTC-4, Moussa Bouda <bmoussa_c@yahoo.fr> a écrit :

Bonsoir Marc

Je me porte très bien! Et de de votre côté? Message bien reçu. Nous reviendrons dès possible.

Cordialement

Moussa BOUDA
 Chevalier dans l'Ordre de Mérite du Niger
 Coordonnateur National UGT Filets Sociaux « Wadata Talaka »
 Cabinet du Premier Ministre

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=833476e1481...>

Le 19 oct. 2021 à 14:20, marc smitz <marcsmitz@yahoo.fr> a écrit :

Cher Coordonnateur,

J'espere que cet email vous trouve a bonne sante. Je vous écris pour vous informer que j'ai obtenu un contrat a duree déterminée a la Banque Mondiale. Je ne puis travailler a la fois pour la Banque et pour le Gouvernement du Niger, car des conflits d'interet pourraient se reveler plus tard.

Aussi je vous demande de me liberer du contrat qui nous lie par rapport a la mise a jour de la formule PMT. Cependant, j'ai executer avec succes la premiere partie du travail et je vous demande de bien vouloir recevoir une facture pour 35% du montant total, comme stipule dans le contrat. Par ailleurs, je vais vous faire le virement lie au paiement de l'enregistrement du contrat des que j'ai recu des instructions par rapport a cela.

Cordiales salutations,
Marc

<Facture Marc Smitz 2021.doc>

 RESILIATION CONTRAT N°141_MF_DGCMP.pdf
1804K

Moussa Bouda <bmoussa_c@yahoo.fr>

29 octobre 2021 à 13:56

À : oumarou amadou <omaramadou2003@yahoo.fr>

Cc : marc smitz <marcsmitz@yahoo.fr>, Laouali Dan Charande Abderhamane <abderhamane1985@gmail.com>, Mallam GRAH <malamgrah@yahoo.fr>, Kader Guissa <kaderguissa@yahoo.fr>, "bkarimou2007@yahoo.fr" <bkarimou2007@yahoo.fr>, HAROUNA MOUMOUNI MOUSSA INFORMATICIEN FILLETS SOCIAUX MOUMOUNI <h.moumouni@gmail.com>

Bonsoir Omar

Il faut vite rattraper. Erreur d'envoi du vrai fichier. Tu as envoyé la lettre de la DGCMP au lieu de la résiliation.

Merci

[Texte des messages précédents masqué]

[Texte des messages précédents masqué]

<RESILIATION CONTRAT N°141_MF_DGCMP.pdf>

oumarou amadou <omaramadou2003@yahoo.fr>

29 octobre 2021 à 14:13

Répondre à : oumarou amadou <omaramadou2003@yahoo.fr>

À : Moussa Bouda <bmoussa_c@yahoo.fr>

Cc : marc smitz <marcsmitz@yahoo.fr>, Laouali Dan Charande Abderhamane <abderhamane1985@gmail.com>, Mallam GRAH <malamgrah@yahoo.fr>, Kader Guissa <kaderguissa@yahoo.fr>, "bkarimou2007@yahoo.fr" <bkarimou2007@yahoo.fr>, HAROUNA MOUMOUNI MOUSSA INFORMATICIEN FILLETS SOCIAUX MOUMOUNI <h.moumouni@gmail.com>

Bonjour

Recevez la bonne lettre avec toutes mes excuses
Sinceres Salutations

M. OUMAROU AMADOU
GESTIONNAIRE DES SERVICES DE SANTÉ
MANAGER SPÉCIALISTE EN PASSATION DES MARCHES (Setym International et
l'Université du Québec à Montréal)
Responsable Passation des Marchés
Projet Filets Sociaux Adaptatifs , Cabinet du Premier Ministre, BP: 893 Niamey Niger
Tél: Bur: 20 72 68 31/20351934
Mob: 96 49 43 71 /90 22 16 30/93 49 43 71/95211426
Email: omaramadou2003@gmail.com

[Texte des messages précédents masqué]

 RESILIATION CONTRAT N°141_MF_DGCMF.pdf
664K

marc smitz <marcsmitz@yahoo.fr>

29 octobre 2021 à 23:11

À : Moussa Bouda <bmoussa_c@yahoo.fr>, oumarou amadou <omaramadou2003@yahoo.fr>
Cc : Laouali Dan Charande Abderhamane <abderhamane1985@gmail.com>, Mallam GRAH <malamgrah@yahoo.fr>, Kader Guissa <kaderguissa@yahoo.fr>, "bkarimou2007@yahoo.fr" <bkarimou2007@yahoo.fr>, HAROUNA MOUMOUNI MOUSSA INFORMATICIEN FILLETS SOCIAUX MOUMOUNI <h.moumouni@gmail.com>

Merci bien M. Amadou,

Le message est bien réceptionné et me couvre par rapport a de potentielles accusations de conflit d'intérêt.

Est-ce que la facture que j'avais jointe au précédent email est conforme et peut donc être réglée? Finalement, reste les frais occasionés lors de l'enregistrement du contrat et qui doivent être a ma charge: Veuillez me précisez le montant et les coordonnees bancaires pour l'envoi. Si vous préférez un remboursement en liquide, il est possible que je puisse aussi arranger cela au cours des prochains mois.

Salutations cordiales et excellent week end a toute l'equipe des PFS.

Marc Smitz

[Texte des messages précédents masqué]

3.6. Commune Rurale de Dan Goulbi (CR/DG)

3.6.1 Réalisation D'une Muni AEP Multi-Villages a Dan Gao dans la commune Rurale de Birnin Lallé, Département de Dakoro, Région de Maradi

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 003/CR/DG/2021
/Entreprise (Titulaire du marché) :	BATHYR SARL
Mission de contrôle :	Cabinet Tech
Localisation :	Birnin Lallé
Date de visite :	30/03/2022
Date d'approbation du contrat	10/01/2021
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	Réalisation D'une Muni AEP Multi-Villages a Dan Gao dans la commune Rurale de Birnin Lallé, Département de Dakoro, Région de Maradi
Montant du marché initial (FCFA)	183 869 750 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	5 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	90%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	6 mois de dépassement.
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	Non
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Oui il y a eu un premier décompte de 113 million
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

En compagnie d'un représentant du cabinet Tech et Maire de Dan Gao, la mission s'est bien déroulée.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A notre visite, les travaux sont toujours en cours.

Nous avons constaté:

- Quelques fissures par endroit sur les bornes fontaines ;
- Certaines tuyauteries sont déterrés et à l'air libre.

❖ Conclusions, recommandations :

La mission s'est bien déroulée ; nous constatons que les travaux sont toujours en cours.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Forage et le groupe électrogène



bornes fontaines



vue du château

3.7. Commune Rurale de Harikanassou (CR/HARIKANASSOU)

3.7.1 Travaux de Traitement de trois points critiques sur l'axe kouringuel-kiota

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 052/MF/EF/CMP/EF/DO/2021
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise GTI
Mission de contrôle :	
Localisation :	Harikanassou
Date de visite :	22/04/2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Travaux de construction Kouringuel-kiota
Montant du marché initial (FCFA)	56 697 775 Fcfa
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	3 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Oui
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	RAS/ travaux sont acceptables
PV de réception (provisoire, finale)	Disponible
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** En compagnie d'un représentant du Mairie de harikanassou nous avons effectué la mission dans des bonnes conditions et toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de notre mission. En plus toutes les documentations ont été mises à notre disposition pour analyse.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

Au terme de notre visite nous avons dressés des constats ainsi qui suivent :

- A notre arrivée les travaux sont terminés et réceptionnés ;
- Les travaux sont exécutés dans les règles de l'art ;
- Aucun problème majeur n'a été constaté sur les ouvrages ;
- L'entreprise a respecté le délai contractuel des travaux.

❖ **Conclusions, recommandations :**

L'audite physique de la commune rurale de harikanassou sur ce marché cité plus a été effectué dans les bonnes conditions et toutes les noms en matières de construction sur les ouvrages ont été respectés.

Ainsi, à l'issu de cette visite nous pouvons dresser des recommandations suivantes :

- Veuillez au respect de suivi de qualité des ouvrages par le service technique ;
- Veuillez au respect du délai contractuel des travaux par les entreprises;
- Veuillez au respect du délai de garantie des travaux.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General des travaux

3.7.2 Travaux de construction du marché à bétail de Niabere Bella dans la commune rurale de Harikanassou

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 08/MF/DGCMP/EF/DO/2021
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Ets Tarik
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Harikanassou
Date de visite :	22/04/2022
Date d'approbation du contrat	06/08/2022
Date de notification du contrat	Aucun
Nature des travaux	Travaux de construction de marché à bétail de Niabere Bella dans la commune rurale de harikanassou
Montant du marché initial (FCFA)	72 345 459 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	RAS /
PV de réception (provisoire, finale)	Oui
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** En compagnie d'un représentant du Mairie de harikanassou nous avons effectué la mission dans des bonnes conditions et toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de notre mission. En plus toutes les documentations ont été mises à notre disposition pour analyse.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

Au terme de notre visite nous avons dressés des constats ainsi qui suivent :

- A notre arrivée les travaux sont terminés et réceptionnés ;
- Les travaux sont exécutés dans les règles de l'art ;
- Nous avons quelques fissures sur le mur de clôture
- Un problème mineur de raccordement sur les ouvrages ;
- Le respect du délai contractuel des travaux par l'entreprise.

❖ **Conclusions, recommandations :**

L'audite physique de la commune rurale de harikanassou sur ce marché cité plus a été effectué dans les bonnes conditions et toutes les normes en matières de construction sur les ouvrages ont été respectés.

Ainsi, à l'issu de cette visite nous pouvons dresser des recommandations suivantes :

- Veuillez au respect de suivi de qualité des ouvrages par le service technique ;
- Veuillez au respect du délai contractuel des travaux par les entreprises;
- Veuillez au respect du délai de garantie des travaux.
- Veuillez à ce que l'entreprise corrige les malfaçons constatées.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General des travaux



Vue de l'enclos
vue des latrines

Vue de panneau de signalisation

Case gardien

3.8. Commune Urbaine de Magaria (CU/Magaria)

3.8.1 Aménagement des Sites maraichers de Hayin Kori, Goumza et Gouzgourou

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 01/2020/CU Magaria
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise Gangara et Frères
Mission de contrôle:	Génie Rural Magaria
Localisation :	Magaria
Date de visite:	23/03/2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Aménagement des Sites maraichers de Hayin Kori, Goumza et Gouzgourou
Montant du marché initial (FCFA)	37 219 207 Fcfa
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux:	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Oui
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Il y a conformité du travail
PV de réception (provisoire, finale)	Disponible
Indication de fraude ou de corruption possible	Non-visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires:	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** En compagnie d'un représentant de l'ARMP et de Génie Rural Magaria, la mission s'est déroulée sans problème.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite nous avons constaté que les travaux sont achevés à 100%.

Mais nous avons constaté quelques imperfections sur les ouvrages :

- Des fissures au niveau du bassin ont entraîné des écoulements d'eau suite aux mauvais raccordements ;
- Des fuites d'eau au niveau de tuyau de forage.

❖ **Conclusions, recommandations:**

La mission s'est bien déroulée et toute la documentation a été mise à notre disposition. A la date de notre visite on a constaté que les travaux sont terminés à 100% et aussi nous avons constaté des imperfections sur les ouvrages.

Nous recommandons à l'AC :

- De veiller à une meilleure exécution des ouvrages :
- De faire corriger les malfaçons constatées.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements**



Vue général des travaux



Vue du forage (fuite)



Mur clôture

3.9. Dispositif National de Préventions et de Gestion des Crises Alimentaires (DNP-GCA)

3.9.1. Fourniture de 2550 tonnes de mil, 1400 tonnes de riz et 525 tonnes de niébé Mil: 600 tonnes Riz: 400 tonnes Niébé: 150 tonnes à livre à Niamey

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	0002/FCD/2021
Entreprise (Titulaire du marché)	ETS ADELTCI BP : 12 897 NIAMEY, NIGER
Localisation	NIAMEY
Dates de visite	05 & 06 AVRIL 2022
Date d'approbation du contrat	19/03/2021
Date de notification du contrat	Non disponible
Description sommaire des fournitures	FOURNITURE DE 2550 TONNES DE MIL, 1400 TONNES DE RIZ ET 525 TONNES DE NIÉBÉ MIL: 600 TONNES RIZ: 400 TONNES NIÉBÉ: 150 TONNES À LIVRE À NIAMEY.
Montant du marché initial (FCFA)	447 500 000 F CFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	PAS D'AVENANT
Délai d'exécution contractuel	7 jours
Date effective de livraison	24/03/2021
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve le 25 mars 2021
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (factures, fiche de mise en paiement, ordres de virement)
Autres commentaires	Aucun

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Le stock des marchandises a été épuisé et par conséquent ne peut pas être vu physiquement. On a constaté que les marchandises ont été réceptionnées à 100% à Niamey et sanctionnées à la livraison par des procès-verbaux. Par ailleurs, il faut noter le respect du délai contractuel des travaux et la disponibilité du procès-verbal de réception.

❖ Conclusions, recommandations :

Aucune recommandation particulière ; il faut continuer dans ce sens

❖ Quelques images des pièces collectées :

OPVN

LIVRE DE STOCKS (en KG)

N° 013001

DIRECTION RÉGIONALE

Maney

CENTRE

Lazaret

PRODUIT

Riz

SPECIFICATIONS

NED Tampon 2021

TYPE DE STOCKS (SNS/RAS)

Norme

MOIS

Mars 2021

Date	Réf	ENTREES					SORTIE								Stock final		
		Achats locaux	Import	Récep. autres	Récep. Intern.	Total entrées	Vente ordin.	V. Prix modéré	Vente spéciale	Distrib. gratuite	Ravit. BC	Expéd. autres	Expéd. interne	Pertes		Total sorties	
	report																
21-03-21	B113258	400 000	/			400 000											400 000
Arrête le présent livre de Stock à quatre cent mille																	
(400 000) Kilogramme au 31-03-2021																	
Bep																	
TOTAUX		400 000				400 000											400 000
Mouvements du Mois																	

OBSERVATIONS

Le Magasinier

Nom Babacar Youmami

Date 31-03-2021

Signature



Mouvements du mois = Totaux - Report

Le Directeur Régional

Nom Ben SB Haiga

Date 31-03-2021

Signature

Handwritten signature of Ben SB Haiga.

Livres de stock à l'OPVN pour les 400 tonnes de Riz

OPVN

LIVRE DE STOCKS (en KG)

N° 013031

DIRECTION RÉGIONALE Niaméy

CENTRE Lagaut

PRODUIT Niébé

SPECIFICATIONS NED Tampon 2021

TYPE DE STOCKS (SNS/RAS)

MOIS Avril 2021

Date	Réf	ENTREES					Vente ordin.	SORTIE							Stock final	
		Achats locaux	Import	Récep. autres	Récep. Intern.	Total entrées		V. Prix modéré	Vente spéciale	Distrib. gratuite	Ravit. BC	Expéd. autres	Expéd. interne	Pertes		Total sorties
	report	150000				150000			20000						20000	130000
15-04-2021	BC 39175								30000						23000	127000
20-04-2021	BC 39175								25000						25500	124500
27-04-2021	BC 39184								10000						35500	114500
1-5	BC 39188								10000						45500	104500
<p>Annule le présent livre de stock ci cent quatre mille cent cent (104500) Kilogramme au 30-04-2021</p> <p style="text-align: right;">Bey</p>																
TOTAUX		150000				150000			45500					45500	15500	104500
Mouvements du Mois																

OBSERVATIONS

Le Magasinier

Nom Frédéric Moumouni

Date 30-04-2021

Signature 

Mouvements du mois = Totaux - Report



Le Directeur Régional

Nom Ben SB Ndongo

Date 30-04-2021

Signature 

Livre de stock à l'OPVN pour les 150 tonnes de Niébé

OPVN

LIVRE DE STOCKS (en KG)

N° 015952

DIRECTION RÉGIONALE

Namery

CENTRE

Loyant

PRODUIT

Mil

SPECIFICATIONS

Stock Tampon 2021

TYPE DE STOCKS (SNS/RAS)

Tampon

MOIS

Mars 2021

Date	Réf	ENTREES					Vente ordm	SORTIE								Stock final	
		Achats locaux	Import	Récep. autres	Récep. Intern.	Total entrées		V. Prix modéré	Vente spéciale	Distrib gratuite	Ravit. BC	Expéd. autres	Expéd. interne	Pertes	Total sorties		
	report																60000
24-03-21	BAP3257 FLS ALBIFL 21	60000				60000											60000
24-03-21	BC 39152									30000							30000
24-03-21	BC 39156									30000							30000
24-03-21	BC 39158									10000							10000
<p>Annule le présent livre de stock à cinq cent quarante mille (540 000) kilogramme au 31-03-2021</p> <p style="text-align: right;">Baf</p>																	
TOTAUX		600000				600000				60000							60000
Mouvements du Mois																	540000

OBSERVATIONS

Le Magasinier

Nom Poubouca Hounoumi

Date 31-03-2021

Signature



Mouvements du mois = Totaux - Report

Le Directeur Régional

Nom Ben SB Nanga

Date 31-03-2021

Signature



Livre de stock à l'OPVN pour les 600 tonnes de Mil

Marché de fourniture de 2550 tonnes de blé, 11000 tonnes de Riz et 525 tonnes de Niébé par Entente Directe.

OPVN BP : 474 NIAMEY Tél : 20 73 44 43	BULLETIN D'AGREAGE DE PAIEMENT Contrat N° 0002/FCP/2021 du 15 Mars 2021	N° 0003258
AGENCE <u>Niamey</u>	CENTRE <u>Lazaret</u>	
PRODUIT <u>Riz</u>	SPECIFICATIONS	
NATURE DU STOCK (SNS,RAS) <u>SNS</u>	REFERENCES FOURNISSEUR <u>ELS ADELTECHI Tel: 97 30 19 35 BP 12837 Niamey-Niger</u>	
DATE DE LIVRAISON <u>24 Mars 2021</u>	NOMBRE DE SACS <u>16000 sacs</u>	
POIDS DE SAC (KG) <u>25 Kgs</u>	POIDS TOTAL (KG) <u>400 000 Kgs</u>	
Prix à la tonne <u>500 000 FCFA</u>	Paiement par le Chef d'Agence	/ /
Valeur totale (FCFA) <u>200 000 000 FCFA</u>	Paiement par le siège	/ /
Observations <u>Deux cent millions francs CFA</u>		
Signatures	Magasinier	Fournisseur

COPIE NON NEGOCIABLE

Marché De fourniture de 2550 tonnes de blé, 11000 tonnes de Riz et 525 tonnes de Niébé par Entente Directe.

OPVN BP : 474 NIAMEY Tél : 20 73 44 43	BULLETIN D'AGREAGE DE PAIEMENT Contrat N° 0002/FCP/2021 du 15 Mars 2021	N° 0003259
AGENCE <u>Niamey</u> <u>Niébé</u>	CENTRE <u>Lazaret</u>	
PRODUIT <u>Niébé</u>	SPECIFICATIONS	
NATURE DU STOCK (SNS,RAS) <u>SNS</u>	REFERENCES FOURNISSEUR <u>ELS ADELTECHI. Tel: 97 30 19 35 BP 12837 Niamey-Niger</u>	
DATE DE LIVRAISON <u>24 Mars 2021</u>	NOMBRE DE SACS <u>3000 sacs</u>	
POIDS DE SAC (KG) <u>50 Kgs</u>	POIDS TOTAL (KG) <u>150 000 Kgs</u>	
Prix à la tonne <u>450 000 FCFA</u>	Paiement par le Chef d'Agence	/ /
Valeur totale (FCFA) <u>67.500 000 FCFA</u>	Paiement par le siège	/ /
Observations <u>Soixante sept millions cinq cent mille francs CFA</u>		
Signatures	Magasinier	Fournisseur

COPIE NON NEGOCIABLE

Exemples de bulletins d'agrèage de paiement (bons d'entrée de stock)

OPVN
BP 474 NIAMEY
Tel. 20.73.44.43

BULLETIN DE CAMIONAGE
N° 2478/CAB/PN/CCA du 03-11-2021

N° 033892

EXPEDITEUR		DESTINATAIRE	
DIRECTION REGIONALE	CENTRE	DIRECTION REGIONALE	CENTRE
Niamey	Lozard	Préfet de Bambarq...	

N° CAMION	PRODUIT	SPECIFICATIONS	Ndre de sacs	POIDS (KG)	SNS /RAS	EMARGEMENT
8F	Riz	NED Tampion 2021	232	25	-	Harouna Hamidou
46						6225034
91		(05,8t)				
RN						
TOTAL DE L'ENVOI			232	5800kg		

DATE D'ENLEVEMENT... 03/11/2021

DISTANCE A PARCOURIR:..... TARIF A LA TONNE.....

Observations:.....

Signature Magasiniers.....

Expéditeur..... Réceptionnaire.....

COPIE NON NEGOCIABLE

OPVN
BP 474 NIAMEY
Tel. 20.73.44.43

BULLETIN DE CAMIONAGE
N° 02138/CAB/PN/CCA du 05 Novembre 2021

N° 033886

EXPEDITEUR		DESTINATAIRE	
DIRECTION REGIONALE	CENTRE	DIRECTION REGIONALE	CENTRE
Niamey	Lozard	Préfet d'Abala	

N° CAMION	PRODUIT	SPECIFICATIONS	Ndre de sacs	POIDS (KG)	SNS /RAS	EMARGEMENT
AS	Riz	NED Tampion 21	372	25	-	Harouna Iwan
43						89080800
05		(24,3t)				
RN						
TOTAL DE L'ENVOI			972	24300kg		

DATE D'ENLEVEMENT... 05/11/2021

DISTANCE A PARCOURIR:..... TARIF A LA TONNE.....

Observations:.....

Signature Magasiniers.....

Expéditeur..... Réceptionnaire.....

COPIE NON NEGOCIABLE

Exemples de bulletins de camionage (bons de sortie de stock)

3.10. DIRECTION REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (DRHA/TI)

3.10.1. Réalisation d'une muni AEP dans le multi-villages a sabon Garin Takoussa dans le département de fillingué Marché N°004/2021/DRHA/MCF-PROSEAHA/-AS (Tranche N°2)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°004/2021/DRHA/MCF-PROSEAHA/-AS (Tranche N°2)
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise SAMI HYDRO COMMERCE
Mission de contrôle :	Cabinet INTECH
Localisation :	Sabon Garin Takoussa
Date de visite :	23/03/2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Réalisation d'une muni AEP dans les multi-villages a sabon Garin Takoussa dans le département de fillingué
Montant du marché initial (FCFA)	192 094 560 Fcfa
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Oui
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	RAS
PV de réception (provisoire, finale)	Disponible
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires:	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** Du fait de non accessibilité de la zone à cause de l'insécurité nous n'avons pas effectué le déplacement sur le terrain mais nous avons fait la revue sur la documentation.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**
Au vu des observations des documentations on nous avons constaté que les travaux sont terminés et réceptionnés.

❖ **Conclusions, recommandations:**

Seule la revue des documentations ont été effectués du fait de manque d'accessibilité de la zone. Au terme les travaux sont terminés et réceptionnés que nous avons constatés dans le procès-verbal de réception.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements**

Pas des images (zone d'insécurité).

3.11. Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Zinder (DRHA/ZR)

3.11.1 Travaux de réalisation de la mini AEP multivillages de Bourbourwa dans la commune de Dakoussa/departement de Takeita

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	Marché N°07/21/MCF/DRH/A/ZR
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE SAHEL HYDRAULIQUE
Mission de contrôle :	CETIC
Localisation :	ZINDER
Date de visite :	21/03/2022
Date d'approbation du contrat	12/02/2021
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Travaux de réalisation de la mini AEP multivillages de Bourbourwa dans la commune de Dakoussa/département de Takeita
Montant du marché initial (FCFA)	427 561 050 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	0 FCFA
Délai d'exécution contractuel	6 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	
PV de réception (provisoire, finale)	14/01/2022
Indication de fraude ou de corruption possible	RAS
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	RAS
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission:

La mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A notre visite, les travaux sont terminés et réceptionnés. De manière générale, les travaux sont réalisés dans les règles de l'art mais on a constaté des fuites d'eau sur les réseaux de distribution dues à la pression d'eau sur les conduites.

❖ Conclusions, recommandations :

La mission s'est bien déroulée ; nous avons constaté physiquement que les travaux sont terminés et réceptionnés à notre visite.

Néanmoins, nous avons constaté des fuites d'eau dans les conduites dues à la pression qui entraînent des coûts d'entretien des conduites.

Ainsi nous recommandons à l'AC de :

- Veiller aux respects des normes en matière de construction des ouvrages en tenant compte des pressions d'eau ou le débit ;
- Veiller à l'exécution des ouvrages de bonne qualité ;
- Veiller à ce que l'entreprise change les conduites du réseau de distribution pour pouvoir s'adapter au débit du forage.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :

Vue General des travaux AEP multivillages Bourbuwa



Panneau solaires et groupe électrogènes

château

bornes fontaines

3.12. Direction Régionale de la Santé Publique de la Région de Tillabéri (DRSP/TI)

3.12.1 Réhabilitation et construction d'infrastructures sanitaires pour la transformation du CSI type 1 en CSI type 2 de Koné Béri, District de Kollo, région de Tillabéri

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	AON N°001/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	EMSA
Mission de contrôle :	AUCUN
Localisation :	TILLABERY
Date de visite :	VENDREDI 23 AVRIL 2021
Date d'approbation du contrat	AUCUN
Date de notification du contrat	AUCUN
Nature des travaux	Réhabilitation et construction d'infrastructures sanitaires pour la transformation du CSI type 1 en CSI type 2 de Koné Béri, District de Kollo, région de Tillabéri.
Montant du marché initial (FCFA)	269 196 491 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	NEANT
Délai d'exécution contractuel	3 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Aucun
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	Travaux en cours
Conformité des travaux :	OUI
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	NON
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	NON
PV de réception (provisoire, finale)	NON
Indication de fraude ou de corruption possible	NON
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** La mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ **Observation sur la qualité des travaux ou des équipements**

A la date de notre visite les travaux sont toujours en cours.

Ainsi au terme de notre mission nous avons fait des constats suivants :

- Les travaux sont en cours ;
- Les travaux sont en train d'être exécuté dans les règles de l'art.
- Certains ouvrages sont au stade de finition ;

❖ **Quelques images**



Vue Générale des travaux

3.13. École Nationale d'Administration (ENA)

3.13.1 CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE BATIMENTS AUX PROFITS DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°001/ENA/DG
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE SADDI IBRAHIMA
Mission de contrôle :	
Localisation :	NIAMEY
Date de visite :	21/03/2022
Date d'approbation du contrat	02/06/2021
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS AU PROFIT DE L'ENA
Montant du marché initial (FCFA)	1 097 135 199 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	180 jours
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	82%
Conformité des travaux :	Respectée
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	RAS
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission:** la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :** A la date de notre visite, les travaux sont en cours et se déroulent dans le respect des règles de l'art.

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée et les travaux sont en cours et sont exécutés dans les respects des règles de l'art. Ainsi nous recommandons à l'AC de :

- Veuillez au respect des normes en vigueur ;
- Veuillez au respect du délai contractuel
- Veuillez à l'exécution pour aboutir à des ouvrages de qualités.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements :**



VUE GENERAL DES TRAVAUX



VUE INTERIEUR DU BATIMENT

3.14. Fonds Commun d'Appui à la Mise en Œuvre du Plan de Développement Sanitaire

3.14.1. Acquisition d'une Central d'Oxygène au profit de la DRSP de Tahaoua

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°0072/21/DGCMP/EF
Enterprise (Titulaire du Marché)	Ets Benco T rading
Localisation	Tahaoua
Date de visite	04/04/2022
Date approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Description sommaire des fournitures	Acquisition d'une Centrale d'Oxygène au Profit de la DRSP
Montant du marché initial (FCFA)	128 520 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	
Date effective de livraison	13 JUIN 2021
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Stratégie et budget d'entretien	
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement. factures)
Autres commentaires	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

La mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ **Observation sur la qualité des travaux ou des équipements**

A la date de notre visite, nous avons constaté que les équipements ont été fournis et réceptionnés conformément à la commande.

❖ **Quelques images des travaux:**



Vue Générale de la centrale d'oxygène

3.15. Hôpital de Reference de Maradi (HRM)

3.15.1 Acquisition d'une Ambulance Toyota land Cruiser de type 200

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°002/2021/ED/HRM
Enterprise (Titulaire du Marché)	Ets Benco Trading
Localisation	Maradi
Date de visite	31/03/22
Date approbation du contrat	08/03/21
Date de notification du contrat	23/02/21
Description sommaire des fournitures	Acquisition d'une Ambulance Toyota Land Cruiser de Type 200
Montant du marché initial (FCFA)	84 607 810 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	60 jours
Date effective de livraison	
Procès-verbal de livraison	OUI
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Stratégie et budget d'entretien	
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement. factures)
Autres commentaires	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

En compagnie d'un représentant de l'ARMP et de Directeur Adjoint de HRM, la mission s'est bien déroulée et toutes les documentations ont été mises à notre disposition.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite, l'ambulance a été livrée et réceptionnée conformément à la commande. Aucun problème n'a été constaté.

❖ **Conclusions, recommandations :**

Le véhicule a été bien réceptionné conformément au marché et le délai de livraison a été respecté.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements**



Vue General Ambulance



intérieur



Vue intérieur



Vue intérieur

3.16. Ministère de la Défense Nationale (MDN)

3.16.1 Acquisition d'un avion de transport de type KING AIR BEECHRAFT 350, au profit du MDN

3.16.2 Acquisition de cent (100) véhicules (KIA 450) de transport de troupe au profit du MDN

3.16.3 Travaux de construction des infrastructures des unités de GARSI Sahel à Tamou (Say) au profit de la gendarmerie nationale

MARCHES DE FOURNITURE

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	495/21/MF/DGCMP/OB	0099/2020/MF/DGCMP/EF	N°885/21/MF/DGCMP/OB
Entreprise (Titulaire du marché)	La Nigérienne de l'Automobile	Khalif Sécurité Sarlu	Entreprise Gobir Bati
Localisation	Niamey	Niamey	Tamou
Date de visite	04/04/2022	04/04/2022	20/04/2022
Date d'approbation du contrat	07/09/2021	Marché non daté	
Date de notification du contrat	21/06/2021	04/12/2020	
Description sommaire des fournitures	Acquisition de 100 véhicules de transport de troupe KIA KM450 DIESEL 3.9 L ; 4 cylindres	Acquisition d'un avion de transport de type KING AIR BEECHRAFT 350, au profit du MDN	Travaux de construction des infrastructures des unités de GARSI SAHEL a Tamou (say) au profit de la Gendermerie National
Montant du marché initial (FCFA)	7 950 000 000	2 700 176 157	1 047 054 479 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA)	Pas d'avenant	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Donner les raisons des avenants	Non applicable	Non applicable	
Délai d'exécution contractuel	06 mois	03 mois	
Date effective de livraison	Livraison non encore effectuée ; des retards accusés au niveau de l'usine de production en Corée du Sud.	Livraison non effectuée ; marché résilié par la lettre n°0242/MDN/SG/DMP/DSP du 17/01/2022	Oui
Procès-verbal de livraison	Livraison non encore effectuée	Non applicable	Effectué
Conformité de la quantité livrée	Livraison non encore effectuée	Non applicable	RAS
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Livraison non encore effectuée	Non applicable	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (donner les raisons si dépassement de délai)	Livraison non encore effectuée	Livraison non effectuée ; marché résilié par la lettre n°0242/MDN/SG/DMP/DSP du 17/01/2022	

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Imperfections ou défauts constatés	Livraison non encore effectuée	Non applicable	RAS
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Livraison non encore effectuée	Non applicable	Aucun
Autres commentaires	Aucun	Aucun	Aucun

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents contractuels.
- Du fait de non accessibilité de la zone à cause de l'insécurité nous n'avons pas effectué le déplacement sur le terrain mais nous avons fait la revue sur la documentation pour le marché de Travaux de construction des infrastructures des unités de GARSI Sahel à Tamou (Say) au profit de la gendarmerie nationale

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

- Pour le marché N°495/21/MF/DGCMP/OB : La livraison n'a pas été encore effectuée en raison de retards accusés au niveau de l'usine de production de KIA en Corée du Sud.
- Pour le marché N°0099/2020/MF/DGCMP/EF : La livraison pas été effectuée en raison de la résiliation du contrat par la lettre n°0242/MDN/SG/DMP/DSP du 17/01/2022 mettant en avant le non-respect du délai contractuel de six (6) mois.
- Pour le marché N°885/21/MF/DGCMP/OB : Au vu des observations des documentations on nous avons constaté que les travaux sont terminés et réceptionnés.

❖ **Conclusions, recommandations :**

- Dans le cas du marché N°495/21/MF/DGCMP/OB relatif à l'acquisition de 100 véhicules de transport de troupes, il faut donner un délai contractuel raisonnable.
- Pour le marché N°0099/2020/MF/DGCMP/EF, nous n'avons aucune recommandation particulière ; il faut continuer dans ce sens.
- Pour le marché N°885/21/MF/DGCMP/OB seule la revue des documentations ont été effectués du fait de manque d'accessibilité de la zone. Au terme les travaux sont terminés et réceptionnés.

❖ **Quelques images des preuves collectées (pour le marché N°0099/2020/MF/DGCMP/OB) :**

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès



MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL //
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

4460

N° _____ /MDN/SG/DMP/DSP

Niamey, le 11 OCT 2021

Le Ministre

à

Monsieur, le Directeur
Général des Ets KHALIF
SECURITY

Objet : Mise en demeure pour non livraison d'un (01) avion de transport de type King Air Beechraft 350

En dépit de l'approbation du **marché N°0099/2020/MF/DGCMP/EF** pour l'Acquisition d'un (01) avion de transport de type King Air Beechraft 350 au profit du Ministère de la Défense Nationale, je constate qu'à la date d'aujourd'hui que livraison n'a pas été faite de votre part.

Dans ces conditions, je vous mets en demeure de livraison dès réception de la présente lettre et sous délai de quinze (15) jours.

Sans une action adaptée de votre part dans le délai indiqué, je saisisrai qui de droit afin de vous appliquer les dispositions du **DECRET N°2013-570/PRN/PM du 20 décembre 2013** à son article n° 53 qui stipule : « **En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable ; ces pénalités sont prévues dans le contrat du marché. Elles ne peuvent excéder dix pour cent (10%) du montant global du marché** ».

Je vous saurais gré des dispositions utiles que vous voudriez faire prendre à cet effet.

Ampliations :

- PM
- CEMA
- CEMAA



REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail – Progrès



MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

Niamey, le 13 DEC 2021

Le Ministre

à

Monsieur, le Directeur
Général de la Société
KHALIF SECURITY

N° 5950 /MDN/SG/DMP/DSP

Objet : Deuxième mise en demeure pour non livraison d'un (01) avion de transport de type King Air BEECHRAFT-350.

Réf :

- V/L N° (sans) du 21 octobre 2020 ;
- V/L N° (sans) du 04 octobre 2021 ;
- Lettre N°4460/MDN/SG/DMP/DSP du 11 octobre 2021 ;
- V/L N° (sans) du 02 novembre 2021 ;
- Lettre N° 0236/EMAA/CAB du 24 novembre 2021 ;
- Lettre N° 00002481 du 30 novembre 2021.

En dépit de la première lettre de mise en demeure citée en référence pour le **marché N°0090/2020/MF/DGCMP/EF** relatif à l'Acquisition d'un (01) avion de transport de type **King Air Beechcraft-350** au profit du Ministère de la Défense Nationale, je constate qu'à la date d'aujourd'hui que la livraison n'a pas encore été faite de votre part. Et par votre lettre du 02 novembre 2021, vous me sollicitez un choix rapide dû à la forte attractivité du marché, et vous nous rassurez que votre société soit dans la capacité de nous livrer dans les plus brefs délais l'aéronef choisi. Faisant suite à vos propositions, l'Etat-major des Armées communique les options retenues par l'Armée de l'Air, par ordre de préférence :

- **Option 1 :** 2011 Beechcraft King Air 350i-FL-782 ;
- **Option 2 :** 2015 Beechcraft King Air 350i.

Toutefois, l'aéronef de l'option retenue doit être soumis à une inspection technique de validation conformément à l'article N° 7 du marché initial. Dans ces conditions, je vous mets en demeure de livraison dès réception de la présente lettre et sous délai de **quinze (15) Jours**. Sans une action adaptée de votre part dans le délai indiqué, je saisirai qui de droit afin de prononcer la résiliation dudit marché et la restitution de l'avance de démarrage dûment perçue par votre société.

Je vous saurais gré des dispositions utiles que vous voudriez faire prendre à cet effet.

Ampliations :

- CEMA
- CEMAA

Alkassoum INDATTOU





MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE,
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

0242

N° _____ /MDN/SG/DMP/DSP

LE MINISTRE

à

Monsieur, le Directeur
Général de la Société KHALIF
SECURITY

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Résiliation du marché N°0090/2020/MF/DGCMP/EF relatif à
l'Acquisition d'un (01) avion de transport de type King Air Beechcraft-350 au
profit du Ministère de la Défense Nationale.

Monsieur,

Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin au contrat du
marché N°0090/2020/MF/DGCMP/EF comme m'y autorise les articles 53-54-55
du Décret N°2013/570/PRN/PM du 20 décembre 2013 portant modalités de
travaux, d'équipements, de fournitures et de services concernant les besoins
de défense et de sécurité nationales.

Compte tenu de l'incapacité de votre société à nous livrer dans le délai
requis l'avion choisi et après deux (2) mises en demeure préalables, ledit
contrat prendra fin sous **15 jours** maximum après la réception du présent
courrier par vos services.

Sans une action adaptée de votre part dans le délai indiqué, je saisirai qui de
droit afin de restituer l'avance de démarrage dûment perçue par votre
société, d'un montant équivalent à 30% du montant du marché qui est arrêté
à la somme de : **deux milliards sept cent millions cent soixante-seize mille
cent cinquante-sept (2 700 176 157) Francs CFA/HT/HD.**

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées.

Ampliation :

- PM
- CEMA
- CEMAA



3.17. Ministère de l'Urbanisme et de Logement (M/ULA)

3.17.1 Travaux de construction de la Tribune de Diffa (Travaux complémentaires)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 077/2020/DN/MUDL/SG/DGAC/DMP-DSP
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise COMWEAVER
Mission de contrôle :	AAI
Localisation :	Diffa
Date de visite :	25/03/2022
Date d'approbation du contrat	01 Avril 2021
Date de notification du contrat	08/09/2022
Nature des travaux	Travaux de construction de la tribune de Diffa (Travaux Complémentaires).
Montant du marché initial (FCFA)	249 478 454
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	6 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Non conforme
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont réceptionnés à la date du 29/06/2021
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** En compagnie d'un représentant de l'ARMP et du DRULA/Diffa nous avons visités les différents ouvrages sans aucun problème. Ainsi, toutes les documentations nécessaires ont été mises à notre disposition.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite les travaux sont réceptionnés le 29/06/2022 et sont exécutés dans les respects des règles de l'art.

❖ **Conclusions, recommandations:**

La mission s'est bien déroulé et les travaux sont exécutés à 100% et réceptionnés conformément au marché et dans le respect des normes.

Ainsi, nous recommandons à l'AC de continuer dans le même sens afin de veuillez à l'exécution des ouvrages de qualité.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements**



Vue latérale de la tribune



Vue en face de la Tribune

3.17.2 Travaux complémentaires de construction d'une aérogare et salon d'honneur à Diffa (construction de la tour de contrôle)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°079/2020/DN/MULDL/SG/DGAC/DMP-DSP
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise Kakarba Service
Mission de contrôle :	AAI
Localisation :	Diffa
Date de visite :	25/03/2022
Date d'approbation du contrat	26 Aout 2022
Date de notification du contrat	08/09/2022
Nature des travaux	Travaux Complémentaires de construction d'un aérogares et salon d'honneur à Diffa (Construction de la tour de Contrôle)
Montant du marché initial (FCFA)	871 477 343
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	12 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	20%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	RAS
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non-visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** En compagnie d'un représentant de l'ARMP et du DRULA/Diffa nous avons visités les différents ouvrages sans aucun problème. Ainsi, toutes la documentation nécessaire a été mise à notre disposition.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite des travaux nous avons constaté que ces derniers sont en cours à un taux d'exécution de 20%. Mais les travaux sont en train d'être exécutés dans le respect des règles de l'art.

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée et nous avons constaté à notre visite que les travaux sont en cours et dans le delai à un taux global d'avancement de 20%. Mais l'AC nous a signalé qu'il a été observé un retard pour la remise du site et qui a occasionné un retard de deux (02) mois.

Nous recommandons à l'AC de :

- Veuillez au respect des normes en matière de construction
- Veuillez au respect du délai contractuel par l'entreprise.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements**



Vue des matériaux de coffrages



vue générale du chantier en cours

3.18. Ministère de l'Education Nationale (MEN)

3.18.1 Acquisition de manuels scolaires de français et mathématiques pour les classes de 6ème, Edition Hachette

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	RM N°491/21/MF/DGCMP/OB
Entreprise (Titulaire du marché)	HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL, Paris France
Localisation	NIAMEY
Date de visite	06/04/2022
Date d'approbation du contrat	03/09/2021
Date de notification du contrat	06/09/2021
Description sommaire des fournitures	Acquisition de manuels scolaires de français et mathématiques pour les classes de 6ème, Edition Hachette
Montant du marché initial (FCFA)	699 996 328 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA)	Pas d'avenant
(Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	5 mois
Date effective de livraison	05/02/2022
Procès-verbal de livraison	Bon de livraison du 05/02/2022, conforme aux quantités contractuelles avec des surplus de 97 livres de Français et 427 livres de mathématiques
Conformité de la quantité livrée	Oui la quantité livrée est conforme à la quantité contractuelle et comporte même des surplus de 97 livres de français et 427 livres de mathématiques
(au cas contraire donner les raisons)	
Evaluation du dépassement de délai	Délai respecté
(Donner les raisons si dépassement de délai)	
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a été intégralement payé par mandatement
Autres commentaires	Aucun

3.18.2 Travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les régions d'Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder (lot 5 : région de Niamey)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	663/21/MF/DGCMP/OB
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE ECOMEF
Mission de contrôle :	
Localisation :	NIAMEY
Date de visite :	04 AVRIL 2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES RÉGIONS D'AGADEZ, DIFFA, DOSSO, MARADI, NIAMEY, TAHOUA, TILLABÉRI ET ZINDER (LOT 5 : RÉGION DE NIAMEY)
Montant du marché initial (FCFA)	169 356 182 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	5 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	20%
Conformité des travaux :	
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	RAS
PV de réception (provisoire, finale)	Travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	RAS
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

Nous avons constaté que les fournitures scolaires ont été réceptionnées dans le délai contractuel.

Nous avons également constaté l'existence matérielle des fournitures sanctionnées par un bon de livraison daté et signé. Par ailleurs, le titulaire du marché a offert des surplus de 97 livres de français et 427 livres de mathématiques

En ce qui concerne le marché de construction, à la date de notre visite les travaux sont en cours, le taux globale d'avancement est environ 20%.

On a constaté lors de visite certains ouvrages sont aux niveaux suivants :

- Linteau
- Fin de l'élévation
- D'autres au niveau de fondations


❖ **Conclusions, recommandations :**

Le Ministère de l'Education Nationale (MEN) dispose d'une qualité dans l'exécution de ses marchés.
Il faut continuer dans ce sens.

En fin, s'agissant des travaux de construction, nous recommandons au Ministère de l'Education Nationale (MEN) de :

- Veuillez au respect des normes en vigueur ;
- Veuillez au respect du délai par l'entreprise ;
- Veuillez au respect de l'exécution des ouvrages de qualités.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements :**



Images du magasin du Lycée KOROMBE à Niamey contenant de stock des livres



VUE GENERAL DES TRAVAUX (niveau linteau)



Elévation (niveau linteau)

3.19. Ministère des Enseignements Supérieurs de La Recherche et de l'Innovation (MES/RI)

3.19.1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN AMPHITHÉÂTRE 1000 PLACES À LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (FLSH)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	010/2021/MESR/SG/DMP/DSP
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE ALPHA OUMAROU ET FILS
Mission de contrôle :	
Localisation :	FAC DE LETTRES UAM NIAMEY
Date de visite :	05 AVRIL 2022
Date d'approbation du contrat	23/11/2022
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN AMPHITHÉÂTRE 1000 PLACES À LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES
Montant du marché initial (FCFA)	1 059 127 226 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	EN COURS DE PROPOSITION
Délai d'exécution contractuel	8 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	55%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	RAS
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	CONFORME
PV de réception (provisoire, finale)	Travaux en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	RAS
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission:** la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :** A la date de notre visite, les travaux sont en cours et toutes les normes sont respectées. Le taux global d'avancement est de 55%.

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée et toutes les documentations sont mises à notre disposition pour analyse. A la date de notre visite les travaux sont en cours.

Nous recommandons à l'AC :

- De veillez au respect des normes en matières de constructions ;
- De veillez au respect du délai des travaux par l'entreprise ;
- Veuillez au respect de l'exécution des qualités des ouvrages.

❖ **Quelques images des travaux ou des équipements :**



VUE 3D Plan architecturaux

Vue General des travaux



TRAVAUX EN COURS

3.20. Ministère des Finances (MF)

3.20.1 Acquisition de 35 véhicules Pick-up simple cabine 4x4 V6 adapté aux terrains difficiles moteur essence 4.2 I V6 minimum au profit de la Direction Générale des Douanes
3.20.2 Acquisition de trente-cinq (35) véhicules Toyota pick-up Land Cruiser au profit de la DGD

MARCHES DE FOURNITURE

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°117/21/MF/DGCMP/EF	N°118/21/MF/DGCMP/EF
Entreprise (Titulaire du marché)	ETS IDI TAMBARI IBRAHIM	UNION AUTOMOBILE
Localisation	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	04/04/2022	04/04/2021
Date d'approbation du contrat	31/03/2021	31/03/2021
Date de notification du contrat	29/03/2021	29/03/2021
Description sommaire des fournitures	Acquisition de 35 véhicules Pick-up simple cabine 4x4 V6 adapté aux terrains difficiles moteur essence 4.2 I V6 minimum au profit de la Direction Générale des Douanes	Acquisition de trente cinq (35) véhicules Toyota pick-up Land Cruiser au profit de la DGD
Montant du marché initial (FCFA)	962 500 000 FCFA	962 500 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	45 jours	45 jours
Date effective de livraison	Non disponible	Non disponible
Procès-verbal de livraison	Non disponible	Non disponible
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Non applicable en l'absence des bons de livraison et PV de réception.	Non applicable en l'absence des bons de livraison et PV de réception.
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Absence des preuves de paiement	Absence des preuves de paiement
Autres commentaires	Aucun	Aucun

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission ;
- Disponibilité de certains documents contractuels ;
- Disponibilité des responsables et acteurs concernés.

❖ Observations sur la qualité des matériels roulants acquis :

Pour les 02 marchés (117/21/MF/DGCMP/EF et N°118/21/MF/DGCMP/EF), nous avons constaté l'existence physique ainsi que la conformité des matériels roulants. Par ailleurs, tous les matériels ont été réceptionnés à 100% à Niamey mais nous n'avons pas disposé des bons de livraison et PV de réception.

❖ Conclusions, recommandations :

Joindre les éléments manquants tels que les bons de livraison, PV de réception ainsi que les preuves de paiement de chaque marché exécuté au lot des documents contractuels.

❖ Quelques images des matériels roulants acquis :



Images des TOYOTA PICK-UP DN 502 & DN 570 stationnées à DGD, Zone Industrielle, Niamey



Images des TOYOTA PICK-UP DN 538 & DN 539 stationnées à Brigade de Niamey, Rive Droite

Répartition des Matériels Roulants acquis via le Marché N°117/21/MF/DGCMPEF

REPUBLIQUE DU NIGER

Niamey, le 04 Avril 2022

Fraternité – Travail – Progrès

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

Direction des Ressources Financières
Et de la Logistique

DOTATION DE VEHICULE 2021 (lot N° 1 DE 35 VEHICULES TOYOTA)

N° Ordre	DATES	N° Châssis	N° Immatriculation	SERVICES BENEFICIAIRES
1	19/07/2021	JTELU71J00B040015	DN 495	Bureau Agadez
2	19/07/2021	JTELU71J80B037783	DN 496	Bureau Agadez
3	19/07/2021	JTELU71J80B038500	DN 497	Bureau Arlit
4	19/07/2021	JTELU71J00B038166	DN 498	Bureau Arlit
5	19/07/2021	JTELU71J30B039988	DN 499	Bureau Mallaoua
6	19/07/2021	JTELU71J20B038153	DN 500	Bureau Matameye
7	19/07/2021	JTELU71J80B032812	DN501	Bureau S.Broum
8	19/07/2021	JTELU71J90B038490	DN 502	Parck Auto DGD
9	19/07/2021	JTELU71J80B035158	DN 503	Bureau Konni
10	19/07/2021	JTELU71J10B039715	DN 504	Bureau Mainé-Soroa
11	19/07/2021	JTELU71J50B038048	DN 505	Bureau N'Guigmi
12	19/07/2021	JTELU71J20B039609	DN 506	Bureau Cheri
13	19/07/2021	JTELU71JX0B035310	DN 507	Bureau Boumba
14	19/07/2021	JTELU71J20B039481	DN 508	Bureau Djoundjou
15	19/07/2021	JTELU71J40B035304	DN 509	Bureau Dolé
16	19/07/2021	JTELU71J30B037657	DN 510	Bureau Doumega
17	19/07/2021	JTELU71J40B038381	DN 511	Bureau Doutchi
18	19/07/2021	JTELU71J30B037545	DN 512	Bureau Dan Issa
19	19/07/2021	JTELU71J70B039847	DN 513	Bureau Tounga-Djado
20	19/07/2021	JTELU71J60B039726	DN 514	Bureau Gazaoua
21	19/07/2021	JTELU71J60B035143	DN 515	Bureau Guidan-Roundji

22	19/07/2021	JTELU71J40B037814	DN 516	Bureau Korgom
23	19/07/2021	JTELU71J00B037664	DN 517	Madarounfa
24	19/07/2021	JTELU71J40B038252	DN 518	Bureau Ayorou
25	19/07/2021	JTELU71J80B032826	DN 519	Bureau Banibangou
26	19/07/2021	JTELU71J50B033044	DN 520	Bureau Tera
27	19/07/2021	JTELU71J80B033099	DN 521	Bureau Torodi
28	19/07/2021	JTELU71J70B033031	DN 522	Bureau Abalak
29	19/07/2021	JTELU71J60B032680	DN 523	Bureau Bangui
30	19/07/2021	JTELU71J80B033183	DN 524	Bureau Konni
31	19/07/2021	JTELU71J60B033084	DN 525	Bureau Galmi
32	19/07/2021	JTELU71J80B032809	DN 526	Bureau Doungass
33	19/07/2021	JTELU71J80B032907	DN 527	Bureau Gamdou
34	19/07/2021	JTELU71J00B033078	DN 528	Bureau Kalgueri
35	19/07/2021	JTELU71J10B032635	DN 529	Bureau Magaria


Le Chef Service Matériel
Mahamadou Saini Amadou
Inspecteur Central des Douanes

Répartition des Matériels Roulants acquis via le Marché N°118/21/MF/DGCMP/EF

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

Direction des Ressources Financières
Et de la Logistique

DOTATION DE VEHICULE 2021 (lot N° 2 DE 35 VEHICULES TOYOTA)

	DATES	N° Immatriculation	SERVICES BENEFICIAIRES
1	13/10/2021	DN 536	Bir Maradi
2	13/10/2021	DN 537	Bir Maradi
3	13/10/2021	DN 538	Bir Niamey
4	13/10/2021	DN 539	Bir Niamey
5	13/10/2021	DN 540	Bir Dosso
6	13/10/2021	DN 541	Bir Dosso
7	13/10/2021	DN 542	Bir Tillaberi
8	13/10/2021	DN 543	Bir Tillaberi
9	13/10/2021	DN 544	Bir Tahoua
10	13/10/2021	DN 545	Bir Tahoua
11	13/10/2021	DN 546	Bir Agadez
12	13/10/2021	DN 547	Bir Agadez
13	13/10/2021	DN 548	Bir Diffa
14	13/10/2021	DN 549	Bir Diffa
15	13/10/2021	DN 550	Bir Zinder
16	13/10/2021	DN 551	Bir Zinder
17	13/10/2021	DN 552	Bir Madaou
18	13/10/2021	DN 553	Bir Madaou
19	13/10/2021	DN 554	Bir Gaya
20	13/10/2021	DN 555	Bir Gaya
21	13/10/2021	DN 556	Div-Cos

22	13/10/2021	DN 557	Div-Cos
23	13/10/2021	DN 558	Div-Cos
24	13/10/2021	DN 559	Div-Cos
25	13/10/2021	DN 560	Div-Cos
26	13/10/2021	DN 561	Bureau BSMT
27	13/10/2021	DN 562	Bureau BSMT
28	13/10/2021	DN 563	Bureau BSMT
29	13/10/2021	DN 564	Div-Cos
30	13/10/2021	DN 565	Bir Maradi
31	13/10/2021	DN 566	DR Ny-Tillaeri
32	13/10/2021	DN 567	Bir Zinder
33	13/10/2021	DN 568	Bir Agadez
34	13/10/2021	DN 569	Bureau Maradi
35	13/10/2021	DN 570	Parck Auto DGD



Le Chef Service Matériel
Mahamadou Seini Amadou
Inspecteur Central Des Douanes

3.21. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA)

3.21.1 Travaux de réalisation d'une adduction d'eau potable multi-villages dans le village Centre de Kossa dans la commune rurale de Badaguichiri, dans la région de Tahoua

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°340/21/MF/DGIMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise DIDI GLOBAL/BTP/H
Mission de contrôle :	Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Localisation :	Beidi et Kossa
Date de visite :	02/04/2022
Date d'approbation du contrat	11/06/2021
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	TRAVAUX DE REALISATION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE MULTI-VILLAGES DANS LE VILLAGE CENTRE DE BEIDI DANS LA COMMUNE URBAINE D'ILLELA, REGION DE TAHAOUA lot1 ET
Montant du marché initial (FCFA)	1 120 251 720
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	RAS
Délai d'exécution contractuel	8 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	3 mois
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Non conforme
PV de réception (provisoire, finale)	Pas encore
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

3.21.2 Travaux de réalisation d'une adduction d'eau potable multi-villages dans le village Centre de Beidi dans la commune urbaine d'Illela, dans la région de Tahoua

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 338/21/MF/DGIMP/EF ET N°340/21/MF/DGIMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise DIDI GLOBAL/BTP/H
Mission de contrôle :	Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Localisation :	Beidi /ILLELA
Date de visite :	02/04/2022
Date d'approbation du contrat	11/06/2021
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	TRAVAUX DE REALISATION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE MULTI-VILLAGES DANS LE VILLAGE CENTRE DE KOSSA DANS LA COMMUNE RURALE DE BADAGUICHIRI, REGION DE TAHAOUA
Montant du marché initial (FCFA)	1 124 691 015
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	
Délai d'exécution contractuel	8 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de reunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	60%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	3 mois
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Non conforme
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

En compagnie d'un représentant de l'ARMP et de DRHA/TA, la mission s'est bien déroulée et les documentations ont été mises à notre disposition.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite, les travaux sont en cours à un taux global d'avancement respectif de 100% et 60% mais aucune réception n'a été prononcée.

Nous avons constaté quelques imperfections :

- Des fissures au niveau des bornes fontaines.
- Les travaux sont aux ralentis à un rythme non satisfaisant.

❖ **Conclusions, recommandations:**

La mission s'est bien déroulée et toutes les documentations ont été mises à notre disposition, à la date de notre visite les travaux sont toujours en cours. Les taux globaux d'avancements de deux marchés respectifs sont de 100% et 60%.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



VUE DU CHATEAU village BEIDI

ELECTROGENE BEIDI

VUE DU FORAGE ET GROUPE



BORNE FONTAINE BEIDI

BEIDI

GROUPE ELECTROGENE



VUE DU CHATEAU VILLAGE DE KOSSA

BORNES FONTAINES

3.22. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses (MI/SP/D/ACR)

3.22.1 Fourniture de quarante un (41) véhicules Toyota Pick-up mono cabine au profit des forces et dépenses et de la sécurité nationale **MARCHE DE TRAVAUX : CONTRAT N°18/SACM/SG/20 Fabrication** de poteaux en béton armé à l'usine de Niamey (Goude)

3.22.2 Fourniture de 42 véhicules Toyota Pick Up au profit des Forces de Défenses et de Sécurité Nationales
MARCHES DE FOURNITURE

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	MARCHE N°854/21/MF/DGCMP/OB	MARCHE N°499/21/MF/DGCMP/OB
Entreprise (Titulaire du marché)	KATANGA AUTOMOBILES S.A.	ETS MANOMI SAYABOU
Localisation	NIAMEY	NIAMEY
Date de visite	Les 01 et 05/04/2022	Les 01 et 05/04/2022
Date d'approbation du contrat	07/12/2021	07/09/2021
Date de notification du contrat	16/12/2021	11/09/2021
Description sommaire des véhicules	Fourniture de quarante un (41) véhicules Toyota Pick-up mono cabine au profit des forces et dépenses et de la sécurité nationale	Fourniture de 42 véhicules Toyota Pick Up au profit des Forces de Défenses et de Sécurité Nationales
Montant du marché initial (FCFA)	1 148 000 000 FCFA	1 176 000 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	Immédiatement après approbation	Dix (10) jours
Date effective de livraison	15/12/2021	17/09/2021 (Bon de Livraison)
Procès-verbal de livraison	15/12/2021	17/09/2021
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme L'ordre de service datant du 15/12/2021	Conforme L'ordre de service datant du 07/09/2021
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Le marché a fait objet de liquidation pour le montant total de 1 148 000 000 FCFA TTC le 15/12/2021.	Le marché a fait objet de liquidation pour la somme totale de 1 176 000 000 FCFA TTC le 04/10/2021.
Autres commentaires	Bon de Livraison non daté	Facture N°0023/2021 non datée

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission ;
- Disponibilité des documents contractuels ;
- Bon archivage de la documentation ;
- Disponibilité des différents responsables concernés.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Pour les 02 marchés (N°854/21/MF/DGCMP/OB et N°499/21/MF/DGCMP/OB), nous avons constaté la réception des matériels roulants dans les délais contractuels à Niamey. Nous avons également constaté leur existence physique ainsi que l'existence des Bons de Livraison ainsi que des PV de réception.

❖ Conclusions, recommandations :

Nous n'avons aucune recommandation particulière ; il faut continuer à faire respecter le délai de livraison.

❖ Quelques images des matériels roulants stationnés à Niamey lors de la visite terrain :



Répartition des Véhicules du Marché N°854/21/MF/DGCMP/OB


MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA
DECENTRALISATION
GARDE NATIONALE DU NIGER
DIRECTION DU MATERIEL ET DES INFRASTRUCTURES
DIVISION AUTO

41 TOYOTA PICK UP V6 LIVRES LES ETS KATANGA

N°	N° CHASSIS	NUMERO
1.	JTELU71J40B032838	MID
2.	JTELU71J40B030832	MID
3.	JTELU71J50B032136	MID
4.	JTELU71J30B032653	MID
5.	JTELU71J20B033213	MID
6.	JTELU71J60B031108	MID
7.	JTELU71J90B031037	MID
8.	JTELU71J30B032314	MID
9.	JTELU71J30B032149	PN
10.	JTELU71J60B030962	PN
11.	JTELU71J50B031309	PN
12.	JTELU71J30B031373	PN
13.	JTELU71J60B031447	PN
14.	JTELU71JX0B031130	PN
15.	JTELU71JX0B030849	PN
16.	JTELU71J40B032726	PN
17.	JTELU71J50B032492	PN
18.	JTELU71J90B031670	PN

19.	JTELU71J30B033284	PN
20.	JTELU71J40B031141	PN
21.	JTELU71J30B032216	PN
22.	JTELU71J50B032055	PN
23.	JTELU71J80B031210	PN
24.	JTELU71J80B031076	MID
25.	JTELU71J50B032914	MID
26	JTELU71J40B049364	GNN TERA
27	JTELU71J10B049368	GNN TERA
28	JTELU71J70B049651	GNN MISSION TERA
29	JTELU71J20B049511	GNN DAMAGRAM TAKAYA
30	JTELU71J80B049349	GNN BELBEDJI
31	JTELU71J50B049230	GNN MIRRIAH
32	JTELU71J30B049534	GNN GOUDOUMARIA
33	JTELU71J70B049584	GNN N GOUNTI
34	JTELU71JX0B049062	GNN DAKORO
35	JTELU71J10B049418	GNN MADAOUA
36	JTELU71J50B049289	GNN Instance yelou
37	JTELU71JX0B049143	MID
38	JTELU71J00B049166	GNN INSTANCE YELOU
39	JTELU71JX0B049112	GNN NIAMEY
40	JTELU71J00B049510	GNN NIAMEY
41	JTELU71JX0B049031	GNN NIAMEY

CHEF DIVISION AUTO GNN



Répartition des Véhicules du Marché N° 499/21/MF/DGCMP/OB


**MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA
DECENTRALISATION
GARDE NATIONALE DU NIGER
DIRECTION DU MATERIEL ET DES INFRASTRUCTURES
DIVISION AUTO**

42 TOYOTA PICK UP V6 LIVRES AP LES ETS MANOMI SAYABOU

N°	N° CHASSIS	AFFECTATION
1.	JTFLU71JXOB044671	GNN KOLLO
2.	JTFLU71J0OB044274	GNN KIRINGUM
3.	JTFLU71J0OB044310	GNN ALMAHAOU
4.	JTFLU71J0OB044338	GNN OUALLAM
5.	JTFLU71J0OB044341	GNN TESKER
6.	JTFLU71J0OB044615	GNN TABARKET
7.	JTFLU71J0OB044669	GNN BANKILARE
8.	JTFLU71J1OB043098	GNN BANKILARE
9.	JTFLU71J1OB044266	GNN YUGOUM
10.	JTFLU71J2OB043174	GNN YUGOUM
11.	JTFLU71J2OB044258	GNN GOURE
12.	JTFLU71J2OB044292	GNN EGARECK
13.	JTFLU71J2OB044373	GNN EGARECK
14.	JTFLU71J2OB044423	GNN EGARECK
15.	JTFLU71J2OB044454	GNN EGAWANE
16.	JTFLU71J2OB044499	GNN EGAWANE
17.	JTFLU71J2OB044521	GNN EGAWANE
18.	JTFLU71J2OB044647	GNN IKNEWANE
19.	JTFLU71J3OB044270	GNN IKNEWANE

20.	JTFLU71J3OB044348	GNN IKNEWANE
21.	JTFLU71J3OB044463	GNN NIAMEY
22.	JTFLU71J3OB044589	GNN NIAMEY
23.	JTFLU71J3OB044611	GNN GNIAMEY
24.	JTFLU71J4OB044357	GNN GNIAMEY
25.	JTFLU71J4OB044455	GNN NIAMEY
26.	JTFLU71J4OB044519	GNN NIAMEY
27.	JTFLU71J5OB044528	GNN GNIAMEY
28.	JTFLU71J5OB044643	GNN MISSION TERA
29.	JTFLU71J6OB044358	GNN TEBARAM
30.	JTFLU71J6OB044604	GNN TEBARAM
31.	JTFLU71J7OB044501	GNN OUALAM
32.	JTFLU71J8OB043180	GNN DOSSO
33.	JTFLU71J8OB044426	GNN DOSSO
34.	JTFLU71J9OB044287	GNN MISSION TEBARAM
35.	JTFLU71J9OB044337	GNN NIAMEY
36.	JTFLU71J9OB044421	GNN TEBARAM
37.	JTFLU71J9OB044516	GNN TEBARAM
38.	JTFLU71J9OB044614	GNN TEBARAM
39	JTFLU71J0OB031041	GNN ILLEHLA
40	JTFLU71J0OB031248	GNN GMISSION TERA
41	JTFLU71J1OB031386	GNN MISSION TERA
42	JTFLU71J2OB030943	GNN MISSION TERA

LE CHEF DIVISION AUTO GNN



3.23. Ministère de la Santé Publique (MSP)

3.23.1 Acquisition de matériels roulants

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	DRP N°001/2021/LPX/MSP/P/AS
Entreprise (Titulaire du marché)	CFAO MOTORS Niger
Localisation	Niamey
Date de visite	08/04/2022
Date d'approbation du contrat	25/11/2021
Date de notification du contrat	08/11/2021
Description sommaire des fournitures	Acquisition de matériels roulants : 2 véhicules et 1 moto au profit du LANSPEX
Montant du marché initial (FCFA)	49 023 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	14 jours ouvrables pour les véhicules et 30 jours ouvrables pour la moto
Date effective de livraison	26/11/2021 sur le bon de livraison
Procès-verbal de livraison	13/12/2021
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Aucun paiement n'a effectué par le Trésor malgré l'émission d'un ordre de virement datant du 16/12/2021.
Autres commentaires	Aucune

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents ;
- Existence matérielle des matériels roulants.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Nous avons constaté que les matériels roulants ont été réceptionnés dans le délai contractuel. Nous avons également constaté l'existence matérielle des matériels roulants sanctionnés par un bon de livraison ainsi qu'un procès-verbal de réception daté et signé.

❖ Conclusions, recommandations :

Malgré l'émission d'un ordre de virement datant du 16/12/2021, le titulaire du marché (CFAO MOTORS Niger) n'a perçu aucun paiement à ce jour. Le Ministère de la Santé Publique (MSP), dans sa démarche, se doit d'appuyer le Laboratoire National de Santé et d'Expertise (LANSPEX) en mettant la pression sur le Trésor pour le paiement immédiat du titulaire du marché.

❖ Quelques images des matériels roulants :






Images de la TOYOTA RUSH et Carte Grise





Images de la TOYOTA HILUX et Carte Grise





Images de la MOTO YAMAHA et Carte Grise

3.24. Socite Nigerienne de l'Electricite (NIGELEC)

3.24.1 Fourniture de matériel éclairage public Diffa N'Glaa.

3.24.2 Electrification de 74 localités dans les communes urbaines et rurales de Dioudou, Karakara, Karguibangou, Farey, Sambéra, Yélou, Tanda, Gollé, Tounouga et Gaya de la région de Dosso (Lot 1)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	CONTRAT N°70/SACM/SG/20
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise Naila
Mission de contrôle :	
Localisation :	DIFFA
Date de visite :	25/03/2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Fourniture de matériel éclairage public Diffa N'Glaa.
Montant du marché initial (FCFA)	1 358 150 570 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Aucun
Délai d'exécution contractuel	3 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Acceptable
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	RAS
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Aucun
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont réceptionnés
Indication de fraude ou de corruption possible	OUI
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	RAS
Autres commentaires :	

- ❖ **Généralités sur le déroulement de la mission:** la mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.
- ❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :** A la date de notre arrivée, les travaux sont terminés réceptionnés.

Après nous pouvons confirmer que ces travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions techniques et dans les règles de l'art.

❖ **Conclusions, recommandations:**

La mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse et les travaux. A la date de notre arrivée, les travaux sont finis et réceptionnés.

Ainsi, à l'issue de la visite nous recommandons à l'AC de :

- Veuillez au respect des normes en matière des travaux ;
- Veuillez au respect au délai contractuel des travaux,
- Veuillez au respect de du délai du garantie des ouvrages.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



VUE GENERAL DES TRAVAUX

3.25. Niger Télécoms (NT)

3.25.1 Fourniture, installation et mise en service de trois cent (300) wifi HIGH end CPEs

3.25.2 Fourniture, installation et mise en service de dix (10) ASR 9010 (Full équipe), de dix (10) ASR920-24 (Full équipe) et un (1) CISCO ASA 5585 (Full équipe)

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°000012/NIGERTELECOMS/DFC/2021	N°000015/NIGERTELECOMS/DFC/2021
Entreprise (Titulaire du marché)	Ets GABS Télécommunication	Ets GABS Télécommunication
Localisation	Niamey	Niamey
Dates de visite	Les 07 et 14/04/2022	Les 07 et 14/04/2022
Date d'approbation du contrat	08/04/2021	08/04/2021
Date de notification du contrat	Non disponible	Non disponible
Description sommaire des fournitures	Fourniture, installation et mise en service de trois mille (3000) wifi HIGH end CPEs	Fourniture, installation et mise en service de dix (10) ASR 9010 (Full équipe), de dix (10) ASR920-24 (Full équipe) et un (1) CISCO ASA 5585 (Full équipe)
Montant du marché initial (FCFA)	450 000 000 FCFA	1 290 000 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	8 Semaines	8 Semaines
Date effective de livraison	31/05/2021 (Bon de Livraison)	20/05/2021 (Bon de Livraison)
Procès-verbal de livraison	31/05/2021	20/05/2021
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme	Conforme
Imperfections ou défauts constatés	Aucune	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Nous n'avons reçu aucune preuve de paiement.	Nous n'avons reçu aucune preuve de paiement.
Autres commentaires	Aucun	Aucun

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

- Bon déroulement de la mission ;
- Disponibilité des documents contractuels ;
- Bon archivage de la documentation ;
- Disponibilité des différents responsables ainsi que des techniciens.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

Pour les 02 marchés (n°0012/NIGERTELECOMS/DFC/2021 et N°0015/NIGERTELECOMS/DFC/2021), nous avons constaté la réception des matériels dans le délai contractuel. Nous avons également constaté leur existence physique ainsi que l'existence des Bons de Livraison et PV de réception.




❖ Conclusions, recommandations :

Améliorer le système de suivi des paiements permettant la vérification de ces derniers auprès de la Direction Comptable et Financière de Niger Télécoms (NT).


❖ Quelques images des matériels / équipements :




Images du stock des différents modèles des équipements WIFI HIGH END CPEs issus du Marché n°0012/NIGERTELECOMS/DFC/2021

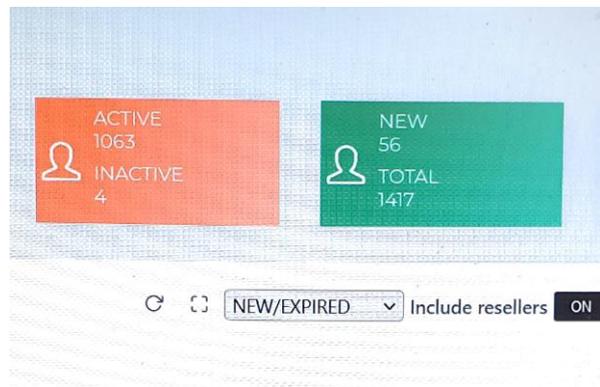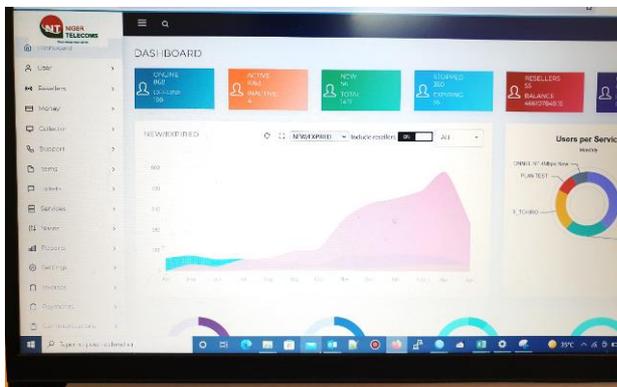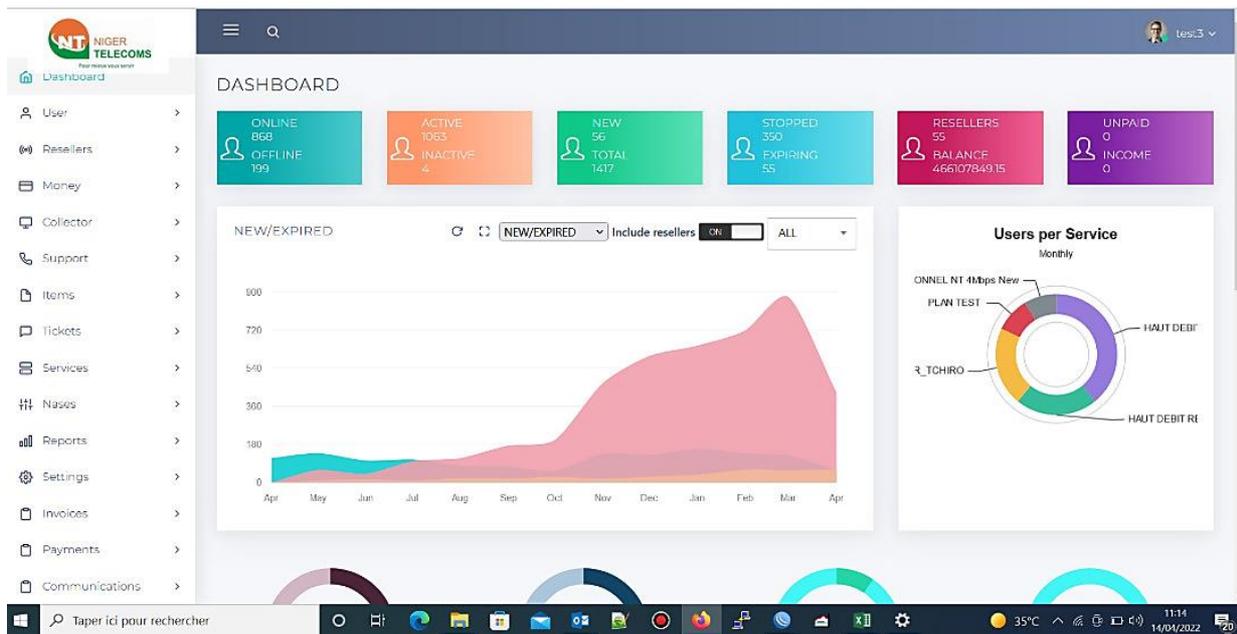

Images du Dashboard (Tableau de bord) montrant un total de 1 417 unités de WIFI HIGH END CPEs installées sur les 3 000 unités commandées (marché n°0012/NIGERTELECOMS/DFC/2021)

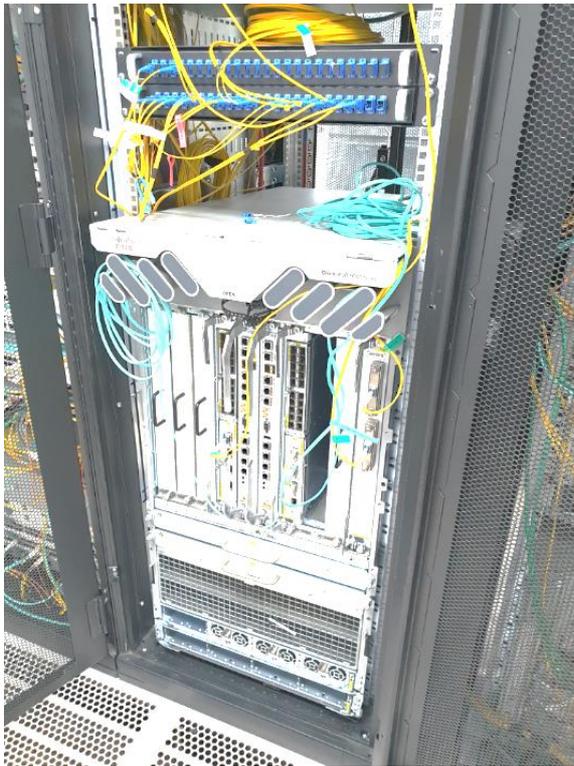

Images des équipements CISCO ASR 5585 issus du Marché n°0015/NIGERTELECOMS/DFC/2021

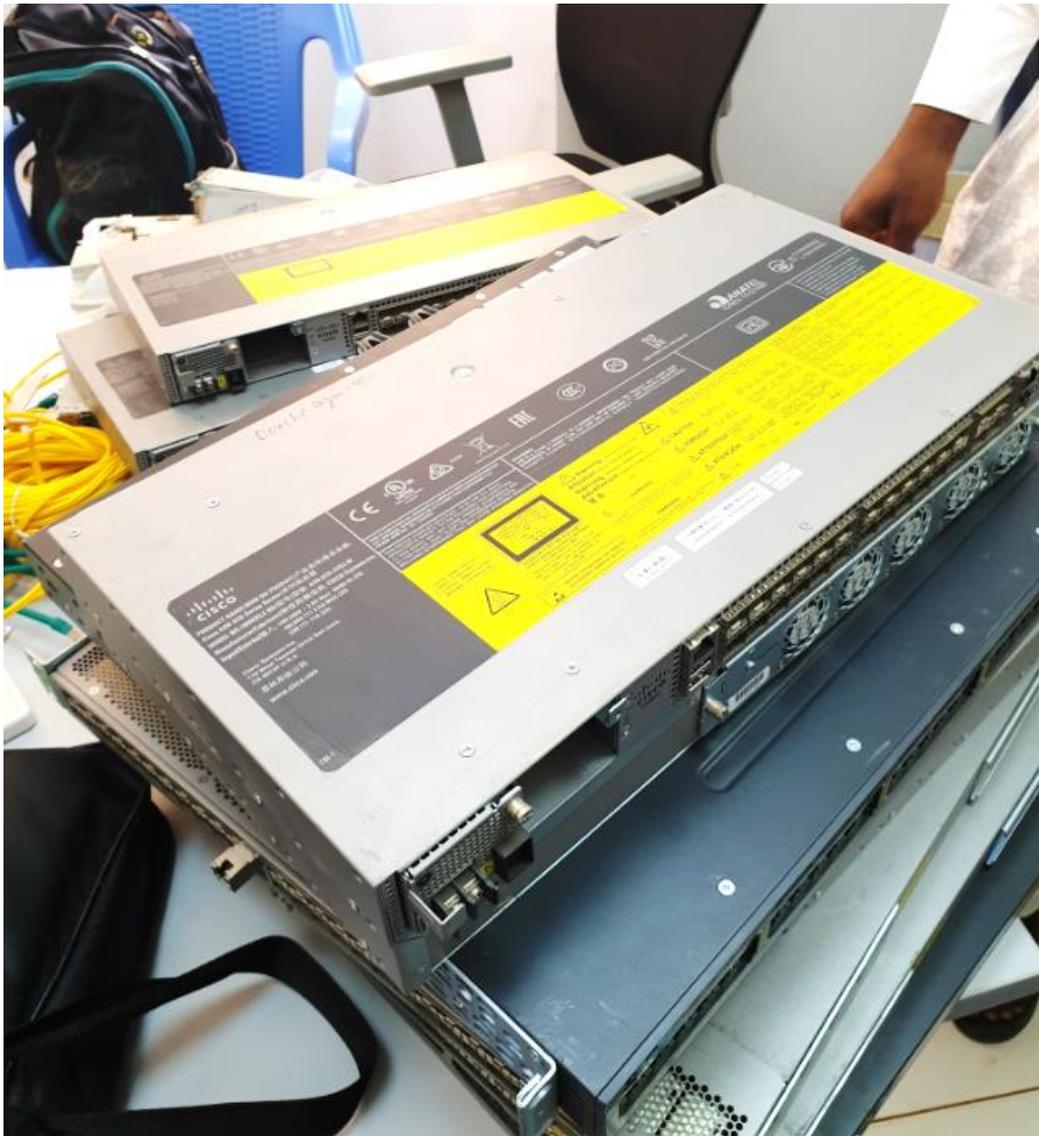

Images des équipements CISCO ASR 920 issus du Marché n°0015/NIGERTELECOMS/DFC/2021



*Images du CISCO ASA 5585 avec un autre offert en bonus pour servir de backup
(Marché n°0015/NIGERTELECOMS/DFC/2021)*

3.26. OFFICE NATIONAL DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES DU NIGER (ONPPC)

3.26.1 Marché de fourniture des kits de cathéters de dialyse adulte et voie centrale adulte

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	KITS DE CATHETERS
Entreprise (Titulaire du marché)	AF EMERGENCE
Localisation	Niamey
Date de visite	08/04/2022
Date d'approbation du contrat	27/04/2021
Date de notification du contrat	Non disponible
Description sommaire des fournitures	Fourniture des kits de cathéters de dialyse adulte et voie centrale adulte
Montant du marché initial (FCFA)	136 052 041 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	2 semaines
Date effective de livraison	27/04/2021
Procès-verbal de livraison	11/05/2021
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Conforme
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement effectué par ordre de virement et par compensation
Autres commentaires	Aucun

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents ;

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

Nous avons constaté que les kits de cathéters ont été réceptionnés dans le délai contractuel. Les PV de réception et bons de livraison ont été mis à notre disposition.

❖ **Conclusions, recommandations :**

Aucune.

❖ **Quelques images des kits de cathéters:**

Aucune image n'est disponible étant donné que le stock a été épuisé. Cependant, nous avons constaté l'existence du bon d'entrée en stocks ainsi que la sortie du stock via le bon de livraison au Ministère de la Santé Publique (MSP) :



OFFICE NATIONAL DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES
B.P. 11 585 NIAMEY

PROCES-VERBAL DE RECEPTION

L'an deux mille vingt un et le onze mai, le comité de réception composé de :

- M. Abdoul Aziz Hamidou Harouna, Chef Section Magasin
- M. Abdoul Momide Hamidoune, Chef Section Réception ;
- M. Ismael Iro, Chef Service Audit interne.
- Mme Mahaman Haoua, Contrôleur des Marchés Publics et des Engagements Financiers de l'ONPPC ;

S'est réuni à l'ONPPC à l'effet de procéder à la réception des Cathéters HDC et CVC du fournisseur **AF EMERGENCE** dont la valeur s'élève à : **Cinquante quatre mille sept cent quatre (54 704) EUROS**. Objet du bon de commande N° : BC 2100135 du 14/04/2021.

Après vérification, la commission a constaté que la réception a été effectuée conformément au bon de commande et n'a émis aucune réserve.

En foi de quoi, le présent procès-verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Ont signé :


M. ABDLOUL MOMIDE
M. ISMAEL IRO
Service Approvisionnement

M. Abdoul Aziz Hamidou



Mme MAHAMAN HAOUA





OFFICE NATIONAL DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES
BP:11585
001 NIAMEY
REPUBLIQUE DU NIGER
Téléphone : 20 74 27 81
Télécopie : 20 74 26 34
Courriel : onppc@intnet.ne
Site : www.onppc.niger.com

BON D'ENTREE EN STOCKS N°: BL2100135

Date 11/05/21

Af Emergence

INFORMATIONS COMMANDES

CODE FORUNISSEUR F2030
TRANSITAIRE
INCOTERMS
ENTREPOT ONPPC DEPOT CENTRAL
REFERENCE FOURN :
N° Bon de commande:: BC2100135
Date de commande:: 14/04/21

Adresse de livraison

DEPOT CENTRAL

Référence	Désignation	N° Lot	Qté	Condi	Peremtion	P.U. H.T.	Montant HT
401689	CATHETER DE DIALYSE ADULTE	21030902	1 600,00	UNITE	01/02/24	14,2300	22 768
704152	VOIE CENTRALE ADULTE UNITE	21030901	1 600,00	UNITE	01/02/24	19,9600	31 936
TOTAL			3 200,00				54 704

LA RECEPTION



SECTION MAGASINI



LE CHEF SERVICE APPROVISIONNEMENT





OFFICE NATIONAL DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES
BP:11585
001 NIAMEY
REPUBLIQUE DU NIGER
Téléphone : 20 74 27 81
Télécopie : 20 74 28 34
Courriel : onppc@intnet.ne
Site : www.onppc.niger.com

Bon de livraison Numéro FV2100368

Date 290421

REPRESENTANT:

DEPOT DE LIVRAISON: ministère santé publiq

Date de livraison
Expédition

ministère santé publique

N° IDENTIFIANT UNIQUE FINANCIER


Adresse de livraison

ministère santé publique

Référence	Désignation	Qté	N° Lot	Conditionnement	P.U. H.T.	Montant HT
100134	ADRENALINE 1 MG/ ML. 1ML AMP INJ B/1	7 000,00	A0154A01	BOITE	658,0000	4 606 000
709989	MASQUE (Bavettes chirurgie) 3 PIECES B/50	300,00	SPRUK	BOITE	22 000,0000	6 600 000
101056	CHLORURE DE SODIUM 0.10G/ML (10%) SOLUTION INJ PERF AMP	7 500,00	200428	UNITE	188,0000	1 410 000
101057	CHLORURE DE POTASSIUM 0.10G/ML (10%) SOLUTION INJ PERF AMP	500,00	D0194A01	UNITE	597,0000	298 500
101057	CHLORURE DE POTASSIUM 0.10G/ML (10%) SOLUTION INJ PERF AMP	7 000,00	DD194A01	UNITE	597,0000	4 179 000
704151	COUCHE ADULTE	7 230,00	COUCHE_ADULTE	UNITE	768,0000	5 552 640
101531	DIOSMECTITE 3G B/1	150,00	C200608	BOITE	2 550,0000	382 500
101531	DIOSMECTITE 3G B/1	2 760,00	C200611	BOITE	2 550,0000	7 038 000
101505	DOPAMINE 200MG/5ML INJ AMP	14 700,00	207533	UNITE	713,0000	10 481 100
101505	DOPAMINE 200MG/5ML INJ AMP	300,00	207533	UNITE	713,0000	213 900
201751	DOBUTAMINE 250MG SOLUTION PERF A DILUER IV FLACON	15 000,00	IDBTA2101	UNITE	2 447,0000	36 705 000
101960	HYDROCORTISONE 100MG/2ML INJ	7 500,00	ADT-9106	FLACON	878,0000	6 585 000
403855	HEPARINE SODIUM 5000 IU /5ML SOLUTION INJ /PERF IV FL	7 500,00	AFT0001	FLACON	3 496,0000	26 220 000
404218	LEVOFLOXACINE 250MG SOLUTION PERF IV FLACON	3 000,00	00156	FLACON	1 373,0000	4 119 000
103071	PROPOFOL 200MG/20ML PERF AMP	20,00	PFI20166BC	FLACON	3 925,0000	78 500
103071	PROPOFOL 200MG/20ML PERF AMP	2 980,00	T236721	FLACON	3 925,0000	11 696 500
103205	SALBUTAMOL AMP INJ 2 mg/ ml	3 000,00	FR20E17	BOITE	981,0000	2 943 000
103653	VECURONIUM 4MG INJ 2ML AMP B/1	6 830,00	LVRBC2013	BOITE	2 550,0000	17 416 500
103791	VITAMINE B COMPLEXE INJ	7 500,00	200602	FLACON	196,0000	1 470 000
	A reporter	100 770,00				147 995 140

Désignation	Qté	N° Lot	Conditionnement	P.U. H.T.	Montant H.T.
	Report 100 770				147 995 140
102515 NORADRENALINE 8MG AMP INJ	960,00	NAD004	FLACON	1 468,0000	1 409 280
102515 NORADRENALINE 8MG AMP INJ	120,00	NAD004	FLACON	1 468,0000	176 160
102515 NORADRENALINE 8MG AMP INJ	1 440,00	NAD004	FLACON	1 468,0000	2 113 920
102515 NORADRENALINE 8MG AMP INJ	320,00	NAD004	FLACON	1 468,0000	469 760
102515 NORADRENALINE 8MG AMP INJ	160,00	NAD004	FLACON	1 468,0000	234 880
701583 COMBINAISON CE,FDA PP+PE 65g	15 000,00	145	UNITE	35 585,0000	533 775 000
701584 SURBLOUSE(Laminated PP+PE 30g/m2 CE,FDA)	43 000,00	145	UNITE	11 812,0000	507 916 000
701584 SURBLOUSE(Laminated PP+PE 30g/m2 CE,FDA)	32 000,00	145	UNITE	11 812,0000	377 984 000
401689 CATHETER DE DIALYSE ADULTE (HDC Double limen) 12fr*13cm	1 000,00	21030903	UNITE	17 055,0000	17 055 000
401689 CATHETER DE DIALYSE ADULTE (HDC Double limen) 12fr*13cm	2 000,00	21030903	UNITE	17 055,0000	34 110 000
704152 VOIE CENTRALE ADULTE UNITE (CVC double lumen catheter) 07fr*15cm 14G	3 000,00	21030904	UNITE	12 791,0000	38 373 000
101653 ETOMIDATE 20MG/10ML INJ	2 425,00	EMI2006AC	FLACON	11 939,0000	28 952 075
101653 ETOMIDATE 20MG/10ML INJ	575,00	EMI2005AC	FLACON	11 939,0000	6 864 925
103522 THIOPENTAL 1G INJ B/1	999,00	N-15643	BOITE	3 083,0000	3 079 917
404298 TIENAM 500ML FLACON	7 500,00	0007E0	FLACON	3 838,0000	28 785 000
102077 IPRATROPIUM 0.25MG/2ML SOLUTION NEBUL (unidos) DOSETTE	2 520,00	FR20B19	FLACON	785,0000	1 978 200
100134 ADRENALINE 1 MG/ ML. 1ML AMP INJ B/1	8 000,00	A0154A01	BOITE	658,0000	5 264 000
103653 VECURONIUM 4MG INJ 2ML AMP B/1	670,00	LVRBC2014	BOITE	2 550,0000	1 708 500
102077 IPRATROPIUM 0.25MG/2ML SOLUTION NEBUL (unidos) DOSETTE	470,00	FR20B19	FLACON	785,0000	368 950
102077 IPRATROPIUM 0.25MG/2ML SOLUTION NEBUL (unidos) DOSETTE	10,00	FR20B07	FLACON	785,0000	7 850
102598 OMEPRAZOLE 40MG GEL GASTRO RESIST AMP	2 000,00	01255	UNITE	2 976,0000	5 952 000
TOTAL	224 939,00				1 744 573 557

LE CLIENT



LA SECTION MAGASIN


LE RESPONSABLE DU DEPOT DE ZONE NIAMEY


3.27. Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN)

3.27.1 Fourniture de 5500 tonnes de céréales - 4000 tonnes de Mil à 1 439 800 000 F - 1500 tonnes de Sorgho à 532 500 000 F

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	008//2021/OPVN/RAS
Entreprise (Titulaire du marché)	Ets Elhadj TERA Sahibou
Localisation	Niamey
Date de visite	06/04/2022
Date d'approbation du contrat	19/10/2021
Date de notification du contrat	19/10/2021
Description sommaire des fournitures	Fourniture de 5500 tonnes de céréales : 4000 tonnes de Mil et 1500 tonnes de Sorgho
Montant du marché initial (FCFA)	1 972 300 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	14 jours
Date effective de livraison	29/10/2021
Procès-verbal de livraison	Non disponible
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement effectué : facture définitive du 14/11/2021 & ordre de virement N°069/2021 du 24/11/2021
Autres commentaires	Aucun

3.27.2 Marché de fournitures : Marché N°00070 OPVN/2021/RAS: Fourniture de 3000 Tonnes de Mil

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N°0070/OPVN/21/RAS
Enterprise (Titulaire du Marché)	Société Saddi Kemil
Localisation	Maradi
Date de visite	29/03/22
Date approbation du contrat	19/01/21
Date de notification du contrat	
Description sommaire des fournitures	Fourniture de 3000 tonnes de Mil
Montant du marché initial (FCFA)	1 072 500 000 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	13 jours
Date effective de livraison	
Procès-verbal de livraison	Rédigé et prononcé sans réserve
Conformité de la quantité livrée (au cas contraire donner les raisons)	Conforme
Évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucune
Imperfections ou défauts constatés	Aucune
Stratégie et budget d'entretien	
Situation des paiements de l'entreprise (Montant engagé en paiement)	Paiement de la totalité du montant effectué (Bon d'achat ; mandat de paiement. factures)
Autres commentaires	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :**

- Bon déroulement de la mission dans l'ensemble ;
- Disponibilité et bon classement des documents ;
- Bon archivage des documents.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

Le stock des marchandises a été épuisé et par conséquent ne peut pas être vu physiquement. On a constaté que les marchandises ont été réceptionnées à 100% à Niamey et sanctionnées à la livraison par des procès-verbaux. Par ailleurs, il faut noter le respect du délai contractuel des travaux et la disponibilité du procès-verbal de réception.

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée, et la livraison a été faite à 100% dont attestent les procès-verbaux.

Nous n'avons aucune recommandation particulière, la mission vous exhorte de continuer dans ce sens.

❖ **Quelques images des fournitures ou des équipements :**

Il n'existe aucune image disponible du stock. Ce dernier étant épuisé, nous avons pu constater l'existence des livres de stocks au niveau du Centre de Lazaret de l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN).

1 – Bulletin d'agrée de paiement et livres de stocks pour le Mil

Marché par Entente Directe AVEC Mise en Concurrence N° 008/2021/OPVN pour la fourniture de 17570 tonnes de céréales

OPVN BP : 474 NIAMEY Tél : 20 73 44 43		BULLETIN D'AGREAGE DE PAIEMENT <i>Contrat N° 000071/OPVN/2021/RAS</i> <i>du 19 Octobre 2021</i>		N° 000311
AGENCE <u>Niamey</u>		CENTRE <u>Lazaret</u>		
PRODUIT <u>Mil</u>		SPECIFICATIONS _____		
NATURE DU STOCK (SNS,RAS) <u>RAS</u>		REFERENCES FOURNISSEUR <u>FIS TERA SAHIBOU Tel 00(226)90215303</u> <u>BP: 37 Bobo Dioulasso CI</u>		
DATE DE LIVRAISON <u>27.10.2021</u>		NOMBRE DE SACS <u>40000 sacs</u>		
POIDS DE SAC (KG) <u>100kg</u>		POIDS TOTAL (KG) <u>4000.000kg</u>		
Prix à la tonne <u>359 950 F</u>		Paiement par le Chef d'Agence <u>_____</u>		
Valeur totale (FCFA) <u>1.439.800.000 FCFA</u>		Paiement par le siège <u>X_____</u>		
Observations <u>Un milliard quatre cent trente neuf millions huit cent mille francs CFA.</u>				
Signatures 	Magasinier 	Agent Phyto 	Le fournisseur 	

Imp. EXPRESS : Tél. 20 75 21 35 Ny

COPIE NON NEGOCIABLE

OPVN

LIVRE DE STOCKS (en KG)

N° 013903

DIRECTION RÉGIONALE Namèy CENTRE layant PRODUIT Maf SPECIFICATIONS PEB RAS 21
 TYPE DE STOCKS (SNS/RAS) RAS MOIS Septembre 2024

Date	Réf	ENTREES					Total entrées	SORTIE								Stock final		
		Achats locaux	Import	Récep. autres	Récep. Intern.	Vente ordin.		V. Prix modéré	Vente spéciale	Distrib. gratuite	Ravit. BC	Expéd. autres	Expéd. interne	Pertes	Total sorties			
	report					4000000											144000	2529000
24-09-24	BC42857 Tillabéri Com						144000										144000	2529000
23-09-24	BC42861 Ardet Ny4						20000										1436000	2524000
	4 BC42869 Dantchankou						20000										1436000	2524000
	11 BC42863 Takamamatt						35000										1491000	2529000
	11 BC42864 Mokko						25000										1516000	2484000
	11 BC42865 Ardet Ny 3						20000										1536000	2464000
	11 BC42866 Kollo						15000										1551000	2449000
24-09-24	BC42867 Kollo						15000										1536000	2444000
23-09-24	BC42868 Sokonbe						20000										1526000	2444000
	11 BC42870 Guillade						30000										1616000	2384000
	11 BC42871 Farey						20000										1636000	2364000
24-09-24	BC42873 Dimézi						9000										1645000	2352000
	11 BC42875 Bambaré						20000										1665000	2335000
	11 BC42878 Ardet Ny4						18000										1675000	2325000
	11 BC42880 Giaramkédou						20000										1695000	2305000
	11 BC42881 Giaramkédou						5000										1700000	2300000
	11 BC42882 Ardet Ny3						10000										1710000	2290000
	11 BC42887 Banni Nighoua						15000										1725000	2275000
	11 BC42889 Li'band						5000										1730000	2270000
	11 BC42892 Bambaré						17000										1747000	2253000
	11 BC42894 Bambaré						10000										1757000	2243000
25-09-24	BC42898 Dantchankou						10000										1767000	2233000
	11 BC42857 loga						25000										1792000	2208000
	11 BC42658 Tombo Maïney						25000										1817000	2183000
TOTAUX																	1817000	2183000
Mouvements du Mois						4000000											1817000	2183000

OBSERVATIONS

Le Magasinier

Nom Boubakar Hourouma Date 30-09-2024 Signature [Signature]

Mouvements du mois = Totaux - Report



Le Directeur Régional

Nom Ben SB Maïga Date 30-09-24 Signature [Signature]

OPVN

LIVRE DE STOCKS (en KG)

N° 013910

DIRECTION RÉGIONALE Niamey

CENTRE layant

PRODUIT Nil

SPECIFICATIONS NED RAS 21

TYPE DE STOCKS (SNS/RAS) RAS

MOIS Octobre 2021

Date	Réf	ENTREES				Total entrées	SORTIE										Stock final	
		Achats locaux	Import	Récep. autres	Récep. Intern.		Vente ordin.	V. Prix modéré	Vente spéciale	Distrib. gratuite	Ravit. BC	Expéd. autres	Expéd. interne	Pertes	Total sorties			
	report	4000000				4000000		2790000									2790000	1210000
01-10-21	BC 49769 Tapa							2000									2810000	1180000
"	BC 497702 Kouré							5000									2860000	1180000
"	BC 497703 Yrouni							20000									2880000	1160000
"	BC 497704 Yrouni							5000									2830000	1150000
"	BC 497707 Sokorobe							10000									2830000	1140000
"	BC 497711 Hamadallaye							10000									2860000	1135000
09-10-21	BC 497713 Bambeye							35000									2900000	1100000
"	BC 497714 Daoudaou							40000									2940000	1060000
"	BC 497716 Tandikandia							50000									2990000	1010000
"	BC 497718 Kintachi							5000									2930000	1005000
"	BC 497720 Bambeye							20000									3050000	985000
04-10-21	BC 497721 Bagaga							15000									3060000	970000
05-10-21	BC 497723 Tapa							25000									3050000	950000
"	BC 497724 Kouré							10000									3060000	935000
"	BC 497727 Malbaga							13000									3070000	920000
"	BC 497728 Malbaga							27000									3105000	890000
"	BC 497729 Kouré							10000									3115000	880000
"	BC 497733 Bambeye							25000									3140000	860000
01-10-21	BC 497734 Bagaga							15000									3155000	845000
"	BC 497737 Badaouichin							35000									3190000	810000
11-10-21	BC 497739 Badaouichin							35000									3225000	775000
"	BC 497740 Malbaga							30000									3255000	745000
"	BC 497741 Daoudaou							20000									3275000	725000
"	BC 497742 Arrdt Cam 2 Gd Tahoua							35000									3310000	690000
TOTAUX		4000000				4000000		3310000									3310000	690000

OBSERVATIONS

Le Magasinier

Nom Boubacar Moumou Date 31-10-2021 Signature [Signature]

Mouvements du mois = Totaux - Report



Le Directeur Régional

Nom Ben AB Kanga Date 30-10-21 Signature [Signature]

2 - Bulletin d'agrée de paiement et livres de stocks pour le Sorgho

Marché par Entente Direct Avec mise en concurrence N° 008/2021/OPVNI
 RAS pour la fourniture de 17570 Tonnes de céréales.

OK

OPVNI BP : 474 NIAMEY Tél : 20 73 44 43	BULLETIN D'AGREAGE DE PAIEMENT Contrat N° 00-0071/OPVNI/RAS du 19 octobre 2024	N° 000312
--	---	-----------

AGENCE <u>Niamey</u>	CENTRE <u>Lezardet</u>
PRODUIT <u>Sorgho</u>	SPECIFICATIONS _____
NATURE DU STOCK (SNS,RAS) <u>RAS</u>	
REFERENCES FOURNISSEUR <u>ETERRA SAHIBOU (tel:00226) 70 215 30 3</u> <u>BP: 37 Boko Dioulano 04</u>	

DATE DE LIVRAISON <u>27-10-2021</u>	NOMBRE DE SACS <u>15000 Sacs</u>
POIDS DE SAC (KG) <u>100Kgs</u>	POIDS TOTAL (KG) <u>1500 000 Kgs</u>

Prix à la tonne <u>355 000 F cfa</u>	Paiement par le Chef d'Agence <u>_____</u>
Valeur totale (FCFA) <u>5 325 000 000 FCFA</u>	Paiement par le siège <u>X</u>

Observations Cinq cent trente deux million cinq cent mille francs cfa

Signatures

Magasinier [Signature]

Agent Phyto [Signature]
 Chef Secteur [Signature]

Le fournisseur [Signature]

COPIE NON NEGOCIABLE

Imp. EXPRESS : Tél. 20 75 21 35 Ny

OPVN

LIVRE DE STOCKS (en KG)

N° 013927

DIRECTION RÉGIONALE Niamey CENTRE kezant PRODUIT Sorgho SPECIFICATIONS NED RAS 21
 TYPE DE STOCKS (SNS/RAS) RAS MOIS septembre 2021

Date	Réf	ENTREES					SORTIE										Stock final	
		Achats locaux	Import	Récep. autres	Récep. Intern.	Total entrées	Vente ordin.	V. Prix modéré	Vente spéciale	Distrib. gratuite	Ravit. BC	Expéd. autres	Expéd. interne	Pertes Total Sorties	Total sorties			
	report																	
19/09/21	BAP3312 ATERA	150000	✓			150000											150000	
20/09/21	BC33579 Dankonou		✓				20000										20000	148000
"	BC33580 Dankonou		✓				20000										40000	146000
"	BC33581 Soucoucou		✓				20000										60000	140000
"	BC33582 Kieche		✓				20000										80000	142000
"	BC33583 Simini		✓				15000										95000	140500
"	BC33584 Ayelou		✓				5000										100000	140000
"	BC33585 Ailény		✓				20000										120000	138000
"	BC33586 Dimga		✓				15000										135000	136500
"	BC33587 Bambari		✓				20000										155000	134500
"	BC33588 Bagarou		✓				30000										185000	131500
"	BC33589 Tandikicandi		✓				20000										205000	129500
"	BC33590 Imalei		✓				10000										215000	128500
"	BC33591 Imalei		✓				5000										220000	128000
"	BC42801 Bambarou		✓				16000										236000	126400
21-09-21	BC33592 Ibaheouane		✓				4000										240000	126000
"	BC33593 Gouhanga		✓				4000										244000	125600
27-09-21	BC42831 Keita		✓				14000										258000	124200
"	BC42832 Keita		✓				11000										269000	123100
"	BC42833 Gouhanga		✓				16000										285000	121500
"	BC42834 Ibaheouane		✓				16000										301000	119900
"	BC42839 Amoussi		✓				5000										306000	119400
23-09-21	BC33594 Derra		✓				10000										316000	118400
"	BC33595 Bibiyegou		✓				10000										326000	117400
TOTAUX							326000										326000	117400
Mouvements du Mois																		

OBSERVATIONS

Le Magasinier

Nom Boubakar Houmoumi Date 30.09.2021 Signature [Signature]

Mouvements du mois = Totaux - Report



Le Directeur Régional

Nom Ben SB Maiga Date 30.09.2021 Signature [Signature]

3.28. PROJET D'APPUI AUX REFUGIES ET AUX COMMUNAUTES D'ACCUEIL

3.28.1. Réalisation/réhabilitation d'infrastructures hydrauliques (mini AEP) dans les communes d'intervention du PARCA région de Diffa Lot 3 : Réalisation de six (6) PEA dans la commune de Toumour

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	0011/TRVX/CAB/PM/SE/SDS/PARCA/IDA/2021
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise DIDI GLOBAL/BTP/H
Mission de contrôle :	Direction Régional de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Diffa
Localisation :	DIFFA
Date de visite :	02/04/2022
Date d'approbation du contrat	11/06/2021
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Réalisation/réhabilitation d'infrastructures hydrauliques (mini AEP) dans les communes d'intervention du PARCA région de Diffa Lot 3: Réalisation de six (6) PEA dans la commune de Toumour.
Montant du marché initial (FCFA)	187 513 050
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	RAS
Délai d'exécution contractuel	8 mois
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	AUCUN
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Non conforme
PV de réception (provisoire, finale)	Pas encore
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires:	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission : Du fait de l'insécurité de la zone, on n'a pas pu faire le déplacement sur le terrain mais on a fait la revue des documentations.**

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : RAS**

❖ **Conclusions, recommandations:**

La mission s'est bien déroulée et toutes les documentations ont été mises à notre disposition pour analyse. Les travaux sont terminés et réceptionnés à la date de notre visite. Le taux global d'avancement est de 100%.

3.29. Projet des Gestions des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU)

3.29.1 50 CLASSES REGIONS D'AGADEZ 70 CLASSES REGIONS DE MARADI

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	N° 002/Travaux/MRI/2020
/Entreprise (Titulaire du marché) :	Entreprise Mahamadou Maikano AAMM
Mission de contrôle :	Aucun
Localisation :	Maradi et Agadez
Date de visite :	31/03/2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	50 classes régions d'Agadez 70 classes régions de Maradi
Montant du marché initial (FCFA)	193 352 628 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	70%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun.
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Non conforme
PV de réception (provisoire, finale)	Non
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ Généralités sur le déroulement de la mission :

La mission constate le bon déroulement des travaux d'audit en compagnie d'un représentant de l'ARMP et de Chef d'antenne Régional Agadez et Maradi.

❖ Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :

A notre visite, les travaux sont toujours en cours à un taux global de 70% :

Nous avons constaté des insuffisances telles que :

1. Le bâches fournis ne sont pas des bonnes qualités ;
2. Les travaux des formes d'aires dans les différentes classes sont mal exécutés ;
3. Les normes ne sont pas respectées en matière de dosages des matériaux.

❖ Conclusions, recommandations:

Les travaux sont toujours en cours. Le taux global d'avancement est de 70%.

Ainsi nous recommandons à l'AC de :

- Veiller au respect des normes de constructions avec un suivi permanent ;
- Veiller à ce que l'entreprise corrige les malfaçons ;
- Veiller à l'utilisation des matériaux de qualités ;
- Veiller à l'exécution effective des ouvrages.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue Générale d'une classe

3.29.2 Travaux d'urgences sur les AHAs et les digues de protection des habitants dans les régions de Tillabéri et Niamey

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	CONTRAT N°91/TRAVAUX/PGRC-DU/6431/IDA
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ONAHA
Mission de contrôle :	MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Localisation :	Maradi et Agadez
Date de visite :	31/03/2022
Date d'approbation du contrat	
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Travaux d'urgences sur les AHAs et les digues de protection des habitants dans les régions de Tillabéri et Niamey
Montant du marché initial (FCFA)	699 883 174 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	Pas d'avenant
Délai d'exécution contractuel	
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	Oui
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	Effectué
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	Conforme
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	Aucun.
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Acceptable
PV de réception (provisoire, finale)	Les travaux sont en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	Non visible
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	Aucun
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission :** En compagnie d'un représentant de PGRC-DU, ont effectué la mission dans des bonnes conditions.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite les travaux sont terminés et réceptionnés à un taux global de 100% :

Nous avons constaté des imperfections ainsi qui suivent :

4. Début de détérioration par endroit dû à l'érosion ;
5. Détérioration des dalles par endroit ;
6. Les travaux sont dans le respect des normes par endroit,

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée et à la date de notre visite les travaux sont terminés réceptionnés. Le taux global d'avancement est de 100%.

Ainsi nous recommandons à l'AC de :

- Veuillez aux respects des normes de constructions avec un suivi permanent ;
- Veuillez à ce que l'entreprise corrige les malfaçons ;
- Veuillez à l'utilisation des matériaux de qualités
- Veuillez à l'exécution effective des ouvrages ;

❖ Quelques images des travaux ou des équipements



Vue General des travaux

3.30. Programme De Développement Agricole Et Familial (PRODAF)

3.30.1 MARCHÉ DE TRAVAUX : Marché N°295/21/MF/DGCMP/EF Travaux de confortation de la piste rurale Almari-Kirchia-Ganisco, dans le Pôle de Développement Economique de Mirriah, Région de Zinder.

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	Marché N°295/21/MF/DGCMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE OULD
Mission de contrôle :	
Localisation :	ZINDER
Date de visite :	21/03/2022
Date d'approbation du contrat	25/05/2022
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Travaux de confortation de la piste rurale Almari-Kirchia-Ganisco, dans le Pôle de Développement Economique de Mirriah, région de Zinder.
Montant du marché initial (FCFA)	248 722 415 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	0 FCFA
Délai d'exécution contractuel	5 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	100%
Conformité des travaux :	
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	33 jours de dépassement du délai contractuel
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Acceptable mais on a constaté des imperfections
PV de réception (provisoire, finale)	28/10/2022
Indication de fraude ou de corruption possible	RAS
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	100%
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission:**

La mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse. Cette visite s'est tenue en présence du représentant du PRODAF et de l'ARMP/ZINDER.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A notre visite, les travaux sont terminés et réceptionnés. De manière générale, les travaux sont réalisés conformément aux dispositions retenues dans le contrat. Toutefois, la mission constate des dégradations sur les ouvrages de protection due à l'érosion hydrique.

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée, nous avons constaté physiquement que les travaux sont terminés et réceptionnés à notre visite. Néanmoins nous avons constatés des malfaçons sur les ouvrages dus à l'érosion hydrique.

Ainsi nous recommandons à l'AC de :

- Veiller aux respects des normes en matières de construction des ouvrages en tenant compte des prévisions pluviométriques;
- Veiller à l'exécution des ouvrages de bonne qualité ;
- Veiller au respect du délai contractuel ;

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



VUE GENERAL DE LA PISTE

DEGRADATION DES OUVRAGES DE PROTECTION

3.30.2 MARCHE DE TRAVAUX: Marché n°004/MAGEL/PRODAF/URGP/ZR/2020-LOT N°8 Travaux de construction d'un (1) seuil de recharge de la nappe à Zaozao (OH2) dans le Pôle de Développement Economique (PDE) de Damagaram Takaya, région de Zinder.

ASPECTS	COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat	Marché N°206/21/MF/DGCMP/EF
/Entreprise (Titulaire du marché) :	ENTREPRISE TCHILOUTA BACHAR
Mission de contrôle :	GROUPEMENT BETIFOR-ESI
Localisation :	ZINDER
Date de visite :	21/03/2022
Date d'approbation du contrat	30/04/2021
Date de notification du contrat	
Nature des travaux	Travaux de de la piste rurale Almari-Kirchia-Ganisco, dans le Pôle de Développement Economique de Mirriah, région de Zinder.
Montant du marché initial (FCFA)	163 596 496 FCFA
Montant du marché et avenants (FCFA) (Donner les raisons des avenants)	0 FCFA
Délai d'exécution contractuel	5 MOIS
Mobilisation effective du personnel et du matériel déclarés	OUI
Journal du chantier, périodicité des réunions de chantier et PV de réunions	OUI
Niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement)	17%
Conformité des travaux :	
Evaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)	RAS
Qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés)	Acceptable mais on a constaté des imperfections
PV de réception (provisoire, finale)	Travaux en cours
Indication de fraude ou de corruption possible	RAS
Etat de paiement (Décomptes, attachements, factures)	30%(avance de démarrage)
Autres commentaires :	

❖ **Généralités sur le déroulement de la mission:**

La mission s'est bien déroulée et les documents ont été mis à la disposition de l'auditeur pour analyse.

❖ **Observations sur la qualité des travaux ou des équipements :**

A la date de notre visite, les travaux sont en cours.

Nous avons fait les constats ainsi qui suivent :

- Manque de matériels de terrassement adéquats pour les travaux (pelle mécanique, chargeuse etc..) ;
- Utilisation des matériaux des mauvaises qualités (gravaiers) ;
- Lenteur dans l'exécution des travaux.

❖ **Conclusions, recommandations :**

La mission s'est bien déroulée. Nous avons constaté lors de notre visite que les travaux sont en cours et à un taux global d'avancement de 17%.

Ainsi, nous recommandons à l'AC de :

- Veiller au respect des normes en vigueur ;
- Veiller à l'utilisation des matériaux de bonnes qualités ;
- Veiller à l'usage des matériaux adéquats exigés par le DAO sur le chantier afin de finir les travaux dans le meilleur délai.

❖ Quelques images des travaux ou des équipements :



**TRAVAUX DES SEUILS D'EPANDAGE A ZAOZAO VUE GENERAL DES TRAVAUX EN COURS
MATERIAUX UTILISES**

ANNEXES

ANNEXE 1 : PLAN D'ACTION DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Respect dans la livraison des équipements	Continuer à faire respecter les entreprises le délai contractuel des fournitures	SPM	Pour les marchés futurs	
Respect dans la livraison.	Continuer à faire respecter les entreprises le délai contractuel des marchés	DMP	Pour les marchés futurs	
Paiement des marchés exécutés	Effectuer le suivi des paiements ; Joindre les preuves de paiement au dossier.	DMP	Pour les marchés en cours et futurs	
Suivi du matériel informatique	Mettre en place un fichier de suivi global faisant ressortir les éléments tels que le type de matériel, la date d'acquisition, le numéro de série, l'emplacement ou service d'affectation ainsi que le nom complet de l'utilisateur.	Responsable Informatique	Pour les marchés en cours et futurs	
Respect dans la livraison des équipements.	Donner des délais raisonnables aux prestataires au-delà desquels la pénalité de retard pourra être appliquée ; Veiller au respect des délais contractuels par les entreprises.	DFM	Pour les marchés futurs	
Respect dans la livraison des travaux.	Donner des délais raisonnables aux prestataires au-delà desquels la pénalité de retard pourra être appliquée ; Continuer à faire respecter les entreprises le délai contractuel des travaux.	DFM	Pour les marchés futurs	

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
	<p>Veillez au respect des qualités des ouvrages</p> <p>Veillez au respect des corrections de malfaçons constatées</p> <p>Veillez au respect du délai de garantie des ouvrages</p>			
Respect des délais de livraison des équipements.	<p>Accorder des délais raisonnables aux prestataires au-delà desquels la pénalité de retard pourra être appliquée ;</p> <p>Faire respecter les délais contractuels des travaux.</p>	DFM	Pour les marchés futurs	
Imperfection des ouvrages	<p>Veillez à une meilleure exécution des ouvrages ;</p> <p>Faire corriger les malfaçons constatées.</p>	DFM	Pour les marchés futurs	
Respect dans la livraison des équipements	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Donner des délais raisonnables aux prestataires au-delà desquels la pénalité de retard pourra être appliquée. ❖ Continuer à faire respecter les entreprises le délai contractuel des fournitures ; ❖ Joindre les bons de livraison et PV de réception aux documents contractuels. 	<p>DMP (MF)</p> <p>Chef Service Matériel (DGD)</p>	Pour les marchés en cours et futurs	
Paiement des marchés exécutés	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Effectuer le suivi des paiements ; ❖ Joindre les preuves de paiement au dossier. 	DMP	Pour les marchés en cours et futurs	

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	RESPONSABLE	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Respecter les engagements quant au paiement	Mettre le maximum de pression sur le Ministère des Finances (Trésor) afin de faciliter le règlement rapide du titulaire du marché.	MSP	Pour les marchés futurs	
Paiement des marchés exécutés	Améliorer le système de suivi des paiements permettant la vérification de ces derniers auprès de la Direction Comptable et Financière de Niger Télécoms (NT) en collaboration avec les autres directions concernées.	NT	Pour les marchés présents et futurs	

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
Monsieur MAHAMADOU SAMNA Seydou	FAFPA	SPM	Tél. : +227 96 09 57 06 +227 92 75 12 71 Email : msamna86@yahoo.fr
Monsieur MANZO MOUSTAPHA	PVI	RAF	Tél. : +227 98 27 80 00 Email : mahamane.manzo@pvi.ne
Monsieur ABBA ABDOU FADAI	PVI	SPM	Tél. : +227 96 49 49 71 Email : abba.fadai@pvi.ne
Monsieur MANIROU HANOUNOU	PVI	Assistant SPM	Tél. : +227 98 99 45 45 Email : manirou.hanounou@pvi.ne
Monsieur OUHOUMODOU MOUTARI	PVI	Comptable Principal	Tél. : +227 96 99 37 38 Email : moutari.ouhoumoudou@pvi.ne
Monsieur GOUMOUR GALIOU	CAB/PRN	DMP	Tél. : +227 96 55 55 49 +227 90 63 51 78 Email : ggoumour@gmail.com
Monsieur SOFARI HASSAN	CAB/PRN	Responsable Informatique	Tél. : +227 96 87 61 85 Email : agalisofari@gmail.com
Monsieur ISSOUFOU BOUBACAR	CENI	Responsable Financier	Tél. : +227 96 22 01 01 +227 90 45 75 36 Email : ceniissouf@yahoo.fr
Monsieur HACHIMOU MASSAODOU	CENI	Responsable Logistique	---
Monsieur OUMAROU Amadou	CFS	RPM	Tél.: +227 96 49 43 71 Email : omaramadou2003@yahoo.fr
Monsieur MAYAKI GONDA SOULEY	PHRASEA2	COORDINATEUR	96988382
Monsieur issoufou	ARMP/MARADI	CHEF DE RECOUVREMENT	97267992
Monsieur	Mairie Harikanassou	SG du mairie	99 92 01 87
Monsieur	ARMP/Dosso	Chef de Recouvrement	97 32 42 42
Monsieur Isamel	Génie Rural Magaria	Agent	96 62 11 09
Monsieur Amadou	ARMP/Zinder	Chef de recouvrement	89 01 43 89
Mme JEAN Rakiatou	DNPGCA	Assistante en Finance	Tél. : +227 90 63 32 38 Email : rakiatoujean@yahoo.fr
M. ANZA	OPVN	Chef Magasinier / Gestionnaire de Stock	Tél. : +227 88 65 11 11
Monsieur ISSA MOUNKAILA	DRHA/TI	Directeur Régional de l'hydraulique de Tillabéry	90 46 70 51
Monsieur BOUBACAR	ARMP/Tillabery	SECRETAIRE REGIONAL	80 08 53 57
Monsieur ADJI DOUBA	ARMP/ZINDER	SECRETAIRE REGIONAL	89014389

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
SALISSOU MADJIRI	DRHA/ZINDER	CHEF DE DIVISION HYDRAULIQUE VILLAGEAISE	96971326
Monsieur HAMIDOU ATTA	DRSP/TI	DIRECTEUR	96 89 89 31
Monsieur Boubacar MONSIEUR SEYDOU	ARMP/TI ENA	SR/REGIONAL INTENDANT	80 08 53 57 96233796
Monsieur ALI MAMAN SANI	ARMP/NIAMEY	SECRETAIRE REGIONAL	
Monsieur Kadi Mahamadou	DRSP	Chef Mainteneur DRSP/TA	96 14 49 77
Monsieur Amadou	ARMP/Tahaoua	CHEF DE RECOUVREMENT	98 59 02 12
Medecin Colonel Majeur Alfari Soumaila Sita	HRM	DIRECTEUR GENERAL DE L'HRM	
Monsieur ISMAEL	ARMP/MARADI	CHEF DE RECOUVREMENT	97267992
Monsieur ISSA ABDOUL-AZIZ	MDN	DMP	Tél. : +227 96 50 63 08 +227 90 40 70 15 Email : issaabdoulaziz6@gmail.com
Monsieur MODIBO BOUBE	MDN	Assistant DMP	+227 98 10 91 20
Monsieur Daouda	ARMP/DIFFA	Chef de recouvrement	+227 80 08 53 48
Monsieur MALAM SAMA Yacouba	MEN	DMP	TEL. : +227 96 57 57 68 / 90 51 07 92 EMAIL : yacoubasama3@gmail.com
Monsieur MALAM MOUTARI Magagi	MEN	DRFM	TEL. : +227 99 19 92 91 / 90 68 27 35 EMAILS : malamagagi@gmail.com drfmnen@gmail.com
Monsieur BACHIROU Aboubacar	MEN	Chef Division Comptabilité Matière	TEL. : +227 96 55 75 10 EMAIL : aboubacarbachirou@yahoo.fr
Monsieur TAGANGAL Ousmane	Lycée Korombé	Chef Magasinier	TEL. : +227 96 98 10 82 EMAIL : tagangalous3@gmail.com
Monsieur HAROUNA IDI	MEN	DIES	96 87 50 50
Monsieur ALI MAMAN SANI	ARMP/NIAMEY	Secrétaire Régional	
Monsieur kabirou	ENTREPRISE	Chef de chantier	96177491
Monsieur Ibrahim	MES/RI	DMP-DSP	96224322
Monsieur AYA HAMZA	Ministère des Finances	Directeur des Marchés Publics	+227 90 41 40 48
Monsieur ABDOURAHMANE C. BATOURE	Ministère des Finances	Inspecteur Central du Trésor	+227 98 12 20 20 +227 92 58 58 00
Monsieur ISSOUFOU HAROUNA	Ministère des Finances	---	+227 89 60 78 51 +227 80 24 40 89

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
Colonel BOHARI ABDOULAYE	DGD	Chef Divisionnaire	+227 98 53 66 66
Monsieur MAHAMADOU SEINI AMADOU	DGD	Chef Service Matériel	+227 98 12 19 19 +227 80 12 19 19
Monsieur Hamadou Hamidou	DRHA/TA	DIRECTEUR ADJOINT DE DRHA/TA	96088694
Monsieur AMADOU	ARMP/TAHAOUA	CHEF DE RECOUVREMENT	98590212
M. OUMAROU BOUBACAR	MI/SP/D/ACR	DMP	Tél. : +227 96 58 88 98 +227 90 73 21 25
M. TANKARI ISSOUFOU	GARDE NATIONALE DU NIGER (GNN)	ASSISTANT AU DMP	Tél. : +227 97 43 44 94
M. MOHAMED ABDOUL-HAYOU	GARDE NATIONALE DU NIGER (GNN)	CHEF DIVISION AUTO & AGENT BLINDE	Tél. : +227 96 53 12 15 +227 80 55 00 80 Email : mahayou1986@gmail.com
Madame MAIGA Aïssata DIALLO	LANSPEX	Gestionnaire / Chef Service Administratif & Financier	Tél. : +227 96 98 18 97
Monsieur AMADOU	ARMP/DIFFA	CHEF DE RECOUVREMENT	98590212
FALKE OUMAROU	NIGELEC	Directeur Régional/DOSSO	90 27 79 55
Monsieur	ARMP/Dosso	Chef de Recouvrement	97 32 42 42
Monsieur HABOU IBRAH	NIGER TELECOMS	Manager des Achats	Tél. : +227 93 80 58 28 Email : ibrah.habou@nigertelecoms.ne
Monsieur OUMAROU ADAMOU	NIGER TELECOMS	Manager des Finances	Tél. : +227 93 93 69 30
Monsieur SEYNI SANDA MOUSTAPHA	NIGER TELECOMS	Directeur des Systèmes d'Information et du Développement Numérique	Tél. : +227 93 76 19 19 Email : moustapha.seyni@nigertelecoms.ne
Monsieur LABO BOUBACAR	NIGER TELECOMS	---	Tél. : +227 93 97 00 00
Monsieur SOUNA	NIGER TELECOMS	---	Tél. : +227 93 56 49 96 Email :
M. Lawaly Boukary	Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques du Niger	Directeur des Marchés Publics	00227 96 97 04 92 lawaly.boukary@yahoo.fr
Madame ADAMOU Rabi	OPVN	DMP	Tél. : +227 94 85 24 15 +227 96 98 46 49 Email : adamourabi10@yahoo.fr
M. ANZA	OPVN	Chef Magasinier / Gestionnaire de Stock	Tél. : +227 88 65 11 11
Monsieur ISMAEL	ARMP/MARADI	Chef de Recouvrement	97 26 79 92

NOM & PRENOMS	ORGANISME	FONCTION	TEL / MOBILE
Monsieur AMADOU	ARMP/DIFFA	CHEF DE RECOUVREMENT	98590212
Monsieur Mouhamed Moussa Taher	PGRC-DU	DResponsable Antenne Régional d'Agadez	91716902
Monsieur ISMAEL	ARMP/MARADI	CHEF DE RECOUVREMENT	97267992
Monsieur ADJI DOUBA	ARMP/ZINDER	SECRETAIRE REGIONAL	89014389
SANI MATI	PRODAF/ZINDER	S/PASSATION MARCHE	89899538
